





OBA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO PRAÇA SÃO FRANCISCO (RIO DAS PEDRAS)				BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 285/2025/PMI				CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE	
				B.M.Nº. 03/2025				ORDEM DE SERVIÇO: 05/09/2025					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE				PERÍODO: 01/11/2025 a 26/12/2025				DATA: 26/12/2025					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							10.247,50	10.100,78	146,72	10.247,50	0,00	100,00
1.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	6,00	0,00	6,00	355,94	2.135,64	2.135,64	0,00	2.135,64	0,00	100,00
1.002	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	155,00	155,00	0,00	155,00	27,47	4.257,85	4.257,85	0,00	4.257,85	0,00	100,00
1.003	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	795,17	795,17	0,00	795,17	4,57	3.633,93	3.633,93	0,00	3.633,93	0,00	100,00
	Destocamento de árvores de diâmetro de 0,15 a 0,30m	un	6,00	2,00	4,00	6,00	36,68	220,08	73,36	146,72	220,08	0,00	100,00
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES							12.863,02	10.364,04	2.498,98	12.863,02	0,00	100,00
2.001	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	276,44	240,44	36,00	276,44	10,16	2.808,63	2.442,87	365,76	2.808,63	0,00	100,00
2.002	Demolição de piso em lajota hexagonal	m2	164,60	139,60	25,00	164,60	13,33	2.194,12	1.860,87	333,25	2.194,12	0,00	100,00
2.003	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	296,95	228,95	68,00	296,95	26,47	7.860,27	6.060,31	1.799,96	7.860,27	0,00	100,00
04	PAVIMENTAÇÃO							52.620,92	44.280,60	8.340,32	52.620,92	0,00	100,00
04.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af 01/2024	m	240,44	240,44	0,00	240,44	44,38	10.670,73	10.670,73	0,00	10.670,73	0,00	100,00
04.005	Pavimentação em bloco de concreto vibropressado, intertravado, colorido, 16 faces, 11x22cm, e=8cm, 39un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	244,62	180,62	64,00	244,62	120,08	29.373,97	21.688,85	7.685,12	29.373,97	0,00	100,00
04.006	Piso de blocos (lajota) hexagonais (sextavado) de concreto fck=15mpa e = 8cm concreto sobre colchão de areia	m2	64,00	64,00	0,00	64,00	111,50	7.136,00	7.136,00	0,00	7.136,00	0,00	100,00
04.007	Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 5 cm	m2	114,50	114,50	0,00	114,50	42,02	4.821,22	4.821,22	0,00	4.821,22	0,00	100,00
04.009	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	15,00	3,00	12,00	15,00	54,60	819,00	163,80	655,20	819,00	0,00	100,00
05	ACESSIBILIDADE							77,42	0,00	77,42	77,42	0,00	100,00
05.005	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	6,60	0,00	6,60	6,60	11,73	77,42	0,00	77,42	77,42	0,00	100,00
06	REVISÕES, ELEVAÇÕES E ESTRUTURAS							265,16	265,16	0,00	265,16	0,00	100,00
06.001	Revisão de estrutura metálica exclusiva chumbamento (alambreado, guarda-corpo), exclusive tela	m²	4,00	4,00	0,00	4,00	66,29	265,16	265,16	0,00	265,16	0,00	100,00
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							10.768,71	0,00	10.768,71	10.768,71	0,00	100,00
07.007	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	4,00	0,00	4,00	4,00	134,30	537,20	0,00	537,20	537,20	0,00	100,00
7.023	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	M	15,00	0,00	15,00	15,00	10,57	158,55	0,00	158,55	158,55	0,00	100,00
07.030	Luminária em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w, 24.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	un	8,00	0,00	8,00	8,00	1.222,63	9.781,04	0,00	9.781,04	9.781,04	0,00	100,00
7.033	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af 02/2025	un	8,00	0,00	8,00	8,00	36,49	291,92	0,00	291,92	291,92	0,00	100,00
08	PINTURA							9.135,16	3.431,60	5.703,56	9.135,16	0,00	100,00
08.002	Pintura de meio fio (calçada)	m	240,44	240,44	0,00	240,44	4,74	1.139,69	1.139,69	0,00	1.139,69	0,00	100,00
08.003	Pintura com tinta acrílica de acabamento aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af 01/2020	m2	10,00	0,00	10,00	10,00	28,46	284,60	0,00	284,60	284,60	0,00	100,00
08.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	49,63	49,63	0,00	49,63	46,18	2.291,91	2.291,91	0,00	2.291,91	0,00	100,00
8.005	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af 05/2021	m2	268,00	0,00	268,00	268,00	20,22	5.418,96	0,00	5.418,96	5.418,96	0,00	100,00
09	EQUIPAMENTOS DIVERSOS							14.319,18	3.706,09	10.613,09	14.319,18	0,00	100,00
09.004	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	5,00	0,00	5,00	5,00	333,63	1.668,15	0,00	1.668,15	1.668,15	0,00	100,00

CONSTRUTORA ROCHA LTDA

 MARIA GÁDENIA ARAÚJO SILVA
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA Nº 270439694-9


 Sheissica Bezerra de Macedo
 Eng.(a) Civil CREA 2722159830
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


OBA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETTVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO PRAÇA SÃO FRANCISCO (RIO DAS PEDRAS)				BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 285/2025/PMI				CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE				B.M.Nº. 03/2025				ORDEM DE SERVIÇO: 05/09/2025					
				PERÍODO: 01/11/2025 a 26/12/2025				DATA: 26/12/2025					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		
09.006	Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro galv.4"	un	1,00	1,00	0,00	1,00	3.706,09	3.706,09	3.706,09	0,00	3.706,09	0,00	100,00
09.009	Brinquedo - Escorregadeira, com pilar de madeira, escoa em tubo de ferro galv. de 2" e rampa em chapa de aço galvanizado	un	1,00	0,00	1,00	1,00	8.944,94	8.944,94	0,00	8.944,94	8.944,94	0,00	100,00
11	PAISAGISMO							10.409,87	0,00	10.409,87	10.409,87	0,00	100,00
11.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	178,40	0,00	178,40	178,40	25,37	4.526,01	0,00	4.526,01	4.526,01	0,00	100,00
11.003	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	4,00	0,00	4,00	4,00	793,93	3.175,72	0,00	3.175,72	3.175,72	0,00	100,00
11.004	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	un	20,00	0,00	20,00	20,00	46,05	921,00	0,00	921,00	921,00	0,00	100,00
11.005	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	4,00	0,00	4,00	4,00	81,64	326,56	0,00	326,56	326,56	0,00	100,00
11.007	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	25,00	0,00	25,00	25,00	37,38	934,50	0,00	934,50	934,50	0,00	100,00
11.008	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio	un	6,00	0,00	6,00	6,00	87,68	526,08	0,00	526,08	526,08	0,00	100,00
13	DIVERSOS							5.012,21	999,70	4.012,51	5.012,21	0,00	100,00
13.001	Limpeza geral	m2	795,17	0,00	795,17	795,17	2,42	1.924,31	0,00	1.924,31	1.924,31	0,00	100,00
13.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	26,44	26,44	0,00	26,44	10,81	285,77	285,82	0,00	285,82	0,00	100,00
13.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade= 1,5t/m³	tkm	594,90	594,90	0,00	0,00	1,20	713,88	713,88	0,00	713,88	0,00	100,00
13.004	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	0,00	1,00	1,00	2.088,25	2.088,25	0,00	2.088,25	2.088,25	0,00	100,00
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							3.745,42	3.301,29	444,12	3.745,42	0,00	100,00
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	11,91	10,50	1,41	11,91	154,93	1.845,22	1.626,77	218,45	1.845,21	0,00	100,00
14.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	23,83	21,00	2,83	23,83	79,74	1.900,20	1.674,54	225,66	1.900,20	0,00	100,00
TOTAL GERAL								129.464,57	76.449,23	53.015,34	129.464,57	0,00	100,00
CONSTRUTORA ROCHA LTDA  MARIA GÁDENIA ARAÚJO SILVA ENGENHEIRA CIVIL CREA Nº 270439694-9			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/__					Aprovado para pagamento Data: __/__/__					



Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEMÓRIA DE CÁLCULO	
BM 03 CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE	
CONTRATO Nº:	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO:
285/2025/PMI	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO PRAÇA SÃO FRANCISCO (RIO DAS PEDRAS)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES
1.004	Destocamento de árvores de diâmetro de 0,15 a 0,30m - 4,00 UND
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
2.001	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado - 36,00 M
2.002	Demolição de piso em lajota hexagonal - 25,00 M2
2.003	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 68,00 M2
04	PAVIMENTAÇÃO
04.005	Pavimentação em bloco de concreto vibropressado, intertravado, colorido, 16 faces, 11x22cm, e=8cm, 39un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina. - 64,00 M2
04.009	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto - 12,00 M2
05	ACESSIBILIDADE
05.005	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.) - 6,60 M2
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
07.007	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - 4,00 UND
7.023	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação - 15,00 M
07.030	Luminária em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w, 24.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar - 8,00 UND
7.033	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af_02/2025 - 8,00 UND
08	PINTURA
08.003	Pintura com tinta acrílica de acabamento aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020 - 10,00 M2
8.005	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021 - 268,00 M2
09	EQUIPAMENTOS DIVERSOS
09.004	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar - 5,00 UND
09.009	Brinquedo - Escorregadeira, com pilar de madeira, esca em tubo de ferro galv. de 2" e rampa em chapa de aço galvanizado - 1,00 UND
11	PAISAGISMO
11.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio - 178,40 M2
11.003	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio) - 4,00 UND
11.004	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio - 20,00 UND
11.005	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio - 4,00 UND
11.007	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais - 25,00 UND
11.008	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio - 6,00 UND
13	DIVERSOS
13.001	Limpeza geral - 795,17 M2
13.004	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m - 1,00 UND
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares - 1,41 H
14.002	Mestre de obras com encargos complementares - 2,83 H


 Sheisica Bezerra de Macedo
 Eng.(a) Civil CREA 2722159830
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaitana

CONSTRUTORA ROCHA LTDA

 MARIA GARDÊNIA ARAÚJO SILVA
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA Nº 270439694-9


 Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaitana

OBRA:
MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO,
MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES
AO MUNICÍPIO (SÃO FRANCISCO) RIO DAS PEDRAS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 03

CONSTRUTORA
ROCHA
SOLIDEZ E QUALIDADE

CONTRATADA: CONSTRUTORA ROCHA LTDA

CONTRATO Nº: 285/2025/PMI

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE

DATA: 26/12/2025



DESTOCAMENTO DE ÁRVORE



DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO



DEMOLIÇÃO DE PISO EXAGORAL



DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO



PISO INTERTRAVADO




REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDO

ELABORADO POR:

FISCALIZAÇÃO:

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Observações:


Kizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA:
MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO,
MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES
AO MUNICÍPIO (SÃO FRANCISCO) RIO DAS PEDRAS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 03

CONSTRUTORA
ROCHA
SOLIDEZ E QUALIDADE

CONTRATADA: CONSTRUTORA ROCHA LTDA

CONTRATO Nº: 285/2025/PMI

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

DATA: 26/12/2025



DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTO



REFLETOR



CABO DE COBRE



LUMINÁRIA




RELÊ




PINTURA METÁLICA

ELABORADO POR:

FISCALIZAÇÃO:


Sheissia Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Observações:


Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA:
MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO,
MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES
AO MUNICÍPIO (SÃO FRANCISCO) RIO DAS PEDRAS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 03

**CONSTRUTORA
ROCHA**
SOLIDEZ E QUALIDADE

CONTRATADA: CONSTRUTORA ROCHA LTDA

CONTRATO Nº: 285/2025/PMI

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

DATA: 26/12/2025



PINTURA DE PISO



LIXEIRA



BRINQUEDO ESCORREGA



GRAMA



PALMEIRA IMPERIAL




MOREIA

ELABORADO POR:

FISCALIZAÇÃO:

Observações:


Sheissia Bezerra de Macedo
Eng.ª Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA:
MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO,
MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES
AO MUNICÍPIO (SÃO FRANCISCO) RIO DAS PEDRAS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 03

CONSTRUTORA
ROCHA
SOLIDEZ E QUALIDADE

CONTRATADA: CONSTRUTORA ROCHA LTDA


CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

CONTRATO Nº: 285/2025/PMI

DATA: 26/12/2025



IPÊ

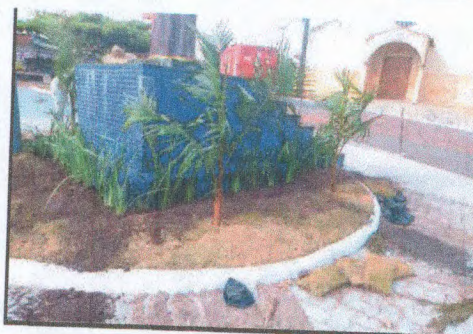


ARBUSTOS




FLAMBOYANT



LIMPEZA

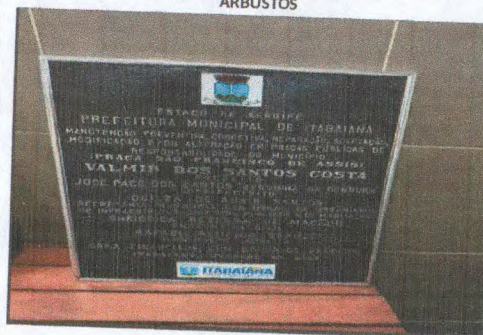

PLACA DE INAUGURAÇÃO



ELABORADO POR:

gov.br

Documento assinado digitalmente

MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA

Data: 22/01/2026 09:56:22-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

FISCALIZAÇÃO:

Sheissca Bezerra de Macedo

Eng.ª Civil CREA 2722159830

Coordenadora de Núcleo

Prefeitura Municipal de Itabaiana

Observações:

Rizvia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana
