OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE					DATA DE TÉRMINO:			BOLETIM DE MEDIÇÃO 10				CONTRATO Nº 018/2025		
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA					VIGÊNCIA 06/02/2026			Período: 01/11/2025 a 31/01/2026				CONTRATO DE REPASSE		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA					EXECUÇÃO 17/10/2025			Data da Medição :12/02/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R$)	Valores (R$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
01	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**10.099,68**	**8.014,80**	**-**	**8.014,80**	**2.084,88**	**79,35**
01.001	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	8,00	8,00		8,00	-	741,24	5.929,92	5.929,92	-	5.929,92	-	100,00
01.002	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	12,00	6,00		6,00	6,00	347,48	4.169,76	2.084,88	-	2.084,88	2.084,88	50,00
02	**CALÇADA E ESTACIONAMENTO**								**3.817,54**	**657,41**	**3.160,13**	**3.817,54**	**-**	**100,00**
02.001	Demolição de concreto manualmente	m³	2,80	2,80		2,80	-	221,74	620,87	620,87	-	620,87	-	100,00
02.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m³	2,80	2,80		2,80	-	9,72	27,21	27,21	-	27,21	-	100,00
02.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	8,40	8,40		8,40	-	1,11	9,32	9,32	-	9,32	-	100,00
02.004	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m²	40,00	-	40,00	40,00	-	49,57	1.982,80	-	1.982,80	1.982,80	-	100,00
02.005	Pintura de meio fio (caiação)	m	305,56	-	305,56	305,56	-	3,71	1.133,62	-	1.133,62	1.133,62	-	100,00
02.006	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m²	5,50	-	5,50	5,50	-	7,95	43,72	-	43,72	43,72	-	100,00
03	**PISTA PARA CAMINHADA/CORRIDA**								**34.669,51**	**27.259,32**	**7.410,19**	**34.669,51**	**-**	**100,00**
03.001	Demolição de concreto manualmente	m³	30,38	30,38		30,38	-	221,74	6.736,46	6.736,46	-	6.736,46	-	100,00
03.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m³	30,38	30,38		30,38	-	9,72	295,29	295,29	-	295,29	-	100,00
03.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	91,14	91,14		91,14	-	1,11	101,16	101,16	-	101,16	-	100,00
03.004	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m²	434,07	406,02	28,05	434,07	-	49,57	21.516,84	20.126,41	1.390,43	21.516,84	-	100,00
03.005	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m²	434,07	-	434,07	434,07	-	7,95	3.450,85	-	3.450,85	3.450,85	-	100,00
03.006	Pintura de meio fio (caiação)	m	692,43	-	692,43	692,43	-	3,71	2.568,91	-	2.568,91	2.568,91	-	100,00
04	**PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA**								**111.062,11**	**91.289,89**	**19.772,23**	**111.062,11**	**-**	**100,00**
04.001	Demolição de concreto manualmente	m³	200,63	163,39	37,24	200,63	-	221,74	44.487,70	36.230,09	8.257,61	44.487,70	-	100,00
04.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m³	200,63	163,39	37,24	200,63	-	9,72	1.950,12	1.588,15	361,97	1.950,12	-	100,00
04.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	5.898,86	1.903,99	3.994,87	5.898,86	-	1,11	6.547,73	2.113,42	4.434,31	6.547,73	-	100,00
04.004	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m²	430,29	350,00	80,29	430,29	-	49,57	21.329,48	17.349,50	3.979,98	21.329,48	-	100,00
04.005	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. af_10/2022	m²	430,29	400,00	30,29	430,29	-	84,81	36.492,89	33.924,00	2.568,89	36.492,89	-	100,00
04.006	Destocamento de árvores diâmetro superior a 0,30m	un	3,00	1,00	2,00	3,00	-	84,73	254,19	84,73	169,46	254,19	-	100,00
05	**DRENAGEM**								**12.026,91**	**12.026,91**	**-**	**12.026,91**	**-**	**100,00**
05.001	Demolição de tubo de concreto simples ou armado d=0,40m, sem reaproveitamento, exclusive escavação	m	78,00	78,00		78,00	-	40,59	3.166,02	3.166,02	-	3.166,02	-	100,00
05.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	9,72	9,72		9,72	-	48,74	473,75	473,75	-	473,75	-	100,00
05.003	Carga manual de material de 1ª categoria	m³	9,72	9,72		9,72	-	9,72	94,47	94,47	-	94,47	-	100,00
05.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	29,16	29,16		29,16	-	1,11	32,36	32,36	-	32,36	-	100,00
05.005	Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=30cm	m	78,00	78,00		78,00	-	40,19	3.134,82	3.134,82	-	3.134,82	-	100,00
05.006	Grelha pré-moldada em concreto para boca-de-lobo 0,45 x 1,10m	un	71,00	71,00		71,00	-	72,19	5.125,49	5.125,49	-	5.125,49	-	100,00
06	**RAMPA E ESCADA DE ACESSO**								**7.438,46**	**4.840,41**	**2.598,05**	**7.438,46**	**-**	**100,00**
06.001	Demolição de concreto manualmente	m³	5,13	5,13		5,13	-	221,74	1.137,52	1.137,52	-	1.137,52	-	100,00
06.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m³	5,13	5,13		5,13	-	9,72	49,86	49,86	-	49,86	-	100,00
06.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	15,39	15,39		15,39	-	1,11	17,08	17,08	-	17,08	-	100,00

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE														
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA														
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA														
DATA DE TÉRMINO: VIGÊNCIA 06/02/2026 EXECUÇÃO 17/10/2025														
BOLETIM DE MEDIÇÃO 10														
Período: 01/11/2025 a 31/01/2026														
Data da Medição :12/02/2026														
CONTRATO Nº 018/2025														
CONTRATO DE REPASSE														

Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R$)	Valores (R$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
06.004	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m²	73,35	73,35		73,35	-	49,57	3.635,95	3.635,95	-	3.635,95	-	100,00
06.005	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m²	35,26	-	35,26	35,26	-	25,31	892,43	-	892,43	892,43	-	100,00
06.006	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m²	42,00	-	42,00	42,00	-	40,61	1.705,62	-	1.705,62	1.705,62	-	100,00
07	**TOTEM**								**12.139,90**	**4.783,18**	**7.356,72**	**12.139,90**	**-**	**100,00**
07.001	Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço	m²	190,40	124,40	66,00	190,40	-	38,45	7.320,88	4.783,18	2.537,70	7.320,88	-	100,00
07.002	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m²	190,40	-	190,40	190,40	-	25,31	4.819,02	-	4.819,02	4.819,02	-	100,00
08	**URBANIZAÇÃO**								**34.409,03**	**28.039,45**	**6.365,67**	**34.405,12**	**3,91**	**99,98**
08.001	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	20,00	20,00		20,00	-	938,05	18.761,00	18.761,00	-	18.761,00	-	100,00
08.002	Pintura de meio fio (caiação)	m	652,04	-	652,04	652,04	-	3,71	2.419,07	-	2.419,07	2.419,07	-	100,00
08.003	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	100,00	100,00		100,00	-	41,03	4.103,00	4.103,00	-	4.103,00	-	100,00
08.004	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, pequena	un	6,00	-	6,00	6,00	-	64,87	389,22	-	389,22	389,22	-	100,00
08.005	Grama batatais em placas, fornecimento e plantio	m²	265,20	265,00		265,00	0,20	19,53	5.179,36	5.175,45	-	5.175,45	3,91	99,92
08.006	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	330,00		330,00	330,00	-	10,78	3.557,40		3.557,40	3.557,40	-	100,00
09	**ILUMINAÇÃO DA PRAÇA**								**163.156,56**	**-**	**47.473,56**	**47.473,56**	**115.683,00**	**29,09**
09.001	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 170lm/w,24.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	un	36,00	-	36,00	36,00	-	1.318,71	47.473,56	-	47.473,56	47.473,56	-	100,00
09.002	Fornecimento de transformador trifásico c/ deriv. 15 kva 13800/220/127v	un	7,00	-		-	7,00	7.890,68	55.234,76	-	-	-	55.234,76	-
09.003	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	4,00	-		-	4,00	262,37	1.049,48	-	-	-	1.049,48	-
09.004	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	12,00	-		-	12,00	69,50	834,00	-	-	-	834,00	-
09.005	Fornecimento de Luminária Decorativa à Led ref. EGEU II 60w da Ilumatic ou similar, inclusive poste cônico contínuo de aço reto, h=6,0m - Rev 01	un	10,00	-		-	10,00	3.536,83	35.368,30	-	-	-	35.368,30	-
09.006	Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1	un	10,00	-		-	10,00	117,91	1.179,10	-	-	-	1.179,10	-
09.007	Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023	un	10,00	-		-	10,00	86,71	867,10	-	-	-	867,10	-
09.008	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	un	10,00	-		-	10,00	5,63	56,30	-	-	-	56,30	-
09.009	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	248,00	-		-	248,00	8,33	2.065,84	-	-	-	2.065,84	-
09.010	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	M	160,00	-		-	160,00	8,50	1.360,00	-	-	-	1.360,00	-
09.011	Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01	un	5,00	-		-	5,00	169,79	848,95	-	-	-	848,95	-
09.012	Poste circular de concreto 10/200 - fornecimento e assentamento	un	1,00	-		-	1,00	2.059,93	2.059,93	-	-	-	2.059,93	-

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE					DATA DE TÉRMINO:			BOLETIM DE MEDIÇÃO 10						CONTRATO Nº 018/2025	
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA					VIGÊNCIA 06/02/2026			Período: 01/11/2025 a 31/01/2026						CONTRATO DE REPASSE	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA					EXECUÇÃO 17/10/2025			Data da Medição :12/02/2026							
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R$)	Valores (R$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
09.013	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	7,00	-		-	7,00	69,50	486,50	-	-	-	486,50	-
9014	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	368,00	-		-	368,00	18,73	6.892,64	-	-	-	6.892,64	-
09.015	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	168,00	-		-	168,00	13,81	2.320,08	-	-	-	2.320,08	-
09.016	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	28,00	-		-	28,00	11,49	321,72	-	-	-	321,72	-
09.017	Caixa para medição direta padrão energisa (1.00 x 0.60 x 0.20 m) em chapa de alumíniode 2mm	un	1,00	-		-	1,00	3.013,60	3.013,60	-	-	-	3.013,60	-
09.018	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	-		-	1,00	1.724,70	1.724,70	-	-	-	1.724,70	-
10	**QUADRA COBERTA, VESTIÁRIO, TEATRO ARENA**								**828.188,43**	**404.730,98**	**373.638,71**	**778.369,70**	**49.818,73**	**93,98**
10.1	**QUADRA COBERTA - COBERTURA**								**263.244,88**	**140.324,58**	**118.002,83**	**258.327,41**	**4.917,47**	**98,13**
10.001.001	Remoção e reassentamento de telha trapezoidal em alumínio	m²	923,28	461,64	461,64	923,28	-	26,43	24.402,29	12.201,15	12.201,15	24.402,29	-	100,00
10.001.002	Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019	m²	1.522,32	322,20	1.200,12	1.522,32	-	62,25	94.764,42	20.056,95	74.707,47	94.764,42	-	100,00
10.001.003	Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço	m²	495,31	495,31		495,31	-	38,45	19.044,67	19.044,67	-	19.044,67	-	100,00
10.001.004	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de inta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m²	495,31	495,31		495,31	-	25,31	12.536,30	12.536,30	-	12.536,30	-	100,00
10.001.005	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14 cm, laterais=15 cm, bordas=3 cm)	m	72,00	72,00		72,00	-	108,59	7.818,48	7.818,48	-	7.818,48	-	100,00
10.001.006	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022	M	84,00	84,00		84,00	-	24,02	2.017,68	2.017,68	-	2.017,68	-	100,00
10.001.007	Desmontagem de Estrutura Metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira	m²	923,28	276,98	646,30	923,28	-	7,88	7.275,45	2.182,60	5.092,85	7.275,45	-	100,00
10.001.008	Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical (em kg). af_07/2019	KG	7.481,38	6.455,26	1.026,12	7.481,38	-	9,90	74.065,66	63.907,07	10.158,59	74.065,66	-	100,00
10.001.009	Curva 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022	UN	12,00	12,00		12,00	-	46,64	559,68	559,68	-	559,68	-	100,00
10.001.010	Rede para trave de futebol de salão (Futsal)	par	2,00		-	-	2,00	271,54	543,08		-	-	543,08	-
10.001.011	Trave para campo de futebol soçaite, desmontável	par	2,00		2,00	2,00	-	2.420,05	4.840,10		4.840,10	4.840,10	-	100,00
10.001.012	Estrutura Metálica Móvel, p/ Tabela e Cesta de Basquete, Padrão Oficial em Tubo Galvanizado 2"	par	1,00		1,00	1,00	-	7.876,42	7.876,42		7.876,42	7.876,42	-	100,00
10.001.013	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta epóxi, e = 5 cm, aplicação manual. af_05/2021	m	240,60		-	-	240,60	9,54	2.295,32		-	-	2.295,32	-
10.001.014	Caixa d´água em polietileno, 2000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021	un	3,00		3,00	3,00	-	1.042,10	3.126,30		3.126,30	3.126,30	-	100,00
10.001.015	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²	112,20		-	-	112,20	18,53	2.079,07		-	-	2.079,07	-
10.002	**QUADRA COBERTA - PILARES**								**19.758,46**	**19.758,46**	**-**	**19.758,46**	**-**	**100,00**
10.002.001	Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço	m²	147,98	147,98		147,98	-	38,45	5.689,83	5.689,83	-	5.689,83	-	100,00
10.002.002	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m²	147,98	147,98		147,98	-	25,31	3.745,37	3.745,37	-	3.745,37	-	100,00
10.002.003	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 03 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022	m²	63,00	63,00		63,00	-	88,33	5.564,79	5.564,79	-	5.564,79	-	100,00
10.002.004	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura	m³	9,38	9,38		9,38	-	507,30	4.758,47	4.758,47	-	4.758,47	-	100,00
10.003	**QUADRA COBERTA - ALAMBRADO**								**143.554,90**	**143.554,90**	**-**	**143.554,90**	**-**	**100,00**
10.003.001	Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)	m²	410,92	410,92		410,92	-	45,48	18.688,64	18.688,64	-	18.688,64	-	100,00

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE					DATA DE TÉRMINO:			BOLETIM DE MEDIÇÃO 10					CONTRATO Nº 018/2025	
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA					VIGÊNCIA 06/02/2026			Período: 01/11/2025 a 31/01/2026					CONTRATO DE REPASSE	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA					EXECUÇÃO 17/10/2025			Data da Medição :12/02/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R$)	Valores (R$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
10.003.002	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m²	410,92	410,92		410,92	-	303,87	124.866,26	124.866,26	-	124.866,26	-	100,00
10.004	**QUADRA COBERTA - PISO**								**159.190,79**	**80.904,43**	**78.286,37**	**159.190,79**	-	**100,00**
10.004.001	Demolição de piso de alta resistência	m²	796,11	751,91	44,20	796,11	-	18,27	14.544,93	13.737,40	807,53	14.544,93	-	100,00
10.004.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m³	22,73	22,73		22,73	-	9,72	220,93	220,93	-	220,93	-	100,00
10.004.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	68,21	68,21		68,21	-	1,11	75,71	75,71	-	75,71	-	100,00
10.004.004	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m²	757,91	757,91		757,91	-	24,43	18.515,74	18.515,74	-	18.515,74	-	100,00
10.004.005	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m²	1.290,56	757,91	532,65	1.290,56	-	63,80	82.337,73	48.354,65	33.983,08	82.337,73	-	100,00
10004006	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	m²	1.289,91		1.289,91	1.289,91	-	33,72	43.495,77		43.495,77	43.495,77	-	100,00
10.005	**QUADRA COBERTA - ARQUIBANCADAS**								**7.849,91**	**7.849,91**	-	**7.849,91**	-	**100,00**
10.005.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m²	193,30	193,30		193,30	-	40,61	7.849,91	7.849,91	-	7.849,91	-	100,00
10.006	**VESTIÁRIO E TEATRO ARENA**								**151.190,31**	**11.211,24**	**137.046,53**	**148.257,76**	**2.932,55**	**98,06**
10.006.001	Remoção e reassentamento de telha trapezoidal em alumínio	m²	254,96	127,48	127,48	254,96	-	26,43	6.738,59	3.369,30	3.369,30	6.738,59	-	100,00
10.006.002	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	395,96	75,33	320,63	395,96	-	62,25	24.648,51	4.689,29	19.959,22	24.648,51	-	100,00
10.006.003	Limpeza de revestimento cerâmico em parede utilizando detergente neutro e escovação manual. af_04/2019	m²	330,37	-		-	330,37	1,47	485,64	-	-	-	485,64	-
10.006.004	Revisão de ponto de água tipo 1	un	40,00	40,00		40,00	-	24,06	962,40	962,40	-	962,40	-	100,00
10.006.005	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	38,00	38,00		38,00	-	32,99	1.253,62	1.253,62	-	1.253,62	-	100,00
10.006.006	Limpeza de fossa acima de 5m3	m³	7,41	-	7,41	7,41	-	46,33	343,31	-	343,31	343,31	-	100,00
10.006.007	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa	un	10,00	10,00		10,00	-	22,96	229,60	229,60	-	229,60	-	100,00
10.006.008	Limpeza de reservatório	m³	2,00	-	2,00	2,00	-	11,58	23,16	-	23,16	23,16	-	100,00
10.006.009	Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021	m²	26,40	-	26,40	26,40	-	141,30	3.730,32	-	3.730,32	3.730,32	-	100,00
10.006.010	Revisão de esquadrias de alumínio	m²	11,76	-		-	11,76	106,70	1.254,79	-	-	-	1.254,79	-
10.006.011	Revisão de esquadria de madeira	m²	15,36	-	15,36	15,36	-	102,45	1.573,63	-	1.573,63	1.573,63	-	100,00
10.006.012	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m²	39,90	39,90		39,90	-	17,72	707,03	707,03	-	707,03	-	100,00
10.006.013	Lavatório / cuba de sobrepor retangular sem mesa em louça branca, *50 x 40*cm, com sifão, engate e válvula cromados, exclusive torneira	un	14,00		14,00	14,00	-	1.289,89	18.058,46		18.058,46	18.058,46	-	100,00
10.006.014	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	un	19,00		17,00	17,00	2,00	460,29	8.745,51		7.824,93	7.824,93	920,58	89,47
10.006.015	Torneira para lavatório, 1193, Docol, ref. 2005056 ou similar	un	14,00		14,00	14,00	-	120,64	1.688,96		1.688,96	1.688,96	-	100,00
10.006.016	Revestimento cerâmico para piso ou parede, cerâmica 37 x 59 cm acabamento fosco retificado, Arielle, linha riviera branco ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	664,07		664,07	664,07	-	65,91	43.768,85		43.768,85	43.768,85	-	100,00
10.006.017	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m²	664,07		664,07	664,07	-	18,27	12.132,56		12.132,56	12.132,56	-	100,00
10.006.018	Demolição de piso cerâmico ou Ladrilho	m²	178,83		178,83	178,83	-	12,79	2.287,24		2.287,24	2.287,24	-	100,00
10.006.019	Demolição de reboco	m²	100,70		100,70	100,70	-	8,54	859,98		859,98	859,98	-	100,00
10.006.020	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha gretna, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	178,83		178,83	178,83	-	51,19	9.154,31		9.154,31	9.154,31	-	100,00
10.006.021	Restauro - Reboco especial de parede, spessura 3cm, com argamassa traço 1:0,24:0,74 (cal, arenoso e areia média)	m²	100,70		100,70	100,70	-	45,19	4.550,63		4.550,63	4.550,63	-	100,00

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE					DATA DE TÉRMINO:			BOLETIM DE MEDIÇÃO 10					CONTRATO Nº 018/2025	
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA					VIGÊNCIA 06/02/2026			Período: 01/11/2025 a 31/01/2026					CONTRATO DE REPASSE	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA					EXECUÇÃO 17/10/2025			Data da Medição :12/02/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R$)	Valores (R$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
10.006.022	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m²	25,95		25,95	25,95	-	297,56	7.721,68		7.721,68	7.721,68	-	100,00
10.006.023	Rede para trave de futebol de salão (Futsal)	par	1,00			-	1,00	271,54	271,54		-	-	271,54	-
10.007	**ILUMINAÇÕES**								**44.500,22**	**-**	**5.148,99**	**5.148,99**	**39.351,23**	**11,57**
10.007.001	Refletor modular LED 150w DC com DPS 3x50w 90° 5000k 165lm/W Aluminio Autovolt Branca Ref.: RFMLED-DCDPS-90-150-50-3C-ME, da G-light ou similar	un	6,00	-		-	6,00	1.957,31	11.743,86	-	-	-	11.743,86	-
10.007.002	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	pt	2,00	-	2,00	2,00	-	85,47	3.162,39	-	3.162,39	3.162,39	-	100,00
10.007.003	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	6,00	-	6,00	6,00	-	94,60	1.986,60	-	1.986,60	1.986,60	-	100,00
10.007.004	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 18 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,00	-		-	1,00	447,75	447,75	-	-	-	447,75	-
10.007.005	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020	un	1,00	-		-	1,00	37,64	37,64	-	-	-	37,64	-
10.007.006	Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023	un	1,00	-		-	1,00	86,71	86,71	-	-	-	86,71	-
10.007.007	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	un	1,00	-		-	1,00	5,63	5,63	-	-	-	5,63	-
10.007.008	Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/127v, c/ base móvel	un	1,00	-		-	1,00	22,31	22,31	-	-	-	22,31	-
10.007.009	Contator 32 A, bobina de 24 a 220VAC, com contato NA-NF , para fixação em trilho.	un	1,00	-		-	1,00	234,29	234,29	-	-	-	234,29	-
10.007.010	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², 0,6/1,0 kv, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação. af_07/2020	m	342,00	-		-	342,00	8,43	2.883,06	-	-	-	2.883,06	-
10.007.011	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	356,00	-		-	356,00	8,33	2.965,48	-	-	-	2.965,48	-
10.007.012	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	M	96,00	-		-	96,00	8,50	816,00	-	-	-	816,00	-
10.007.013	Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, 200W, IP68 dúplo, módulos N2, corpo em alumínio, pintura eletrostática, proteção contra corrosão, 6500K, FP = >0.95, IRC = Ra>80. FL = 22.000 Luméns, VU = 50.000h, ângulo do feixe = 120°	un	40,00	-		-	40,00	218,79	8.751,60	-	-	-	8.751,60	-
10.007.014	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,00	-		-	1,00	79,91	79,91	-	-	-	79,91	-
10.007.015	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,00	-		-	1,00	9,52	9,52	-	-	-	9,52	-
10.007.016	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,00	-		-	1,00	10,06	10,06	-	-	-	10,06	-
10.007.017	Luminária plafon de sobropor em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar	un	10,00	-		-	10,00	50,64	506,40	-	-	-	506,40	-
10.007.018	Luminária em led 40W sobrepor, 120 x 7,2 cm, 6500K branco frio, com difusor de proteção	un	11,00	-		-	11,00	73,44	807,84	-	-	-	807,84	-
10.007.019	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente Ø 3/4"	un	4,00	-		-	4,00	205,18	820,72	-	-	-	820,72	-
10.007.020	Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/127v, c/ base móvel	un	1,00	-		-	1,00	22,31	22,31	-	-	-	22,31	-
10.007.021	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	4,00	-		-	4,00	69,50	278,00	-	-	-	278,00	-

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE					DATA DE TÉRMINO:			BOLETIM DE MEDIÇÃO 10						CONTRATO Nº 018/2025	
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA					VIGÊNCIA 06/02/2026			Período: 01/11/2025 a 31/01/2026						CONTRATO DE REPASSE	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA					EXECUÇÃO 17/10/2025			Data da Medição :12/02/2026							
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R$)	Valores (R$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
10007022	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 40 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	-		-	1,00	997,65	997,65	-	-	-	997,65	-
10007023	Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 18/20 w (tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa, com lampada tubo led	un	38,00	-		-	38,00	174,78	6.641,64	-	-	-	6.641,64	-
10007024	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un	5,00	-		-	5,00	69,85	349,25	-	-	-	349,25	-
10007025	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	m	43,00	-		-	43,00	8,50	365,50	-	-	-	365,50	-
10007026	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 20mm (1/2")	m	28,00	-		-	28,00	5,67	158,76	-	-	-	158,76	-
10007027	Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt, temp.cor 3000K/6000k, IP-65, da Taschibra ou similar	un	2,00	-		-	2,00	52,01	104,02	-	-	-	104,02	-
10007028	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	4,00	-		-	4,00	51,33	205,32	-	-	-	205,32	-
10.008	**DIVERSOS**								**38.898,96**	**1.127,46**	**35.154,00**	**36.281,46**	**2.617,50**	**93,27**
10.008.001	Limpeza geral	m²	1.308,75	-		-	1.308,75	2,00	2.617,50	-	-	-	2.617,50	-
10.008.002	Grama batatais em placas, fornecimento e plantio	m²	1.857,73	57,73	1.800,00	1.857,73	-	19,53	36.281,47	1.127,46	35.154,01	36.281,47	-	100,00
11	**CAMPO DE FUTEBOL E QUADRA DE AREIA**								**496.372,50**	**375.590,41**	**91.086,30**	**466.676,71**	**29.695,78**	**94,01**
11.001	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m²	1.269,00	1.269,00		1.269,00	-	4,06	5.152,14	5.152,14	-	5.152,14	-	100,00
11.002	Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água	m³	88,83	88,83		88,83	-	171,04	15.193,48	15.193,48	-	15.193,48	-	100,00
11.003	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m²	1.269,00	1.269,00		1.269,00	-	49,57	62.904,33	62.904,33	-	62.904,33	-	100,00
11.004	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	1.269,00	-	760,80	760,80	508,20	57,35	72.777,15	-	43.631,88	43.631,88	29.145,27	59,95
11.005	Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)	m²	737,51	737,51		737,51	-	45,48	33.541,95	33.541,95	-	33.541,95	-	100,00
11.006	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar.	m²	102,00	102,00		102,00	-	314,94	32.123,88	32.123,88	-	32.123,88	-	100,00
11.007	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m²	737,51	737,51		737,51	-	303,87	224.107,16	224.107,16	-	224.107,16	-	100,00
11.008	Lastro de areia	m³	18,36	18,36		18,36	-	139,84	2.567,46	2.567,46	-	2.567,46	-	100,00
11.009	Lona plástica preta	m²	1.269,00		1.269,00	1.269,00	-	5,21	6.611,49		6.611,49	6.611,49	-	100,00
11.010	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m²	1.269,00		1.269,00	1.269,00	-	31,45	39.910,05		39.910,05	39.910,05	-	100,00
11.011	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1,00		1,00	1,00	-	932,89	932,89		932,89	932,89	-	100,00
11.012	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	und	1,00		-	-	1,00	229,19	229,19		-	-	229,19	-
11.013	Rede oficial p/futebol campo, nylon, fio 3mm, malha 16, dim:7,5x2,5m	par	1,00		-	-	1,00	321,33	321,33		-	-	321,33	-
12	**PISTA DE SKATE**								**89.875,85**	**74.848,97**	**15.026,90**	**89.875,87**	**(0,00)**	**100,00**
12.001	**OBSTÁCULO 01 (EXISTENTE)**								**1.914,97**	**-**	**1.914,97**	**1.914,97**	**-**	**100,00**
12.001.001	Enceramento de piso de alta resistência (existente)	m²	26,30	-	26,30	26,30	-	9,26	243,53	-	243,53	243,53	-	100,00
12.001.002	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m²	26,30	-	26,30	26,30	-	28,16	740,60	-	740,60	740,60	-	100,00

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE					DATA DE TÉRMINO:			BOLETIM DE MEDIÇÃO 10				CONTRATO Nº 018/2025		
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA					VIGÊNCIA 06/02/2026			Período: 01/11/2025 a 31/01/2026				CONTRATO DE REPASSE		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA					EXECUÇÃO 17/10/2025			Data da Medição :12/02/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R$)	Valores (R$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
12.001.003	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m²	5,80	-	5,80	5,80	-	25,31	146,79	-	146,79	146,79	-	100,00
12.001.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m²	30,96	-	30,96	30,96	-	22,07	683,28	-	683,28	683,28	-	100,00
12.001.005	Restauro - Reboco especial de parede, spessura 3cm, com argamassa traço 1:0,24:0,74 (cal, arenoso e areia média)	m²	2,23	-	2,23	2,23	-	45,19	100,77	-	100,77	100,77	-	100,00
12.002	**OBSTÁCULO 02 (EXISTENTE)**								**1.106,88**	-	**1.106,88**	**1.106,88**	-	**100,00**
12.002.001	Enceramento de piso de alta resistência (existente)	m²	21,13	-	21,13	21,13	-	9,26	195,66	-	195,66	195,66	-	100,00
12.002.002	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m²	21,13	-	21,13	21,13	-	28,16	595,02	-	595,02	595,02	-	100,00
12.002.003	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m²	1,60	-	1,60	1,60	-	25,31	40,49	-	40,49	40,49	-	100,00
12.002.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m²	9,36	-	9,36	9,36	-	22,07	206,57	-	206,57	206,57	-	100,00
12.002.005	Restauro - Reboco especial de parede, spessura 3cm, com argamassa traço 1:0,24:0,74 (cal, arenoso e areia média)	m²	1,53	-	1,53	1,53	-	45,19	69,14	-	69,14	69,14	-	100,00
12.003	**OBSTÁCULO 03**								**3.018,75**	-	**3.018,75**	**3.018,75**	-	**100,00**
12.003.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	2,87	-	2,87	2,87	-	48,74	139,88	-	139,88	139,88	-	100,00
12.003.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m³	4,30	-	4,30	4,30	-	9,72	41,79	-	41,79	41,79	-	100,00
12.003.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	12,90	-	12,90	12,90	-	1,12	14,44	-	14,44	14,44	-	100,00
12.003.004	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m³	2,58	-	2,58	2,58	-	478,01	1.233,26	-	1.233,26	1.233,26	-	100,00
12.003.005	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m³	0,72	-	0,72	0,72	-	13,50	9,72	-	9,72	9,72	-	100,00
12.003.006	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m²	11,21	-	11,21	11,21	-	50,81	569,58	-	569,58	569,58	-	100,00
12.003.007	Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	m²	11,21	-	11,21	11,21	-	72,08	808,01	-	808,01	808,01	-	100,00
12.003.008	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	2,86	-	2,86	2,86	-	6,15	17,58	-	17,58	17,58	-	100,00
12.003.009	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	2,86	-	2,86	2,86	-	28,76	82,25	-	82,25	82,25	-	100,00
12.003.010	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m²	2,86	-	2,86	2,86	-	35,75	102,24	-	102,24	102,24	-	100,00
12.004	**OBSTÁCULO 04**								**9.750,12**	**2.754,39**	**6.995,74**	**9.750,13**	-	**100,00**
12.004.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	2,80	2,80		2,80	-	48,74	136,47	136,47	-	136,47	-	100,00
12.004.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m³	3,36	3,36		3,36	-	9,72	32,66	32,66	-	32,66	-	100,00
12.004.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	6,72	6,72		6,72	-	1,12	7,53	7,53	-	7,53	-	100,00
12.004.004	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m³	2,83	2,83		2,83	-	478,01	1.352,77	1.352,77	-	1.352,77	-	100,00
12.004.005	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m³	0,70	0,70		0,70	-	13,50	9,45	9,45	-	9,45	-	100,00
12.004.006	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m³	3,57	3,57		3,57	-	130,56	466,10	466,10	-	466,10	-	100,00

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE								DATA DE TÉRMINO:	BOLETIM DE MEDIÇÃO 10					CONTRATO Nº 018/2025	
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA								VIGÊNCIA 06/02/2026	Período: 01/11/2025 a 31/01/2026					CONTRATO DE REPASSE	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								EXECUÇÃO 17/10/2025	Data da Medição :12/02/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R$)	Valores (R$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
12.004.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	53,55	53,55		53,55	-	1,12	59,98	59,98	-	59,98	-	100,00
12.004.008	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m²	11,88	11,88		11,88	-	50,81	603,62	603,62	-	603,62	-	100,00
12.004.009	Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	m²	11,88	-	11,88	11,88	-	72,08	856,31	-	856,31	856,31	-	100,00
12.004.010	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	2,46	2,46		2,46	-	28,76	70,75	70,75	-	70,75	-	100,00
12.004.011	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	2,46	2,46		2,46	-	6,15	15,13	15,13	-	15,13	-	100,00
12.004.012	Corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria	m	50,12	-	50,12	50,12	-	120,74	6.051,49	-	6.051,49	6.051,49	-	100,00
12.004.013	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m²	2,46	-	2,46	2,46	-	35,75	87,95	-	87,95	87,95	-	100,00
12.005	**OBSTÁCULO 05**								**1.882,67**	**1.882,67**	**-**	**1.882,67**	**(0,00)**	**100,00**
12.005.001	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m³	2,02	2,02		2,02	-	130,56	263,73	263,73	-	263,73	-	100,00
12.005.002	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m³	0,38	0,38		0,38	-	478,01	181,64	181,64	-	181,64	-	100,00
12.005.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	45,45	45,45		45,45	-	1,12	50,90	50,90	-	50,90	-	100,00
12.005.004	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m²	8,21	8,21		8,21	-	50,81	417,15	417,15	-	417,15	-	100,00
12.005.005	Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	m²	8,21	8,21			-	72,08	591,77	591,77	-	591,77	(0,00)	100,00
12.005.006	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	1,72	1,72		1,72	-	28,76	49,46	49,46		49,46	-	100,00
12.005.007	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	1,72	1,72		1,72	0,00	6,15	10,57	10,57	-	10,57	-	100,00
12.005.008	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m²	1,72	1,72		1,72	-	35,75	61,49	61,49	-	61,49	-	100,00
12.005.009	Corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria	m	2,12	2,12		2,12	-	120,74	255,96	255,96	-	255,96	-	100,00
12.006	**OBSTÁCULO 06 (2X)**								**20.788,90**	**20.788,90**	**-**	**20.788,90**	**-**	**100,00**
12.006.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	8,20	8,20		8,20	-	48,74	399,66	399,66	-	399,66	-	100,00
12.006.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m³	9,84	9,84		9,84	-	9,72	95,64	95,64	-	95,64	-	100,00
12.006.003	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m³	2,06	2,06		2,06	-	13,50	27,81	27,81	-	27,81	-	100,00
12.006.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	19,68	19,68		19,68	-	1,12	22,04	22,04	-	22,04	-	100,00
12.006.005	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m³	6,14	6,14		6,14	-	478,01	2.934,98	2.934,98	-	2.934,98	-	100,00
12.006.006	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m³	2,06	2,06		2,06	-	13,50	27,81	27,81	-	27,81	-	100,00

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE								DATA DE TÉRMINO:	BOLETIM DE MEDIÇÃO 10				CONTRATO Nº 018/2025		
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA								VIGÊNCIA 06/02/2026 EXECUÇÃO 17/10/2025	Período: 01/11/2025 a 31/01/2026				CONTRATO DE REPASSE		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA									Data da Medição :12/02/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R$)	Valores (R$)						% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
12.006.007	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	3,30	3,30		3,30	-	2.170,35	7.162,15	7.162,15	-	7.162,15	-	100,00
12.006.008	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m³	33,88	33,88		33,88	-	130,56	4.423,37	4.423,37	-	4.423,37	-	100,00
12.006.009	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	762,30	762,30		762,30	-	1,12	853,77	853,77	-	853,77	-	100,00
12.006.010	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m²	23,46	23,46		23,46	-	50,81	1.192,00	1.192,00	-	1.192,00	-	100,00
12.006.011	Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	m²	23,46	23,46		23,46	-	72,08	1.690,99	1.690,99	-	1.690,99	-	100,00
12.006.012	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	27,72	27,72		27,72	-	28,76	797,22	797,22	-	797,22	-	100,00
12.006.013	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	27,72	27,72		27,72	0,00	6,15	170,47	170,47	-	170,47	-	100,00
12.006.014	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m²	27,72	27,72		27,72	-	35,75	990,99	990,99	-	990,99	-	100,00
12.007	**OBSTÁCULO 07**								**51.413,56**	**49.423,00**	**1.990,56**	**51.413,56**	-	**100,00**
12.007.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	8,57	8,57		8,57	-	48,74	417,70	417,70	-	417,70	-	100,00
12.007.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m³	10,28	10,28		10,28	-	9,72	99,92	99,92	-	99,92	-	100,00
12.007.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	20,56	20,56		20,56	-	1,12	23,02	23,02	-	23,02	-	100,00
12.007.004	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m³	87,90	87,90		87,90	-	478,01	42.017,07	42.017,07	-	42.017,07	-	100,00
12.007.005	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m³	2,00	2,00		2,00	-	13,50	27,00	27,00	-	27,00	-	100,00
12.007.006	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m³	26,37	26,37		26,37	-	130,56	3.442,86	3.442,86	-	3.442,86	-	100,00
12.007.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	593,32	593,32		593,32	-	1,12	664,51	664,51	-	664,51	-	100,00
12.007.008	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m²	34,62	34,62		34,62	-	50,81	1.759,04	1.759,04	-	1.759,04	-	100,00
12.007.009	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	27,84	27,84		27,84	-	28,76	800,67	800,67	-	800,67	-	100,00
12.007.010	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	27,84	27,84		27,84	-	6,15	171,21	171,21	-	171,21	-	100,00
12.007.011	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m²	55,68	-	55,68	55,68	-	35,75	1.990,56	-	1.990,56	1.990,56	-	100,00
13	**PARQUE**								**19.105,21**	**17.255,75**	**1.849,46**	**19.105,21**	-	**100,00**
13.001	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	2,00	2,00		2,00	-	3.696,94	7.393,88	7.393,88	-	7.393,88	-	100,00
13.002	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1,00	1,00		1,00	-	3.609,33	3.609,33	3.609,33	-	3.609,33	-	100,00
13.003	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	1,00	1,00		1,00	-	2.622,14	2.622,14	2.622,14	-	2.622,14	-	100,00

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE								DATA DE TÉRMINO:	BOLETIM DE MEDIÇÃO 10					CONTRATO Nº 018/2025	
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA								VIGÊNCIA 06/02/2026	Período: 01/11/2025 a 31/01/2026					CONTRATO DE REPASSE	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								EXECUÇÃO 17/10/2025	Data da Medição :12/02/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R$)	Valores (R$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
13.004	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	20,00	20,00		20,00	-	181,52	3.630,40	3.630,40	-	3.630,40	-	100,00
13.005	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	6,00	-	6,00	6,00	-	75,07	450,42	-	450,42	450,42	-	100,00
13.006	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m²	175,98	-	175,98	175,98	-	7,95	1.399,04	-	1.399,04	1.399,04	-	100,00
14	ACADEMIA A CÉU ABERTO								63.370,01	58.281,70	5.088,31	63.370,01	-	100,00
14.001	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	un	3,00	3,00		3,00	-	2.655,03	7.965,09	7.965,09	-	7.965,09	-	100,00
14.002	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	2,00	2,00		2,00	-	3.930,89	7.861,78	7.861,78	-	7.861,78	-	100,00
14.003	Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01	un	2,00	2,00		2,00	-	3.179,95	6.359,90	6.359,90	-	6.359,90	-	100,00
14.004	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01	un	4,00	4,00		4,00	-	2.621,24	10.484,96	10.484,96	-	10.484,96	-	100,00
14.005	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	40,00	40,00		40,00	-	181,52	7.260,80	7.260,80	-	7.260,80	-	100,00
14.006	Equipamento de ginástica - Escada horizontal em tubo de ferro galv. ø=2", dim. 0,80 x 2,00 x 2,00m, Sergipark ou similar	Un	2,00	2,00		2,00	-	1.737,70	3.475,40	3.475,40	-	3.475,40	-	100,00
14.007	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m²	457,71	-	457,71	457,71	-	7,95	3.638,79	-	3.638,79	3.638,79	-	100,00
14.008	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média	un	2,00	-	2,00	2,00	-	81,54	163,08	-	163,08	163,08	-	100,00
14.009	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	m²	66,60	66,60		66,60	-	223,33	14.873,77	14.873,77	-	14.873,77	-	100,00
14.010	Fita adesiva para cumeeira plana (top plana), l=15cm	m	2,00	-	2,00	2,00	-	44,82	89,64	-	89,64	89,64	-	100,00
14.011	Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 2 demãos. af_01/2021	m²	66,60	-	66,60	66,60	-	17,97	1.196,80	-	1.196,80	1.196,80	-	100,00
15	GINÁTICA - 3ª IDADE - CONVIVÊNCIA - ADMINISTRAÇÃO								210.261,41	35.664,06	174.597,35	210.261,41	-	100,00
15.001	Revisão de esquadria de madeira	m²	4,80	-	4,80	4,80	-	102,45	491,76	-	491,76	491,76	-	100,00
15.002	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m²	10,56	-	10,56	10,56	-	26,19	276,57	-	276,57	276,57	-	100,00
15.003	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m²	2.204,65	-	2.204,65	2.204,65	-	21,63	47.686,58	-	47.686,58	47.686,58	-	100,00
15.004	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m²	385,85	385,85		385,85	-	64,87	25.030,08	25.030,08	(0,00)	25.030,08	-	100,00
15.005	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14 cm, laterais=15 cm, bordas=3 cm)	m	25,30	-	25,30	25,30	-	108,59	2.747,33	-	2.747,33	2.747,33	-	100,00
15.006	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02	m²	62,30	-	62,30	62,30	-	46,77	2.913,77	-	2.913,77	2.913,77	-	100,00
15.007	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m²	481,83	481,83		481,83	-	22,07	10.633,98	10.633,98	-	10.633,98	-	100,00
15.008	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	557,00		557,00	557,00	-	62,25	34.673,25		34.673,25	34.673,25	-	100,00
15.009	Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço	m²	520,00		520,00	520,00	-	38,45	19.994,00		19.994,00	19.994,00	-	100,00
15.010	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m²	520,00		520,00	520,00	-	25,31	13.161,20		13.161,20	13.161,20	-	100,00
15.011	Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022	m²	65,39		65,39	65,39	-	16,26	1.063,24		1.063,24	1.063,24	-	100,00

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE	DATA DE TÉRMINO:	BOLETIM DE MEDIÇÃO 10	CONTRATO Nº 018/2025
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	VIGÊNCIA 06/02/2026	Período: 01/11/2025 a 31/01/2026	CONTRATO DE REPASSE
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	EXECUÇÃO 17/10/2025	Data da Medição :12/02/2026	

Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R$)	Valores (R$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
15.012	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m²	1.543,25		1.543,25	1.543,25	-	13,72	21.173,39		21.173,39	21.173,39	-	100,00
15.013	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m²	661,39		661,39	661,39	-	9,75	6.448,55		6.448,55	6.448,55	-	100,00
15.014	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021	m²	110,00		110,00	110,00	-	95,38	10.491,80		10.491,80	10.491,80	-	100,00
15.015	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m²	15,53		15,53	15,53	-	427,28	6.635,66		6.635,66	6.635,66	-	100,00
15.016	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00		1,00	1,00	-	613,17	613,17		613,17	613,17	-	100,00
15.017	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00		1,00	1,00	-	677,11	677,11		677,11	677,11	-	100,00
15.018	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	4,00		4,00	4,00	-	630,01	2.520,04		2.520,04	2.520,04	-	100,00
15.019	Demolição de forros	m²	385,00		385,00	385,00	-	7,87	3.029,95		3.029,95	3.029,95	-	100,00
16	**MURO E GRADIL EXTERNO**								**219.690,36**	**173.119,74**	**46.570,62**	**219.690,36**	**-**	**100,00**
16.001	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	157,79	157,79		157,79	-	9,14	1.442,20	1.442,20	-	1.442,20	-	100,00
16.002	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar.	m²	130,93	130,93		130,93	-	314,94	41.235,09	41.235,09	-	41.235,09	-	100,00
16.003	Grade de ferro com quadro em barra chata 1 1/4" x 1/8", barra quadrada de 1" na vertical, barra chata horizontal de1 1/4" x 1/8"	m²	259,68	259,68		259,68	-	502,32	130.442,45	130.442,45	-	130.442,45	-	100,00
16.004	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m²	346,97	-	346,97	346,97	-	25,31	8.781,81	-	8.781,81	8.781,81	-	100,00
16.005	Tapume com telha metálica.	m²	370,00	-	370,00	370,00	-	84,91	31.416,70	-	31.416,70	31.416,70	-	100,00
16.006	Reassentamento de meio fio	m	100,00	-	100,00	100,00	-	9,94	994,00	-	994,00	994,00	-	100,00
16.007	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m³	130,80	-	130,80	130,80	-	24,70	3.230,76	-	3.230,76	3.230,76	-	100,00
16.008	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	m²	16,72	-	16,72	16,72	-	128,43	2.147,35	-	2.147,35	2.147,35	-	100,00
17	**MARCO INAUGURAL**								**2.643,42**	**-**	**2.643,42**	**2.643,42**	**-**	**100,00**
17.001	Marco Inaugural - Rev. 01 - Padrão PMI	un	1,00	-	1,00	1,00	-	668,91	668,91	-	668,91	668,91	-	100,00
17.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	-	1,00	1,00	-	1.827,91	1.827,91	-	1.827,91	1.827,91	-	100,00
17.003	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m²	3,61	-	3,61	3,61	-	40,61	146,60	-	146,60	146,60	-	100,00
18	**LIMPEZA GERAL**								**16.759,98**	**-**	**-**	**-**	**16.759,98**	**-**
18.001	Limpeza geral	m²	8.379,99	-		-	8.379,99	2,00	16.759,98	-	-	-	16.759,98	-
19	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**								**52.108,00**	**48.618,68**	**1.743,78**	**50.362,46**	**1.745,54**	**96,65**
19.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	H	200,00	186,63	6,68	193,31	6,69	147,64	29.528,00	27.553,59	986,23	28.539,82	988,18	96,65
19.002	Mestre de obras com encargos complementares	H	400,00	373,16	13,42	386,58	13,42	56,45	22.580,00	21.065,09	757,55	21.822,64	757,36	96,64
TOTAL:									**2.387.194,86**	**1.365.027,68**	**806.381,39**	**2.171.409,07**	**215.785,79**	**90,96**
PERCENTUAL										**57,18**	**33,78**	**90,96**	**9,04**	

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº_____ FORAM MEDIDOS E RECEBIDOS PELA FISCALIZAÇÃO EM PERFEITA ORDEM EM ___/___/_____

CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA

KLEBER DE SOUZA OLIVEIRA:79045880563 Assinado de forma digital por KLEBER DE SOUZA OLIVEIRA:79045880563 Dados: 2026.02.24 10:16:43 -03'00'

ASSINATURA DA EMPRESA

APROVADO PARA PAGAMENTO ___/___/_____

PROTOCOLO

Documento assinado digitalmente
gov.br
JHON LENNON GOMES SANTOS
Data: 24/02/2026 12:11:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente
gov.br
MIKAELY DA SILVA OLIVEIRA
Data: 24/02/2026 12:31:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE				MEMÓRIA DE CÁLCULO ADITIVO Período:01/11/2025 a 31/01/2026	CONTRATO Nº 018/2025
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				Data de medição: 12/02/2026	
Item	**Discriminação dos Serviços**	**Und**	**MEDIDO**	**MEMÓRIA DE CÁLCULO**	
02	**CALÇADA E ESTACIONAMENTO**				
02.004	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de	m²	40,00	Quantitativo obtido por AUTOCAD	
02.005	Pintura de meio fio (caiação)	m	305,56	Quantitativo obtido por AUTOCAD	
02.006	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo -	m²	5,50	Quantitativo obtido por AUTOCAD	
03	**PISTA PARA CAMINHADA/CORRIDA**				
03.004	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de	m²	28,05	Quantitativo obtido por AUTOCAD	
03.005	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo -	m²	434,07	Quantitativo obtido por AUTOCAD	
03.006	Pintura de meio fio (caiação)	m	692,43	Quantitativo obtido por AUTOCAD	
04	**PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA**				
04.001	Demolição de concreto manualmente	m³	37,24	Pista de skate: 26,50mx20,10mx0,07	
04.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m³	37,24	Pista de skate: 26,50mx20,10mx0,07	
04.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	3.994,87	3.994,87tkm	
04.004	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m²	80,29	Quantitativo obtido por AUTOCAD	
04.005	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. af_10/2022	m²	30,29	Quantitativo obtido por AUTOCAD	
04.006	Destocamento de árvores diâmetro superior a 0,30m	un	2,00	02 arvores retiradas	
06	**RAMPA E ESCADA DE ACESSO**				
06.005	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m²	35,26	100% do serviço executado	

Item	Discriminação dos Serviços	Und	MEDIDO	MEMÓRIA DE CÁLCULO
06.006	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m²	42,00	100% do serviço executado
07	TOTEM			
07.001	Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço	m²	66,00	55mx1,20m
07.002	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m²	190,40	55mx1,20m+124,40m
08	URBANIZAÇÃO			
08.002	Pintura de meio fio (caiação)	m	652,04	Quantitativo obtido por AUTOCAD
08.004	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, pequena	un	6,00	06 unidades de palmeiras
08.006	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	333,00	11 pontos de água para rede de irrigação das gramas
09	ILUMINAÇÃO DA PRAÇA			
09.001	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 170lm/w,24.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	un	36,00	Luminárias da ADM
10	QUADRA COBERTA, VESTIÁRIO, TEATRO ARENA			
10.1	QUADRA COBERTA - COBERTURA			
10.001.001	Remoção e reassentamento de telha trapezoidal em alumínio	m²	461,64	Área obtida por AUTOCAD
10.001.002	Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até	m²	1.200,12	Área obtida por AUTOCAD
10.001.007	Desmontagem de Estrutura Metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira	m²	646,30	Área obtida por AUTOCAD
10.001.008	Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical (em kg). af_07/2019	KG	1.026,12	Peças que foram trocadas da ADM: 34 perfis simples 75x40x3mm= 693,6kg + 14 perfis enrijecidos 75x40x15x3=323,4+9,12KG
10.001.011	Trave para campo de futebol soçaite, desmontável	par	2,00	Trave do campo descoberto

Item	Discriminação dos Serviços	Und	MEDIDO	MEMÓRIA DE CÁLCULO
10.001.012	Estrutura Metálica Móvel, p/ Tabela e Cesta de Basquete, Padrão Oficial em Tubo Galvanizado 2"	par	1,00	Basquete da quadra coberta
10.001.014	Caixa d´água em polietileno, 2000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021	un	3,00	Banheiro/vestiário da quadra coberta
10.004	**QUADRA COBERTA - PISO**			
10.004.001	Demolição de piso de alta resistência	m²	44,20	Tiro de guerra (Exercito): Vestiário-ADM 27,79M²+HOLL PNE 2,54M²+ SALA COMANDO/APOIO T: 2,56 +WC SALA/SALA SERVIÇO MILITAR 5,31M²+6,00M²
10.004.005	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de	m²	532,65	Pista de skate: 26,50mx20,10m
10.004.006	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	m²	1.289,91	Área obtida por AUTOCAD
10.006	**VESTIÁRIO E TEATRO ARENA**			
10.006.001	Remoção e reassentamento de telha trapezoidal em	m²	127,48	Área obtida por AUTOCAD
10.006.002	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	m²	320,63	Área obtida por AUTOCAD
10.006.006	Limpeza de fossa acima de 5m3	m³	7,41	7,41m³
10.006.008	Limpeza de reservatório	m³	2,00	02 reservatório
10.006.009	Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021	m²	26,40	Área obtida por AUTOCAD
10.006.011	Revisão de esquadria de madeira	m²	15,36	Área obtida por AUTOCAD
10.006.013	Lavatório / cuba de sobrepor retangular sem mesa em louça branca, *50 x 40*cm, com sifão, engate e válvula cromados, exclusive torneira	un	14,00	Banheiros da ADM, vestiário/WC da quadra coberta
10.006.014	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	un	17,00	Banheiros da ADM, vestiário/WC da quadra coberta
10.006.015	Torneira para lavatório, 1193, Docol, ref. 2005056 ou similar	un	14,00	Banheiros da ADM, vestiário/WC da quadra coberta

Item	Discriminação dos Serviços	Und	MEDIDO	MEMÓRIA DE CÁLCULO
10.006.016	Revestimento cerâmico para piso ou parede, cerâmica 37 x 59 cm acabamento fosco retificado, Arielle, linha riviera branco ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	664,07	Memória no anexo 01
10.006.017	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m²	664,07	Memória no anexo 01
10.006.018	Demolição de piso cerâmico ou Ladrilho	m²	178,83	Memória no anexo 01
10.006.019	Demolição de reboco	m²	100,70	Demolição do reboco fofo do palco arena: 5,25mx2,00+11,50mx2,00m+4,60mx2,00m+5,00mx2,00m+5,00 mx2,00m+5,00x3,00m+5,00mx2,00m
10.006.020	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha gretna, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	178,83	Memória no anexo 01
10.006.021	Restauro - Reboco especial de parede, spessura 3cm, com argamassa traço 1:0,24:0,74 (cal, arenoso e areia média)	m²	100,70	Demolição do reboco fofo do palco arena: 5,25mx2,00+11,50mx2,00m+4,60mx2,00m+5,00mx2,00m+5,00 mx2,00m+5,00x3,00m+5,00mx2,00m
10.006.022	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m²	25,95	Área obtida por AUTOCAD
10.007	**ILUMINAÇÕES**			
10.007.002	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	un	2,00	02 interruptores na ADM
10.007.003	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	un	6,00	06 pontos de tomadas revisados na ADM
10.008	**DIVERSOS**			
10.008.002	Grama batatais em placas, fornecimento e plantio	m²	1.800,00	Área obtida por AUTOCAD
11	**CAMPO DE FUTEBOL E QUADRA DE AREIA**			
11.004	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	760,80	60% da grama executada
11.009	Lona plástica preta	m²	1.269,00	Área obtida por AUTOCAD

Item	Discriminação dos Serviços	Und	MEDIDO	MEMÓRIA DE CÁLCULO
11.010	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2),	m²	1.269,00	Área obtida por AUTOCAD
11.011	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1,00	Uma unidade de Poste
12.001	**OBSTÁCULO 01 (EXISTENTE)**			
12.001.001	Enceramento de piso de alta resistência (existente)	m²	26,30	Área obtida por AUTOCAD
12.001.002	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m²	26,30	Área obtida por AUTOCAD
12.001.003	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m²	5,80	Área obtida por AUTOCAD
12.001.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m²	30,96	Área obtida por AUTOCAD
12.001.005	Restauro - Reboco especial de parede, spessura 3cm, com argamassa traço 1:0,24:0,74 (cal, arenoso e areia média)	m²	2,23	Área obtida por AUTOCAD
12.002	**OBSTÁCULO 02 (EXISTENTE)**			
12.002.001	Enceramento de piso de alta resistência (existente)	m²	21,13	Área obtida por AUTOCAD
12.002.002	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m²	21,13	Área obtida por AUTOCAD
12.002.003	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m²	1,60	Área obtida por AUTOCAD
12.002.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m²	9,36	Área obtida por AUTOCAD
12.002.005	Restauro - Reboco especial de parede, spessura 3cm, com argamassa traço 1:0,24:0,74 (cal, arenoso e areia média)	m²	1,53	Área obtida por AUTOCAD
12.003	**OBSTÁCULO 03**			
12.003.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	2,87	Área obtida por AUTOCAD
12.003.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m³	4,30	Área obtida por AUTOCAD

Item	Discriminação dos Serviços	Und	MEDIDO	MEMÓRIA DE CÁLCULO
12.003.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	12,90	Área obtida por AUTOCAD
12.003.004	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m³	2,58	Área obtida por AUTOCAD
12.003.005	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m³	0,72	Área obtida por AUTOCAD
12.003.006	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m²	11,21	Área obtida por AUTOCAD
12.003.007	Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com	m²	11,21	Área obtida por AUTOCAD
12.003.008	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento	m²	2,86	Área obtida por AUTOCAD
12.003.009	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa	m²	2,86	Área obtida por AUTOCAD
12.003.010	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento,	m²	2,86	Área obtida por AUTOCAD
12.004	**OBSTÁCULO 04**			
12.004.009	Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	m²	11,88	Área obtida por AUTOCAD
12.004.012	Corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria	m	50,12	Área obtida por AUTOCAD
12.004.013	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão	m²	2,46	Área obtida por AUTOCAD
12.007	**OBSTÁCULO 07**			
12.007.011	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m²	55,68	Área obtida por AUTOCAD
13	**PARQUE**			
13.005	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	6,00	Ipês plantados no centro dos bancos de tijolos
13.006	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo -	m²	175,98	Área obtida por AUTOCAD

Item	Discriminação dos Serviços	Und	MEDIDO	MEMÓRIA DE CÁLCULO
14	ACADEMIA A CÉU ABERTO			
14.007	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m²	457,71	Área obtida por AUTOCAD
14.008	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média	un	2,00	02 palmeira mini
14.010	Fita adesiva para cumeeira plana (top plana), l=15cm	m	2,00	02m de cumeeira
14.011	Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 2 demãos. af_01/2021	m²	66,60	Área obtida por AUTOCAD-PERGOLADOS
15	GINÁTICA - 3ª IDADE - CONVIVÊNCIA - ADMINISTRAÇÃO			
15.001	Revisão de esquadria de madeira	m²	4,80	Área obtida por AUTOCAD
15.002	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m²	10,56	Área obtida por AUTOCAD
15.003	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02	m²	2.204,65	Área obtida por AUTOCAD
15.005	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14 cm, laterais=15 cm, bordas=3 cm)	m	25,30	Área obtida por AUTOCAD
15.006	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02	m²	62,30	Área obtida por AUTOCAD
15.008	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	m²	557,00	Área obtida por AUTOCAD
15.009	Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço	m²	520,00	Área obtida por AUTOCAD
15.010	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta	m²	520,00	Área obtida por AUTOCAD
15.011	Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022	m²	65,39	Memória em anexo 03
15.012	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m²	1.543,25	Área obtida por AUTOCAD
15.013	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m²	661,39	Área obtida por AUTOCAD
15.014	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de	m²	110,00	Memória no anexo 02

Item	Discriminação dos Serviços	Und	MEDIDO	MEMÓRIA DE CÁLCULO
15.015	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m²	15,53	(3,00mx0,56m)x2+(1,06mx0,58m)+(3,00mx0,58m)+(1,18mx0,60)x2+(3,00mx0,68m)x4+(3,00mx0,60)x2
15.016	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	Porta de acesso a sala do comando/apoio/TG
15.017	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	Porta de acesso a sala do serviço Militar/TG
15.018	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	4,00	01 Porta de acesso a sala do comando /Apoio+02 portas na sala de Meios+01 porta da Cozinha
15.019	Demolição de forros	m²	385,00	Área obtida por AUTOCAD
16	**MURO E GRADIL EXTERNO**			
16.004	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta	m²	346,97	Área obtida por AUTOCAD
16.005	Tapume com telha metálica.	m²	370,00	Área obtida por AUTOCAD
16.006	Reassentamento de meio fio	m	100,00	Área obtida por AUTOCAD
16.007	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m³	130,80	Área obtida por AUTOCAD
16.008	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	m²	16,72	(2,30m+2,20m+3,85m+1,50m+2,45m+2,45m+1,00m+1000m)x 0,50m
17	**MARCO INAUGURAL**			
17.001	Marco Inaugural - Rev. 01 - Padrão PMI	un	1,00	01 unid
17.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	01und
17.003	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02	m²	3,61	Área obtida por AUTOCAD

KLEBER DE SOUZA OLIVEIRA:79045880563 Assinado de forma digital por KLEBER DE SOUZA OLIVEIRA:79045880563 Dados: 2026.02.24 11:55:21 -03'00'

CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA

Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por | Data: ___/___/_____

Data: ___/___/_____

gov.br Documento assinado digitalmente
JHON LENNON GOMES SANTOS
Data: 25/02/2026 07:57:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
MIKAELY DA SILVA OLIVEIRA
Data: 25/02/2026 08:48:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE

CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 10

CONTRATO nº 018/2025

ORDEM DE SERVIÇO
INICIO - 17/02/2025

Período - 01/11/2025 a 31/01/2026
Medição - 12/02/2026



PISO EM CONCRETO




PINTURA DE MEIO FIO




PINTURA DE PISO



EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO

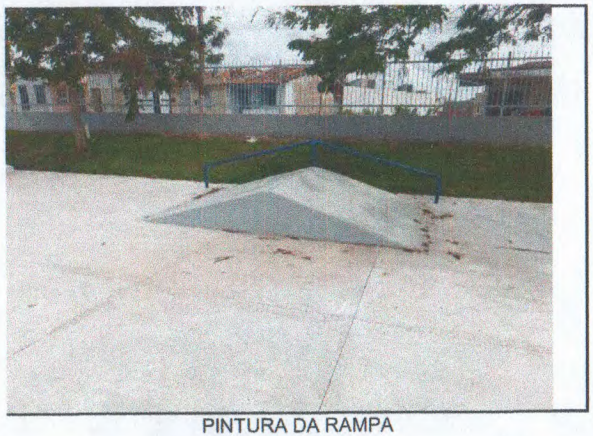

PINTURA DA RAMPA

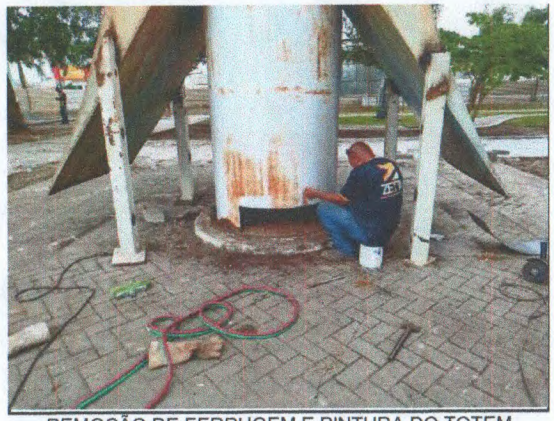

REMOÇÃO DE FERRUGEM E PINTURA DO TOTEM

ELABORADO POR:

Mikaely da Silva Oliveira
Arq Urb CAU/SE A195461-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santo
Eng. Civil CREA [illegible]721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE

CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 10

CONTRATO nº 018/2025

ORDEM DE SERVIÇO
INICIO - 17/02/2025


Período - 01/11/2025 a 31/01/2026
Medição - 12/02/2026



REMOÇÃO DE FERRUGEM E PINTURA DO TOTEM



LUMINARIA EM LED

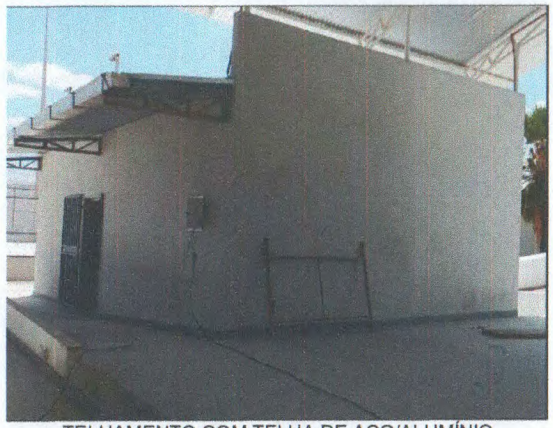

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO



TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS



DEMOLIÇÃO, EXECUÇÃO E POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA



REVESTIMNTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE

ELABORADO POR:

Mikaely da Silva Oliveira
Arq Urb CAU/SE A195461-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 10	CONTRATO nº 018/2025 ORDEM DE SERVIÇO INICIO - 17/02/2025 Período - 01/11/2025 a 31/01/2026 Medição - 12/02/2026



VASO SANITÁRIO



LAVATÓRIO/CUBA



REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMÍNIO



PORTA OU JANELA EM ALUMÍNIO



LUMINÁRIA LED



GRAMA BATATAIS

ELABORADO POR:

Mikaely da Silva Oliveira
Arq Urb CAU/SE A195461-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE

CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 10

CONTRATO nº 018/2025

ORDEM DE SERVIÇO
INICIO - 17/02/2025

Período - 01/11/2025 a 31/01/2026
Medição - 12/02/2026



GRAMA CAMPO DE FUTEBOL



LONA PLÁSTICA QUADRA



TELA DE AÇO SOLDADA QUADRA



ENCERAMENTO E POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA DA PISTA DE SKATE



PINTURA DA PISTA DE SKATE



PINTURA PARQUE

ELABORADO POR:

Mikaely da Silva Oliveira
Arq Urb CAU/SE A195461-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE

CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 10

CONTRATO nº 018/2025

ORDEM DE SERVIÇO
INICIO - 17/02/2025

Período - 01/11/2025 a 31/01/2026
Medição - 12/02/2026



PINTURA DA ACADEMIA A CÉU ABERTO



EMASSAMENTO E PINTURA PAREDE - GINÁSTICA 3ª IDADE



TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO - GINÁSTICA 3ª IDADE



BASCULANTE



DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE FORRO



PINTURA DO MURO

ELABORADO POR:

Mikaely da Silva Oliveira
Arq Urb CAU/SE A195461-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE

CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 10

CONTRATO nº 018/2025

ORDEM DE SERVIÇO
INICIO - 17/02/2025

Período - 01/11/2025 a 31/01/2026
Medição - 12/02/2026



TAPUME



MURO



CALÇADA



GRAMA BATATAIS



QUADRA

ELABORADO POR: KLEBER DE SOUZA OLIVEIRA:79045880563

Assinado de forma digital por KLEBER DE SOUZA OLIVEIRA:79045880563
Dados: 2026.02.24 10:00:48 -03'00'

Mikaely da Silva Oliveira
Arq Urb CAU/SE A195461-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA [illegible]721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana
