OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.	**CONTRATO: 138/2024**	**Boletim de Medição Aditivo : 01**
CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.	**VIGÊNCIA: 07/2024 a 07/2025**	**Período: 26/09/2024 a 31/10/2024**
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	**EXECUÇÃO: 07/2024 a 03/2025**	**Data de medição: 10/11/2024**

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

Item	Descrição dos Serviços	Und.	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	Preço Unitário (R$)	Contratada	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a Medir	% Medido
1	**1º ADITIVO**								**R$ 1.151.498,30**	**R$ -**	**R$ 1.138.493,78**	**R$ 1.138.493,78**	**R$ 13.004,51**	**98,87**
1.1	**RUA ANTONIO JOSE DA COSTA**								**R$ 607.617,09**	**R$ -**	**R$ 607.617,07**	**R$ 607.617,07**	**R$ 0,02**	**100,00**
1.1.1	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusiveExecução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	6.796,830		**6.796,83**	6.796,830	-	R$ 0,99	R$ 6.728,86	R$ -	R$ 6.728,86	R$ 6.728,86	R$ -	100,00
1.1.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	339,840		**339,84**	339,840	-	R$ 1.683,47	R$ 572.110,44	R$ -	R$ 572.110,44	R$ 572.110,44	R$ -	100,00
1.1.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	24.468,590		**24.468,59**	24.468,590	-	R$ 0,63	R$ 15.415,21	R$ -	R$ 15.415,21	R$ 15.415,21	R$ -	100,00
1.1.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	16.312,390		**16.312,39**	16.312,390	-	R$ 0,24	R$ 3.914,97	R$ -	R$ 3.914,97	R$ 3.914,97	R$ -	100,00
1.1.5	Limpeza geral	m2	6.796,830		**6.796,830**	6.796,830	-	R$ 1,39	R$ 9.447,59	R$ -	R$ 9.447,59	R$ 9.447,59	R$ -	100,00
1.2	**ÁREAS DE BORRACHUDOS**								**R$ 530.590,01**	**R$ -**	**R$ 530.590,01**	**R$ 530.590,01**	**R$ -**	
1.2.1	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	1.790,000		**1.790,00**	1.790,000	-	R$ 10,46	R$ 18.723,40	R$ -	R$ 18.723,40	R$ 18.723,40	R$ -	100,00
1.2.2	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	2.183,800		**2.183,80**	2.183,800	-	R$ 1,00	R$ 2.183,80	R$ -	R$ 2.183,80	R$ 2.183,80	R$ -	100,00
1.2.3	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	txkm	49.135,500		**49.135,50**	49.135,500	-	R$ 1,22	R$ 59.945,31	R$ -	R$ 59.945,31	R$ 59.945,31	R$ -	100,00
1.2.4	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m3	1.790,000		**1.790,00**	1.790,000	-	R$ 223,80	R$ 400.602,00	R$ -	R$ 400.602,00	R$ 400.602,00	R$ -	100,00
1.2.5	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	txkm	40.275,000		**40.275,000**	40.275,000	-	R$ 1,22	R$ 49.135,50	R$ -	R$ 49.135,50	R$ 49.135,50	R$ -	100,00
1.3	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**R$ 13.291,20**	R$ 0,00	**R$ 286,70**	**R$ 286,70**	**R$ 13.004,51**	
1.3.1	Ensaio - Marshall	un	2,000		**2,000**	2,000	-	R$ 143,35	R$ 286,70	R$ -	R$ 286,70	R$ 286,70	R$ -	100,00
1.3.2	Pintura de meio fio (caiação)	m	1.463,400			-	1.463,400	R$ 2,39	R$ 3.497,53	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.497,53	0,00
1.3.3	PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLÁSTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSÃO)	m2	219,510			-	219,510	R$ 43,31	R$ 9.506,98	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9.506,98	0,00
								VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO	**R$ 1.151.498,30**	**R$ -**	**R$ 1.138.493,78**	**R$ 1.138.493,78**	**R$ 13.004,52**	98,87
								PERCENTUAL	**100%**	**0,00%**	**98,87%**	**98,87%**	**1,13%**	

Yan Henrique Tavares Santana
Engº Civil - CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA: 83019200415

Assinado digitalmente por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=36702921000143, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024-11-21 10:10:35
Foxit Reader Versão: 9.5.0

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSE ROBSON SANTOS DA PAIXAO
Data: 21/11/2024 10:39:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.		
CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.	CONTRATO: 138/2024	
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		

RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 01 - ADITIVO

RECUPERAÇÃO DOS BORRACHUDOS

RECUPERAÇÃO DOS BORRACHUDOS

RECUPERAÇÃO DOS BORRACHUDOS

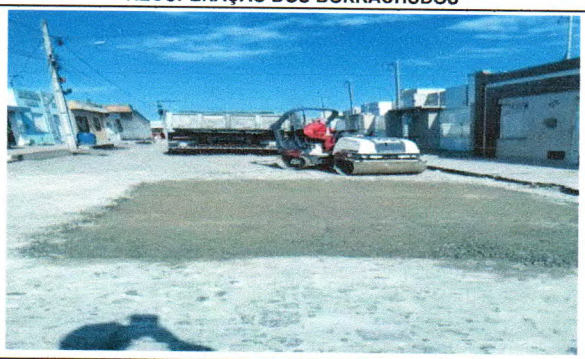

RECUPERAÇÃO DOS BORRACHUDOS

RECUPERAÇÃO DOS BORRACHUDOS

RUA ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA

RUA ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA

RUA ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA: 2715638353
Coordenador de Núcleo

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.	CONTRATO: 138/2024

Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 01 - ADITIVO

RUA ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA	RUA ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA
RUA ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA	**RUA ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA**

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSE ROBSON SANTOS DA PAIXAO
Data: 21/11/2024 10:39:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA: 83019200415

Assinado digitalmente por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=36702921000143, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA: 83019200415
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024-11-21 10:17:20
Foxit Reader Versão: 9.5.0

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.						
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos						
EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.						
MATERIAIS:	1.1	RUA LAURINDA MARIA MENDONÇA				
ITEM:	1.1.1	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusiveExecução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante,				

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			m2	Total
	Comp.		Larg.		
Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusiveExecução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	125,92	x	5,100	m2	642,18
	47,40	x	4,00		189,60
	37,00	x	3,50		129,50
	TOTAL				961,28
EXECUTADO NO PERÍODO:				m2	961,28
ACUMULADO ANTERIOR:				m2	-
ACUMULADO ATUAL:				m2	961,28
SALDO DO CONTRATO:				m2	961,28
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				m2	-
A MEDIR NO PERÍODO:					961,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 137/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.		
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos		
EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.		
MATERIAIS:	**1.1**	**RUA LAURINDA MARIA MENDONÇA**
ITEM:	**1.1.2**	**Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019**

Serviço	**VALORES**			**UNID.**	**QUANT.**
	Quantidade			**m3**	**Total**
	Comp.	**Larg.**	**ESP.**		
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	125,92	5,100	0,050	m3	32,11
	47,40	4,00	0,050		9,48
	37,00	3,50	0,050		6,48
	TOTAL				48,06

EXECUTADO NO PERÍODO:	m3	**48,06**
ACUMULADO ANTERIOR:	m3	-
ACUMULADO ATUAL:	m3	**48,06**
SALDO DO CONTRATO:	m3	**48,06**
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	m3	-
A MEDIR NO PERÍODO:		**48,06**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 137/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.		
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos		
EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.		
MATERIAIS:	**1.1**	**RUA LAURINDA MARIA MENDONÇA**
ITEM:	**1.1.3**	**Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020**

Serviço	**VALORES**			**UNID.**	**QUANT.**
	QUANTIDADE			**Mês**	**Total**
	Vol.	**Peso esp.**	**Dist.**		
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	48,06	2,40	30,000	Mês	3.460,41

EXECUTADO NO PERÍODO:			**3.460,41**
ACUMULADO ANTERIOR:			-
ACUMULADO ATUAL:			**3.460,41**
SALDO DO CONTRATO:			**3.460,41**
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			-
A MEDIR NO PERÍODO:		Mês	**3.460,41**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE **CONTRATO: 137/2024**	**CÁLCULO EXPLICATIVO**

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.	

Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

MATERIAIS:	**1.1**	**RUA LAURINDA MARIA MENDONÇA**
ITEM:	**1.1.4**	**Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade:**

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			txkm	Total
	Vol.	Peso esp.	Dist.		
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	48,06	2,40	20,000	txkm	2.307,07

EXECUTADO NO PERÍODO:	txkm	**2.307,07**
ACUMULADO ANTERIOR:	txkm	-
ACUMULADO ATUAL:	txkm	**2.307,07**
SALDO DO CONTRATO:	txkm	**2.307,07**
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	txkm	-
À MEDIR NO PERÍODO:		**2.307,07**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 137/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

MATERIAIS:	**1.1**	**RUA LAURINDA MARIA MENDONÇA**
ITEM:	**1.1.5**	**Limpeza geral**

Serviço	VALORES Quantidade Comp.		Larg.	UNID. m2	QUANT. Total
Limpeza geral	125,92	x	5,100	m2	642,18
	47,40	x	4,00		189,60
	37,00	x	3,50		129,50
	TOTAL				961,28

EXECUTADO NO PERÍODO:	m2	**961,28**
ACUMULADO ANTERIOR:	m2	-
ACUMULADO ATUAL:	m2	**961,28**
SALDO DO CONTRATO:	m2	**961,28**
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	m2	-
A MEDIR NO PERÍODO:		**961,28**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 137/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.		
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos		
EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.		
MATERIAIS:	**1.2**	**TRAVESSA MARIA CRISTINA DE REZENDE**
ITEM:	**1.2.1**	**Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusiveExecução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante,**

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			m2	Total
	Comp.		Larg.		
Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusiveExecução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	110,48	x	4,000	m2	441,90
EXECUTADO NO PERÍODO:				m2	441,90
ACUMULADO ANTERIOR:				m2	-
ACUMULADO ATUAL:				m2	441,90
SALDO DO CONTRATO:				m2	441,90
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				m2	-
À MEDIR NO PERÍODO:					441,900

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 137/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

MATERIAIS:	**1.2**	**TRAVESSA MARIA CRISTINA DE REZENDE**
ITEM:	**1.2.2**	**Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019**

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			m3	Total
	Comp.	Larg.	ESP.		
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	110,48	4,000	0,050	m3	22,10

EXECUTADO NO PERÍODO:	m3	**22,10**
ACUMULADO ANTERIOR:	m3	-
ACUMULADO ATUAL:	m3	**22,10**
SALDO DO CONTRATO:	m3	**22,10**
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	m3	-
A MEDIR NO PERÍODO:		**22,10**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 137/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.	
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos	
EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.	

MATERIAIS:	**1.2**	**TRAVESSA MARIA CRISTINA DE REZENDE**
ITEM:	**1.2.3**	**Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020**

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	QUANTIDADE			Mês	Total
	Vol.	Peso esp.	Dist.		
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	22,10	2,40	30,000	Mês	1.590,84

EXECUTADO NO PERÍODO:			**1.590,84**
ACUMULADO ANTERIOR:			-
ACUMULADO ATUAL:			**1.590,84**
SALDO DO CONTRATO:			**1.590,84**
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			-
A MEDIR NO PERÍODO:		Mês	**1.590,84**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE **CONTRATO: 137/2024**	**CÁLCULO EXPLICATIVO**

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.	

Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

MATERIAIS:	**1.2**	**TRAVESSA MARIA CRISTINA DE REZENDE**
ITEM:	**1.2.4**	**Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade:**

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			txkm	Total
	Vol.	Peso esp.	Dist.		
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	22,10	2,40	20,000	txkm	1.060,56

EXECUTADO NO PERÍODO:	txkm	**1.060,56**
ACUMULADO ANTERIOR:	txkm	-
ACUMULADO ATUAL:	txkm	**1.060,56**
SALDO DO CONTRATO:	txkm	**1.060,56**
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	txkm	-
A MEDIR NO PERÍODO:		**1.060,56**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 137/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.**	NOVATEC
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos	
EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.	

MATERIAIS:	**1.2**	**TRAVESSA MARIA CRISTINA DE REZENDE**
ITEM:	**1.2.5**	**Limpeza geral**

Serviço	**VALORES**			**UNID.**	**QUANT.**
	Quantidade			**m2**	**Total**
	Comp.		**Larg.**		
Limpeza geral	110,48	x	4,000	m2	441,90

EXECUTADO NO PERÍODO:	m2	**441,90**
ACUMULADO ANTERIOR:	m2	-
ACUMULADO ATUAL:	m2	**441,90**
SALDO DO CONTRATO:	m2	**441,90**
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	m2	-
À MEDIR NO PERÍODO:		**441,90**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE **CONTRATO: 137/2024**	**CÁLCULO EXPLICATIVO**

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.		
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos		
EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.		
MATERIAIS:	**1.3**	**RUA MARIA LUIZA MENDONÇA**
ITEM:	**1.3.1**	**Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusiveExecução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante,**

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			m2	Total
	Comp.		Larg.		
Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusiveExecução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	138,12	x	8,000	m2	1.105,00
EXECUTADO NO PERÍODO:				m2	**1.105,00**
ACUMULADO ANTERIOR:				m2	-
ACUMULADO ATUAL:				m2	**1.105,00**
SALDO DO CONTRATO:				m2	**1.105,00**
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				m2	-
A MEDIR NO PERÍODO:					**1.105,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 137/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

MATERIAIS:	**1.3**	**RUA MARIA LUIZA MENDONÇA**
ITEM:	**1.3.2**	**Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019**

Serviço	VALORES Quantidade Comp.	Larg.	ESP.	UNID. m3	QUANT. Total
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	138,12	8,000	0,050	m3	55,25
EXECUTADO NO PERÍODO:				m3	55,25
ACUMULADO ANTERIOR:				m3	-
ACUMULADO ATUAL:				m3	55,25
SALDO DO CONTRATO:				m3	55,25
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				m3	-
A MEDIR NO PERÍODO:					55,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 137/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.		
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos		
EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.		
MATERIAIS:	**1.3**	**RUA MARIA LUIZA MENDONÇA**
ITEM:	**1.3.3**	**Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020**

Serviço	**VALORES**			**UNID.**	**QUANT.**
	QUANTIDADE			**Mês**	**Total**
	Vol.	**Peso esp.**	**Dist.**		
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	55,25	2,40	30,000	Mês	3.978,00

EXECUTADO NO PERÍODO:			**3.978,00**
ACUMULADO ANTERIOR:			-
ACUMULADO ATUAL:			**3.978,00**
SALDO DO CONTRATO:			**3.978,00**
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			-
A MEDIR NO PERÍODO:		Mês	**3.978,00**

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.	

Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

MATERIAIS:	**1.3**	**RUA MARIA LUIZA MENDONÇA**
ITEM:	**1.3.4**	**Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade:**

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			txkm	Total
	Vol.	Peso esp.	Dist.		
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	55,25	2,40	20,000	txkm	2.652,00

EXECUTADO NO PERÍODO:	txkm	**2.652,00**
ACUMULADO ANTERIOR:	txkm	**-**
ACUMULADO ATUAL:	txkm	**2.652,00**
SALDO DO CONTRATO:	txkm	**2.652,00**
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	txkm	**-**
A MEDIR NO PERÍODO:		**2.652,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 137/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.	
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos	
EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.	

MATERIAIS:	**1.3**	**RUA MARIA LUIZA MENDONÇA**
ITEM:	**1.3.5**	**Limpeza geral**

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			m2	Total
	Comp.		Larg.		
Limpeza geral	138,12	x	8,000	m2	1.105,00

EXECUTADO NO PERÍODO:	m2	**1.105,00**
ACUMULADO ANTERIOR:	m2	-
ACUMULADO ATUAL:	m2	**1.105,00**
SALDO DO CONTRATO:	m2	**1.105,00**
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	m2	-
A MEDIR NO PERÍODO:		**1.105,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE **CONTRATO: 137/2024**	**CÁLCULO EXPLICATIVO**

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

NOVATEC

Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

MATERIAIS:	**1.4**	**RUA ANTONIO GERMANO**
ITEM:	**1.4.1**	**Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusiveExecução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante,**

Serviço	VALORES Quantidade			UNID. m2	QUANT. Total
	Comp.		Larg.		
Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusiveExecução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	202,90	x	6,000	m2	1.217,40

EXECUTADO NO PERÍODO:	m2	**1.217,40**
ACUMULADO ANTERIOR:	m2	-
ACUMULADO ATUAL:	m2	**1.217,40**
SALDO DO CONTRATO:	m2	**1.217,40**
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	m2	-
A MEDIR NO PERÍODO:		**1.217,40**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 137/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

MATERIAIS:	**1.4**	**RUA ANTONIO GERMANO**
ITEM:	**1.4.2**	**Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019**

Serviço	**VALORES**			**UNID.**	**QUANT.**
	Quantidade			**m3**	**Total**
	Comp.	**Larg.**	**ESP.**		
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	202,90	6,000	0,050	m3	60,87

EXECUTADO NO PERÍODO:	m3	**60,87**
ACUMULADO ANTERIOR:	m3	**-**
ACUMULADO ATUAL:	m3	**60,87**
SALDO DO CONTRATO:	m3	**60,87**
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	m3	**-**
À MEDIR NO PERÍODO:		**60,87**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 137/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.	
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos	
EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.	

MATERIAIS:	**1.4**	**RUA ANTONIO GERMANO**
ITEM:	**1.4.3**	**Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020**

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	QUANTIDADE			Mês	Total
	Vol.	Peso esp.	Dist.		
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	60,87	2,40	30,000	Mês	4.382,64

EXECUTADO NO PERÍODO:			**4.382,64**
ACUMULADO ANTERIOR:			-
ACUMULADO ATUAL:			**4.382,64**
SALDO DO CONTRATO:			**4.382,64**
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			-
À MEDIR NO PERÍODO:		Mês	**4.382,64**

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

MATERIAIS:	**1.4**	**RUA ANTONIO GERMANO**
ITEM:	**1.4.4**	**Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade:**

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			txkm	Total
	Vol.	Peso esp.	Dist.		
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	60,87	2,40	20,000	txkm	2.921,76

EXECUTADO NO PERÍODO:	txkm	**2.921,76**
ACUMULADO ANTERIOR:	txkm	-
ACUMULADO ATUAL:	txkm	**2.921,76**
SALDO DO CONTRATO:	txkm	**2.921,76**
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	txkm	-
A MEDIR NO PERÍODO:		**2.921,76**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 137/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

Folha Nº 137

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

NOVATEC

Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

MATERIAIS:	**1.4**	**RUA ANTONIO GERMANO**
ITEM:	**1.4.5**	**Limpeza geral**

Serviço	VALORES Quantidade Comp.		Larg.	UNID. m2	QUANT. Total
Limpeza geral	202,90	x	6,000	m2	1.217,40

EXECUTADO NO PERÍODO:	m2	**1.217,40**
ACUMULADO ANTERIOR:	m2	-
ACUMULADO ATUAL:	m2	**1.217,40**
SALDO DO CONTRATO:	m2	**1.217,40**
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	m2	-
A MEDIR NO PERÍODO:		**1.217,40**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 137/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

MATERIAIS:	**1.5**	**TRAVESSA MORADA NOBRE**
ITEM:	**1.5.1**	**Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusiveExecução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante,**

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			m2	Total
	Comp.		Larg.		
Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusiveExecução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	53,59	x	5,000	m2	267,95
	84,90	x	5,00		424,50
	14,70	x	10,50		154,35
	TOTAL				846,80

EXECUTADO NO PERÍODO:	m2	**846,80**
ACUMULADO ANTERIOR:	m2	-
ACUMULADO ATUAL:	m2	**846,80**
SALDO DO CONTRATO:	m2	**846,80**
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	m2	-
A MEDIR NO PERÍODO:		**846,80**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 137/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.	
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos	

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

MATERIAIS:	1.5	TRAVESSA MORADA NOBRE
ITEM:	1.5.2	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			m3	Total
	Comp.	Larg.	ESP.		
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af 11/2019	53,59	5,000	0,050	m3	13,40
	84,90	5,00	0,050		21,23
	14,70	10,50	0,050		7,72
	TOTAL				42,34

EXECUTADO NO PERÍODO:	m3	42,34
ACUMULADO ANTERIOR:	m3	-
ACUMULADO ATUAL:	m3	42,34
SALDO DO CONTRATO:	m3	42,34
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	m3	-
A MEDIR NO PERÍODO:		42,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 137/2024	CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.		
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos		
EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.		

MATERIAIS:	**1.5**	**TRAVESSA MORADA NOBRE**
ITEM:	**1.5.3**	**Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020**

Serviço	**VALORES**			**UNID.**	**QUANT.**
	QUANTIDADE			**Mês**	**Total**
	Vol.	**Peso esp.**	**Dist.**		
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	42,34	2,40	30,000	Mês	3.048,48

EXECUTADO NO PERÍODO:			**3.048,48**
ACUMULADO ANTERIOR:			-
ACUMULADO ATUAL:			**3.048,48**
SALDO DO CONTRATO:			**3.048,48**
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			-
A MEDIR NO PERÍODO:		Mês	**3.048,48**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE **CONTRATO: 137/2024**	**CÁLCULO EXPLICATIVO**

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

MATERIAIS:	**1.5**	**TRAVESSA MORADA NOBRE**
ITEM:	**1.5.4**	**Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade:**

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			txkm	Total
	Vol.	Peso esp.	Dist.		
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	42,34	2,40	20,000	txkm	2.032,32
EXECUTADO NO PERÍODO:				txkm	**2.032,32**
ACUMULADO ANTERIOR:				txkm	-
ACUMULADO ATUAL:				txkm	**2.032,32**
SALDO DO CONTRATO:				txkm	**2.032,32**
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				txkm	-
À MEDIR NO PERÍODO:					**2.032,32**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 137/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.	
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos	
EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.	

MATERIAIS:	1.5	TRAVESSA MORADA NOBRE
ITEM:	1.5.5	Limpeza geral

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			m2	Total
	Comp.		Larg.		
Limpeza geral	53,59	x	5,000	m2	267,95
	84,90	x	5,00		424,50
	14,70	x	10,45		153,62
	TOTAL				846,00

EXECUTADO NO PERÍODO:	m2	846,00
ACUMULADO ANTERIOR:	m2	-
ACUMULADO ATUAL:	m2	846,00
SALDO DO CONTRATO:	m2	846,00
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	m2	-
A MEDIR NO PERÍODO:		846,00

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

MATERIAIS:	**1.6**	**ÁREAS DE BORRACHUDOS**
ITEM:	**1.6.1**	**Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade**

Serviço	VALORES Quantidade			UNID. m3	QUANT. Total
		COMP	LARG	ESP	VOLUME
Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade		102,50	7,000	0,50	358,75
		12,30	2,200	0,3	8,12
		15,25	2,100	0,3	9,61
		62,30	6,200	0,5	193,13
		21,30	2,800	0,3	17,89
		31,60	2,1	0,5	33,18
		56,80	2,5	0,5	71,00
		42,15	2,30	0,40	38,78
		39,50	3,1	0,3	36,74
		5,50	2,1	0,3	3,47
		48,30	2,3	0,5	55,55
		33,20	2,1	0,4	27,89
		36,50	2,1	0,35	26,83
		31,40	2,1	0,25	16,49
		45,80	2,5	0,3	34,35
		15,30	2,1	0,15	4,82
		22,95	2	0,2	9,18
		44,20	2,4	0,4	42,43
		39,85	2	0,35	27,90
		12,45	1,9	0,3	7,10
		20,20	1,65	0,5	16,67
		55,65	1,75	0,3	29,22
		87,55	2	0,35	61,29
		9,35	1,5	0,3	4,21
		101,25	2,5	0,3	75,94
		105,30	2,3	0,5	121,10
		9,30	1,5	0,25	3,49
		74,25	2,5	0,3	55,69
		36,20	2	0,3	21,72
		68,50	2,1	0,3	43,16
		56,30	2	0,3	33,78
		15,30	2,15	0,3	9,87
		109,60	2,25	0,4	98,64
		42,10	2,05	0,35	30,21
		35,60	3,5	0,3	37,38
		62,10	2,3	0,3	42,85
		35,20	2,25	0,4	31,68
		26,60	4	0,5	53,20
		25,60	4	0,5	51,20
		120,38	3	0,5	180,57
	TOTAL				2.025,00
EXECUTADO NO PERÍODO:				m3	**2.025,00**
ACUMULADO ANTERIOR:				m3	-
ACUMULADO ATUAL:				m3	**2.025,00**
SALDO DO CONTRATO:				m3	**2.025,00**
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				m3	-
A MEDIR NO PERÍODO:					**2.025,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 137/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.	
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos	
EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.	

MATERIAIS:	**1.6**	**ÁREAS DE BORRACHUDOS**
ITEM:	**1.6.2**	**Carga mecânica de material de 1ª categoria**

Serviço	**VALORES**			**UNID.**	**QUANT.**
	Quantidade			**m3**	**Total**
	Comp.	**Emp.**			
Carga mecânica de material de 1ª categoria	2.025,00	1,250		m3	2.531,25

EXECUTADO NO PERÍODO:	m3	**2.531,25**
ACUMULADO ANTERIOR:	m3	-
ACUMULADO ATUAL:	m3	**2.531,25**
SALDO DO CONTRATO:	m3	**2.531,25**
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	m3	-
À MEDIR NO PERÍODO:		**2.531,25**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE **CONTRATO: 137/2024**	**CÁLCULO EXPLICATIVO**

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.	NOVATEC
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos	
EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.	

MATERIAIS:	**1.6**	**ÁREAS DE BORRACHUDOS**
ITEM:	**1.6.3**	**Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³**

Serviço	**VALORES**			**UNID.**	**QUANT.**
	QUANTIDADE			**Mês**	**Total**
	Vol.	**Peso esp.**	**Dist.**		
Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	2.531,25	1,50	15,000	Mês	56.953,12

EXECUTADO NO PERÍODO:		**56.953,12**
ACUMULADO ANTERIOR:		-
ACUMULADO ATUAL:		**56.953,12**
SALDO DO CONTRATO:		**56.953,12**
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):		- -
A MEDIR NO PERÍODO:	Mês	**56.953,12**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE **CONTRATO: 137/2024**	**CÁLCULO EXPLICATIVO**

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

MATERIAIS:	**1.6**	**ÁREAS DE BORRACHUDOS**
ITEM:	**1.6.4**	**Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_11/2019**

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			m3	Total
	COMP	LARG	ESP	VOLUME	
Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_11/2019	102,50	7,000	0,50	358,75	
	12,30	2,200	0,3	8,12	
	15,25	2,100	0,3	9,61	
	62,30	6,200	0,5	193,13	
	21,30	2,800	0,3	17,89	
	31,60	2,1	0,5	33,18	
	56,80	2,5	0,5	71,00	
	42,15	2,30	0,40	38,78	
	39,50	3,1	0,3	36,74	
	5,50	2,1	0,3	3,47	
	48,30	2,3	0,5	55,55	
	33,20	2,1	0,4	27,89	
	36,50	2,1	0,35	26,83	
	31,40	2,1	0,25	16,49	
	45,80	2,5	0,3	34,35	
	15,30	2,1	0,15	4,82	
	22,95	2	0,2	9,18	
	44,20	2,4	0,4	42,43	
	39,85	2	0,35	27,90	
	12,45	1,9	0,3	7,10	
	20,20	1,65	0,5	16,67	
	55,65	1,75	0,3	29,22	
	87,55	2	0,35	61,29	
	9,35	1,5	0,3	4,21	
	101,25	2,5	0,3	75,94	
	105,30	2,3	0,5	121,10	
	9,30	1,5	0,25	3,49	
	74,25	2,5	0,3	55,69	
	36,20	2	0,3	21,72	
	68,50	2,1	0,3	43,16	
	56,30	2	0,3	33,78	
	15,30	2,15	0,3	9,87	
	109,60	2,25	0,4	98,64	
	42,10	2,05	0,35	30,21	
	35,60	3,5	0,3	37,38	
	62,10	2,3	0,3	42,85	
	35,20	2,25	0,4	31,68	
	26,60	4	0,5	53,20	
	25,60	4	0,5	51,20	
	120,38	3	0,5	180,57	
TOTAL				2.025,00	

EXECUTADO NO PERÍODO:	**m3**	**2.025,00**
ACUMULADO ANTERIOR:	**m3**	-
ACUMULADO ATUAL:	**m3**	**2.025,00**
SALDO DO CONTRATO:	**m3**	**2.025,00**
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	**m3**	-
A MEDIR NO PERÍODO:		**2.025,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 137/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

MATERIAIS:	**1.6**	**ÁREAS DE BORRACHUDOS**
ITEM:	**1.6.5**	**Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³**

Serviço	VALORES Quantidade Vol.	Peso esp.	Dist.	UNID. txkm	QUANT. Total
Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	2.025,00	1,50	22,500	txkm	45.562,50

EXECUTADO NO PERÍODO:	txkm	**45.562,50**
ACUMULADO ANTERIOR:	txkm	**-**
ACUMULADO ATUAL:	txkm	**45.562,50**
SALDO DO CONTRATO:	txkm	**45.562,50**
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	txkm	
À MEDIR NO PERÍODO:		**45.562,50**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 137/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

Folha Nº 148

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

MATERIAIS:	**1.7**	**SERVIÇOS PRELIMINARES**
ITEM:	**1.7.1**	**Ensaio - Marshall**

Serviço	VALORES Quantidade	UNID. und	QUANT. Total
	Quantidade		
Ensaio - Marshall	10,00	und	10,00
EXECUTADO NO PERÍODO:			**10,000**
ACUMULADO ANTERIOR:			**-**
ACUMULADO ATUAL:			**10,00**
SALDO DO CONTRATO:			**10,00**
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			**-**
A MEDIR NO PERÍODO:		**und**	**10,000**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
CONTRATO: 138/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2024.11.25 11:46:19 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
YAN HENRIQUE TAVARES SANTANA
Data: 25/11/2024 12:00:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE ROBSON SANTOS DA PAIXAO
Data: 25/11/2024 11:51:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
