EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE	DATA DE INICIO: 07/04/2026	BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 DO ADITIVO	NOVATEC
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DE TÉRMINO: 07/01/2026	PERÍODO: 09/09/2026 a 16/09/2026	CONTRATO: 22/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA		DATA DE MEDIÇÃO: 17/09/2026	REPASSE: CR 953630/2023/MTUR

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	MEDIDO %
1	PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA													
1.06	TERRAPLANAGEM								R$ 88.907,15	R$ -	R$ 88.907,15	R$ 88.907,15	R$ -	100,00%
1.06.01	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m2	2.202,40		2.202,40		2202,40	R$ 1,62	R$ 3.567,89	R$ -	R$ 3.567,89	R$ 3.567,89	R$ -	100,00%
1.06.02	Escavação horizontal em solo de 1a categoria com trator de esteiras (100hp/lâmina: 2,19m3). af_07/2020	m3	1.101,20		1.101,20		1101,20	R$ 5,44	R$ 5.990,50	R$ -	R$ 5.990,50	R$ 5.990,50	R$ -	100,00%
1.06.03	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em camin hão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre (SICRO - 5914251)	t	1.651,81		1.651,81		1651,81	R$ 2,24	R$ 3.700,05	R$ -	R$ 3.700,05	R$ 3.700,05	R$ -	100,00%
1.06.04	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pa vimentada (SICRO - 5915321)	tkm	28.576,14		28.576,14		28576,14	R$ 0,40	R$ 11.430,46	R$ -	R$ 11.430,46	R$ 11.430,46	R$ -	100,00%
1.06.05	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário (SICRO - 4011209)	m2	2.202,40		2.202,40		2202,40	R$ 1,83	R$ 4.030,39	R$ -	R$ 4.030,39	R$ 4.030,39	R$ -	100,00%
1.06.06	Reforço do subleito com material de jazida - 100% Procto r intermediário (SICRO - 4011211)	m3	330,36		330,36		330,36	R$ 16,34	R$ 5.398,11	R$ -	R$ 5.398,11	R$ 5.398,11	R$ -	100,00%
1.06.07	Colchão de areia	m3	330,36		330,36		330,36	R$ 159,14	R$ 52.573,73	R$ -	R$ 52.573,73	R$ 52.573,73	R$ -	100,00%
1.06.08	Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - rodovia em revestimento primário (SICRO - 5915320)	tkm	5.153,54		5.153,54		5153,54	R$ 0,43	R$ 2.216,02	R$ -	R$ 2.216,02	R$ 2.216,02	R$ -	100,00%
1.07	PAVIMENTAÇÃO								R$ 417.151,14	R$ -	R$ 119.363,85	R$ 119.363,85	R$ 297.787,29	28,614%
1.07.01	Base ou sub-base de brita graduada com brita produzida - 100% Proctor modificado (SICRO - 4011275)	m3	660,72		660,72		660,72	R$ 136,76	R$ 90.360,07	R$ -	R$ 90.360,07	R$ 90.360,07	R$ -	100,00%
1.07.02	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em camin hão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre (SICRO - 5914251)	t	991,08		991,08		991,08	R$ 2,24	R$ 2.220,02	R$ -	R$ 2.220,02	R$ 2.220,02	R$ -	100,00%
1.07.03	Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - rodovia em revestimento primário (SICRO - 5915320)	tkm	4955,40		4.955,40		4955,40	R$ 0,43	R$ 2.130,82	R$ -	R$ 2.130,82	R$ 2.130,82	R$ -	100,00%
1.07.04	Locação de serviços de pavimentação	m2	2202,40		2.202,40		2202,40	R$ 1,14	R$ 2.510,74	R$ -	R$ 2.510,74	R$ 2.510,74	R$ -	100,00%
1.07.05	Imprimação com asfalto diluido - Somente aplicação (SICRO - 4011351)	m²	2202,40		2.202,40		2202,40	R$ 0,45	R$ 991,08	R$ -	R$ 991,08	R$ 991,08	R$ -	100,00%
1.07.06	Asfalto diluído de petróleo - CM-30 (ANP + ICMS) - (JANEIRO/2025)	t	2,64		2,64		2,64	R$ 7.747,54	R$ 20.475,82	R$ -	R$ 20.475,82	R$ 20.475,82	R$ -	100,00%

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335932-6
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE	DATA DE INICIO: 07/04/2026	BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 DO ADITIVO	NOVATEC
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DE TÉRMINO: 07/01/2026	PERÍODO: 09/09/2026 a 16/09/2026	CONTRATO: 22/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA		DATA DE MEDIÇÃO: 17/09/2026	REPASSE: CR 953630/2023/MTUR

			QUANTIDADES					VALORES (R$)							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	MEDIDO %
1.07.07	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	79,29		79,29		79,29	R$ 1,85	R$ 146,68	R$ -	R$ 146,68	R$ 146,68	R$ -	100,00%
1.07.08	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	724,15		724,15		724,15	R$ 0,73	R$ 528,63	R$ -	R$ 528,63	R$ 528,63	R$ -	100,00%
1.07.09	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m2	2202,40				2202,40	R$ 1,56	R$ 3.435,74	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.435,74	0,00%
1.07.10	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	26,43				26,43	R$ 1,85	R$ 48,89	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 48,89	0,00%
1.07.11	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	241,38				241,38	R$ 0,73	R$ 176,21	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 176,21	0,00%
1.07.12	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. Af_11/2019	m3	66,07				66,07	R$ 1.750,35	R$ 115.649,13	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 115.649,13	0,00%
1.07.13	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em camin hão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre (SICRO - 5914351)	t	158,57				158,57	R$ 2,24	R$ 355,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 355,20	0,00%
1.07.14	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	1982,16				1982,16	R$ 2,03	R$ 4.023,78	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.023,78	0,00%
1.07.15	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	1321,44				1321,44	R$ 0,81	R$ 1.070,37	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.070,37	0,00%
1.07.16	Concreto asfáltico reciclado em usina com adição de asfalto - brita comercial (SICRO - 4011478)	t	105,72				105,72	R$ 189,34	R$ 20.016,12	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 20.016,12	0,00%
1.07.17	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	1321,44				1321,44	R$ 2,03	R$ 2.682,52	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.682,52	0,00%
1.07.18	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (un idade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	880,96				880,96	R$ 0,81	R$ 713,58	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 713,58	0,00%
1.07.19	Cimento Asfáltico - CAP 50/70 (ANP + ICMS) - (JANEIRO/20 25)	t	5,81				5,81	R$ 5.654,91	R$ 32.879,55	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 32.879,55	0,00%
1.07.20	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	174,43				174,43	R$ 1,85	R$ 322,70	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 322,70	0,00%
1.07.21	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicion al para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1593,13				1593,13	R$ 0,73	R$ 1.162,98	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.162,98	0,00%

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE	DATA DE INICIO: 07/04/2026	BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 DO ADITIVO	NOVATEC
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DE TÉRMINO: 07/01/2026	PERÍODO: 09/09/2026 a 16/09/2026	CONTRATO: 22/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA		DATA DE MEDIÇÃO: 17/09/2026	REPASSE: CR 953630/2023/MTUR

			QUANTIDADES						VALORES (R$)					
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	MEDIDO %
1.07.22	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confecci onada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	1028,00				1028,00	R$ 55,43	R$ 56.982,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 56.982,04	0,00%
1.07.23	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalha mento e transporte de material c/distancia até 10km	m	1028,00				1028,00	R$ 11,46	R$ 11.780,88	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 11.780,88	0,00%
1.07.24	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loc o em trecho reto, 30 cm base x 15 cm altura. af_01/2024	m					0,00	R$ 53,91	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	0,00%
1.07.25	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo PEAD e brita comercial	m	230,00				230,00	R$ 202,12	R$ 46.487,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 46.487,60	0,00%
1.08	**PINTURA**								**R$ 664,91**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 664,91**	**0,00%**
1.08.01	Caiação	m2	287,84				287,84	R$ 2,31	R$ 664,91	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 664,91	0,00%
1.09	**SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL**								**R$ 7.802,51**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 7.802,51**	**0,00%**
1.09.01	Pintura de faixa com plástico a frio tricomponente à bas e de resinas metacrílicas por aspersão - espessura de 0, 6 mm (SICRO - 5213413)	m2	77,00				77,00	R$ 84,64	R$ 6.517,28	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.517,28	0,00%
1.09.03	Placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,331 m - peli cula retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implan tação (SICRO - 5213457)	un	3,00				3,00	R$ 428,41	R$ 1.285,23	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.285,23	0,00%
1.10	**LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**								**R$ 2.886,60**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 2.886,60**	**0,00%**
1.10.01	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	4245,00				4245,00	R$ 0,68	R$ 2.886,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.886,60	0,00%
								TOTAL DO ORÇAMENTO	**R$ 517.412,31**	**R$ -**	**R$ 208.271,00**	**R$ 208.271,00**	**R$ 309.141,31**	**40,25%**
									100,00%	**0,00%**	**40,25%**	**40,25%**	**59,75%**	

ASSINATURA RESPONSÁVEL TÉCNICO	ASSINATURA FISCALIZAÇÃO	VALOR DA MEDIÇÃO: R$ 208.271,00 (duzentos e oito mil, duzentos e setenta um reais).
ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415 Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415 Dados: 2026.10.22 07:35:40 -03'00'		DATA LIBERAÇÃO : _____/_____/_____

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 2722335022-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 22/2026
REPASSE: CR 953630/2023/MTUR
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 09/09/2026 a 16/09/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
1.06	TERRAPLANAGEM		
1.06.01	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis		ÁREA TOTAL
ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA		m²	m²
TRECHO EXECUTADO EXTRA		2202,4	2.202,40
EXECUTADO:			2.202,40
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			2.202,40
CONTRATO:			2.202,40
SALDO CONTRATO:			0,00
A MEDIR NO PERIODO:			2.202,40
		MEMORIA DE CÁLCULO	

João Vitor Reis [illegible] Santos
Eng. Civil CREA [illegible]2335022-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 22/2026
REPASSE: CR 953630/2023/MTUR
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 09/09/2026 a 16/09/2026

	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
1.06	TERRAPLANAGEM			
1.06.02	Escavação horizontal em solo de 1a categoria com trator de esteiras (100hp/lâmina: 2,19m3). af_07/2020	ÁREA TOTAL	PROFUNDIDADE	VOLUME TOTAL
ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA		m²	m	m³
TRECHO EXECUTADO EXTRA		2.202,40	0,50	1.101,20
EXECUTADO:				1.101,20
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				1.101,20
CONTRATO:				1.101,20
SALDO CONTRATO:				0,00
A MEDIR NO PERIODO:				1.101,20
		MEMORIA DE CÁLCULO		

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA [illegible]2335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 22/2026
REPASSE: CR 953630/2023/MTUR
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 09/09/2026 a 16/09/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
1.06	TERRAPLANAGEM			
1.06.03	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em camin hão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre (SICRO - 5914351)	VOLUME TOTAL	DENSIDADE	QUANTITATIVO TOTAL
ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA		m³	T/M³	T
TRECHO EXECUTADO EXTRA		1.101,20	1,50	1.651,81
EXECUTADO:				1.651,81
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				1.651,81
CONTRATO:				1.651,81
SALDO CONTRATO:				0,00
A MEDIR NO PERIODO:				1.651,81
		MEMORIA DE CÁLCULO		

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 2335022-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 22/2026
REPASSE: CR 953630/2023/MTUR
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 09/09/2026 a 16/09/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND			
1.06	TERRAPLANAGEM				
1.06.04	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pa vimentada (SICRO - 5915321)	VOLUME TOTAL	DENSIDADE	DMT	QUANTITATIVO TOTAL
ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA		m³	t/m³	km	TXKM
TRECHO EXECUTADO EXTRA		1.101,20	1,50	17,30	28.576,14
EXECUTADO:					28.576,14
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					28.576,14
CONTRATO:					28.576,14
SALDO CONTRATO:					0,00
A MEDIR NO PERIODO:					28.576,14

MEMORIA DE CÁLCULO

João Vitor [illegible] Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 22/2026
REPASSE: CR 953630/2023/MTUR
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 09/09/2026 a 16/09/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
1.06	TERRAPLANAGEM		
1.06.05	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário (SICRO - 4011209)		ÁREA TOTAL
ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA		m²	m²
TRECHO EXECUTADO EXTRA		2.202,40	2.202,40
EXECUTADO:			2.202,40
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			2.202,40
CONTRATO:			2.202,40
SALDO CONTRATO:			0,00
A MEDIR NO PERIODO:			2.202,40
		MEMORIA DE CÁLCULO	

João Vitor Barros Santos
Eng. Civil CREA 2723359022-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 22/2026
REPASSE: CR 953630/2023/MTUR
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 09/09/2026 a 16/09/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
1.06	TERRAPLANAGEM			
1.06.06	Reforço do subleito com material de jazida - 100% Procto r intermediário (SICRO - 4011211)	ÁREA TOTAL	PROFUNDIDADE	VOLUME TOTAL
ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA		m²	m	m³
TRECHO EXECUTADO EXTRA		2.202,40	0,15	330,36
EXECUTADO:				330,36
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				330,36
CONTRATO:				330,36
SALDO CONTRATO:				0,00
A MEDIR NO PERIODO:				330,36

MEMORIA DE CÁLCULO

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 22/2026
REPASSE: CR 953630/2023/MTUR
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 09/09/2026 a 16/09/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
1.06	TERRAPLANAGEM			
1.06.07	Colchão de areia	ÁREA TOTAL	PROFUNDIDADE	VOLUME TOTAL
	ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA	m²	m	m³
TRECHO EXECUTADO EXTRA		2202,4	0,15	330,36
EXECUTADO:				330,36
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				330,36
CONTRATO:				330,36
SALDO CONTRATO:				0,00
A MEDIR NO PERIODO:				330,36

MEMORIA DE CÁLCULO

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 2335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 22/2026
REPASSE: CR 953630/2023/MTUR
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 09/09/2026 a 16/09/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND			
1.06	TERRAPLANAGEM				
1.06.08	Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - rodovia em revestimento primário (SICRO - 5915320)	VOLUME TOTAL	DENSIDADE	DMT	QUANTITATIVO TOTAL
ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA		m³	t/m³	km	TXKM
TRECHO EXECUTADO EXTRA		330,36	1,50	10,40	5.153,54
EXECUTADO:					5.153,54
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					5.153,54
CONTRATO:					5.153,54
SALDO CONTRATO:					0,00
A MEDIR NO PERIODO:					5.153,54

MEMORIA DE CÁLCULO

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA [illegible]2335932-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 22/2026
REPASSE: CR 953630/2023/MTUR
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 09/09/2026 a 16/09/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
1.07	PAVIMENTAÇÃO			
1.07.01	Base ou sub-base de brita graduada com brita produzida - 100% Proctor modificado (SICRO - 4011275)	ÁREA TOTAL	ESPESSURA	VOLUME TOTAL
ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA		m²	m	m³
TRECHO EXECUTADO EXTRA		2202,4	0,30	660,72
EXECUTADO:				660,72
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				660,72
CONTRATO:				660,72
SALDO CONTRATO:				0,00
A MEDIR NO PERÍODO:				660,72

MEMORIA DE CÁLCULO

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 2723359322-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 22/2026
REPASSE: CR 953630/2023/MTUR
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 09/09/2026 a 16/09/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
1.07	PAVIMENTAÇAO			
1.07.02	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em camin hão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre (SICRO - 5914351)	VOLUME TOTOAL	DENSIDADE	VOLUME TOTAL EM T
ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA		m³	m	T
TRECHO EXECUTADO EXTRA		660,72	1,50	991,08
EXECUTADO:				991,08
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				991,08
CONTRATO:				991,08
SALDO CONTRATO:				0,00
A MEDIR NO PERIODO:				991,08
		MEMORIA DE CÁLCULO		

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA [illegible]2335122-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 272482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 22/2026
REPASSE: CR 953630/2023/MTUR
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 09/09/2026 a 16/09/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND			
1.07	PAVIMENTAÇAO				
1.07.03	Transporte com caminhão basculante de 14 m3 - rodovia em revestimento primário (SICRO - 5915320)	VOLUME TOTAL	DENSIDADE	DMT	QUANTITATIVO TOTAL
	ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA	m³	t/m³	km	TXKM
	TRECHO EXECUTADO EXTRA	660,72	1,50	5,00	4.955,40
	EXECUTADO:				4.955,40
	ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
	ACUMULADO ATUAL:				4.955,40
	CONTRATO:				4.955,40
	SALDO CONTRATO:				0,00
	A MEDIR NO PERIODO:				4.955,40

MEMORIA DE CÁLCULO

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272256[illegible]-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 22/2026
REPASSE: CR 953630/2023/MTUR
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 09/09/2026 a 16/09/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
1.07	PAVIMENTAÇAO		
1.07.04	Locação de serviços de pavimentação	ÁREA TOTAL	QUANTITATIVO TOTAL
	ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA	m²	m²
	TRECHO EXECUTADO EXTRA	2.202,40	2.202,40
	EXECUTADO:		2.202,40
	ACUMULADO ANTERIOR:		0,00
	ACUMULADO ATUAL:		2.202,40
	CONTRATO:		2.202,40
	SALDO CONTRATO:		0,00
	A MEDIR NO PERIODO:		2.202,40
		MEMORIA DE CÁLCULO	

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA [illegible]335932-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 22/2026
REPASSE: CR 953630/2023/MTUR
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 09/09/2026 a 16/09/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
1.07	PAVIMENTAÇÃO		
1.07.05	Imprimação - execução com fornecimento de material	ÁREA TOTAL	TOTAL
		m²	m²
TRECHO EXECUTADO EXTRA		2.202,40	2202,40
EXECUTADO:			2.202,40
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			2.202,40
CONTRATO:			2.202,40
SALDO CONTRATO:			0,00
A MEDIR NO PERIODO:			2.202,40
		MEMORIA DE CÁLCULO	

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335232-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 22/2026
REPASSE: CR 953630/2023/MTUR
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 09/09/2026 a 16/09/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
1.08	PAVIMENTAÇÃO			
1.07.06	Asfalto diluído de petróleo - CM-30 (ANP + ICMS) - (JANEIRO/2025)	ÁREA TOTAL	COEFICIENTE	ÁREA TOTAL
		m³		m³
TRECHO EXECUTADO EXTRA		2.202,40	0,0012	2,64
EXECUTADO:				2,64
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				2,64
CONTRATO:				2,64
SALDO CONTRATO:				0,00
A MEDIR NO PERÍODO:				2,64
		MEMORIA DE CÁLCULO		

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 22/2026
REPASSE: CR 953630/2023/MTUR
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 09/09/2026 a 16/09/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND			
1.07	PAVIMENTAÇÃO				
1.07.07	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	ÁREA TOTAL	COEFICIENTE	DMT	ÁREA TOTAL
		m²	t/m²	KM	tkm
TRECHO EXECUTADO EXTRA		2.202,40	0,0012	30,00	79,29
EXECUTADO:					79,29
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					79,29
CONTRATO:					79,29
SALDO CONTRATO:					0,00
A MEDIR NO PERIODO:					79,29

MEMORIA DE CÁLCULO

João Vitor [illegible]
Eng. Civil CREA [illegible]335032-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 22/2026
REPASSE: CR 953630/2023/MTUR
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 09/09/2026 a 16/09/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND			
1.07	PAVIMENTAÇÃO				
1.07.08	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicion al para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	ÁREA TOTAL	COEFICIENTE	DMT	ÁREA TOTAL
		m²	t/m²	KM	tkm
TRECHO EXECUTADO EXTRA		2.202,40	0,0012	274,00	724,15
EXECUTADO:					724,15
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					724,15
CONTRATO:					724,15
SALDO CONTRATO:					0,00
A MEDIR NO PERIODO:					724,15

João Vitor Nolasco dos Santos
Eng. Civil CREA [illegible]-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.10.16 14:22:23 -03'00'

MEMORIA DE CÁLCULO

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ACESSO À ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

LOCAL DA OBRA: ORLA DA BARRAGEM DO POVOADO CAJAÍBA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

CONTRATO: 22/2026

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

MEDIÇÃO 01 DO ADITIVO

Período: 09/09/2026 a 16/09/2026

Data da medição: 17/09/2026

ITEM	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

FOTO 01

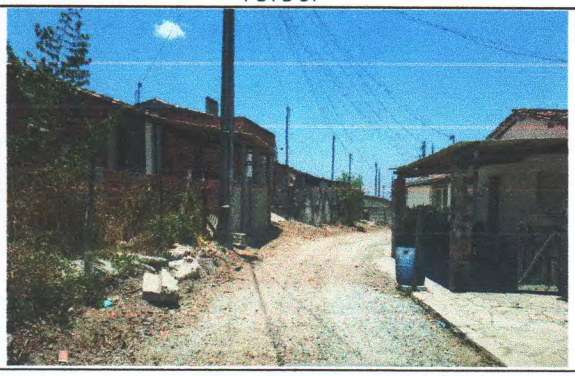

FOTO 02



FOTO 03



FOTO 04



FOTO 05



FOTO 06



FOTO 07



FOTO 08

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 2723355922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.10.16 14:21:45 -03'00'
