OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO	BOLETIM DE MEDIÇÃO - 1º ADITIVO	CONTRATO: 104/2026
CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	B.M.Nº 01	ORDEM DE SERVIÇO : 07/04/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	Período: 25/09/2026 A 07/10/2026	DATA: 07/10/2026

Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R$)	Valores (R$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
02	**CANTEIRO - MARCO "JOÃO DE DEUS SOUSA"**								**16.791,16**	**-**	**16.791,16**	**16.791,16**	**-**	**100,00**
02.02	**PAVIMENTAÇÃO**								**9.430,76**	**-**	**9.430,76**	**9.430,76**	**-**	**100,00**
02.02.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	186,12		**186,12**	186,12	-	41,29	7.684,89		**7.684,89**	7.684,89	-	100,00
02.02.007	Regularização Manual	m2	22,29		**22,29**	22,29	-	5,28	117,69		**117,69**	117,69	-	100,00
02.02.008	Colchão de areia	m3	1,12		**1,12**	1,12	-	141,59	158,58		**158,58**	158,58	-	100,00
02.02.009	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	146,48		**146,48**	146,48	-	9,87	1.445,76		**1.445,76**	1.445,76	-	100,00
02.02.010	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	6,59		**6,59**	6,59	-	1,21	7,97		**7,97**	7,97	-	99,95
02.02.011	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	14,82		**14,82**	14,82	-	1,07	15,86		**15,86**	15,86	-	100,02
02.04	**MARCO "AV. JOAO DE DEUS SOUZA"**								**1.248,38**	**-**	**1.248,38**	**1.248,38**	**-**	**100,00**
02.04.009	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m2	2,00		**2,00**	2,00	-	624,19	1.248,38		**1.248,38**	1.248,38	-	100,00
02.06	**DIVERSOS**								**6.112,02**	**-**	**6.112,02**	**6.112,02**	**-**	**100,00**
02.06.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	8,19		**8,19**	8,19	-	24,05	196,97		**196,97**	196,97	-	100,00
02.06.004	Limpeza geral	m2	40,22		**40,22**	40,22	-	2,93	117,84		**117,84**	117,84	-	100,00
02.06.005	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	43,88		**43,88**	43,88	-	108,04	4.740,80		**4.740,80**	4.740,80	-	100,00
02.06.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	987,30		**987,30**	987,30	-	1,07	1.056,41		**1.056,41**	1.056,41	-	100,00
03	**ROTATÓRIA 1**								**60.994,49**	**-**	**60.994,49**	**60.994,49**	**-**	**100,00**
03.001	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**								**796,82**	**-**	**796,82**	**796,82**	**-**	**100,00**
03.001.006	Locação de praças com piquetes de madeira	m2	1.256,63		**1.256,63**	1.256,63	-	0,63	796,81		**796,81**	796,81	-	100,00
03.002	**PAVIMENTAÇÃO**								**35.361,58**	**-**	**35.361,58**	**35.361,58**	**-**	**100,00**
03.002.005	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	88,70		**88,70**	88,70	-	41,29	3.662,42		**3.662,42**	3.662,42	-	100,00
03.002.013	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	71,94		**71,94**	71,94	-	1,07	76,98		**76,98**	76,98	-	100,00
03.002.014	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	125,66		**125,66**	125,66	-	9,87	1.240,26		**1.240,26**	1.240,26	-	100,00
03.002.015	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	5,65		**5,65**	5,65	-	1,21	6,84		**6,84**	6,84	-	100,05
03.002.016	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m	tkm	12,71		**12,71**	12,71	-	1,07	13,60		**13,60**	13,60	-	100,00
03.002.017	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	70,15		**70,15**	70,15	-	108,04	7.579,01		**7.579,01**	7.579,01	-	100,00
03.002.018	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m	tkm	1.578,37		**1.578,37**	1.578,37	-	1,07	1.688,86		**1.688,86**	1.688,86	-	100,00
03.002.019	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m3	106,59		**106,59**	106,59	-	173,82	18.527,47		**18.527,47**	18.527,47	-	100,00
03.002.020	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m	tkm	2.398,27		**2.398,27**	2.398,27	-	1,07	2.566,15		**2.566,15**	2.566,15	-	100,00
03.004	**MARCO "SIMBOLO ITABAIANA"**								**18.856,78**	**-**	**18.856,78**	**18.856,78**	**-**	**100,00**
03.004.010	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m2	30,21		**30,21**	30,21	-	624,19	18.856,78		**18.856,78**	18.856,78	-	100,00
03.006	**DIVERSOS**								**5.979,31**	**-**	**5.979,31**	**5.979,31**	**-**	**100,00**
03.006.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	248,62		**248,62**	248,62	-	24,05	5.979,31		**5.979,31**	5.979,31	-	100,00
04	**ROTATÓRIA 2**								**71.894,17**	**-**	**71.894,17**	**71.894,17**	**-**	**100,00**
04.001	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**								**1.222,20**	**-**	**1.222,20**	**1.222,20**	**-**	**100,00**
04.001.006	Locação de praças com piquetes de madeira (área interna)	m2	1.940,00		**1.940,00**	1.940,00	-	0,63	1.222,20		**1.222,20**	1.222,20	-	100,00
04.002	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**								**58.748,45**	**-**	**58.748,45**	**58.748,45**	**-**	**100,00**
04.002.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	229,86		**229,86**	229,86	-	41,29	9.490,92		**9.490,92**	9.490,92	-	100,00

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engª Civil - CREA/SE 27109362449

Danyelson Leite dos Santos:98986546515

Assinado digitalmente por Danyelson Leite dos Santos:98986546515
ND: C=BR, CN=Danyelson Leite dos Santos:98986546515, O=ICP-Brasil, OU=AC Solucao Digital Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.08 17:22:02-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.2.1

OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO	BOLETIM DE MEDIÇÃO - 1º ADITIVO	CONTRATO: 104/2026
CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	B.M.Nº 01	ORDEM DE SERVIÇO : 07/04/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	Período: 25/09/2026 A 07/10/2026	DATA: 07/10/2026

Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R$)	Valores (R$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
04.002.011	Regularização Manual	m2	21,44		**21,44**	21,44	-	5,28	113,29		**113,29**	113,29	-	100,00
04.002.012	Colchão de areia	m3	1,07		**1,07**	1,07	-	141,59	151,50		**151,50**	151,50	-	100,00
04.002.013	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	95,17		**95,17**	95,17	-	1,07	101,83		**101,83**	101,83	-	100,00
04.002.014	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	156,14		**156,14**	156,14	-	9,87	1.541,10		**1.541,10**	1.541,10	-	100,00
04.002.015	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	7,02		**7,02**	7,02	-	1,21	8,49		**8,49**	8,49	-	100,00
04.002.016	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m	tkm	15,79		**15,79**	15,79	-	1,07	16,90		**16,90**	16,90	-	100,00
04.002.017	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	63,15		**63,15**	63,15	-	108,04	6.822,73		**6.822,73**	6.822,73	-	100,00
04.002.018	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m	tkm	1.420,87		**1.420,87**	1.420,87	-	1,07	1.520,33		**1.520,33**	1.520,33	-	100,00
04.002.019	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m3	196,98		**196,98**	196,98	-	173,82	34.239,06		**34.239,06**	34.239,06	-	100,00
04.002.020	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m	tkm	4.432,05		**4.432,05**	4.432,05	-	1,07	4.742,29		**4.742,29**	4.742,29	-	100,00
04.004	**ESCULTURA DE CONCRETO ARMADO**								**4.993,52**	**-**	**4.993,52**	**4.993,52**	**-**	100,00
04.004.005	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m2	8,00		**8,00**	8,00	-	624,19	4.993,52		**4.993,52**	4.993,52	-	100,00
04.005	**DIVERSOS**								**6.930,01**	**-**	**6.930,01**	**6.930,01**	**-**	100,00
04.005.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	288,15		**288,15**	288,15	-	24,05	6.930,01		**6.930,01**	6.930,01	-	100,00
05	**RÓTULA 3**								**66.350,08**	**-**	**66.350,08**	**66.350,08**	**-**	**100,00**
05.001	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**								**1.056,12**	**-**	**1.056,12**	**1.056,12**	**-**	100,00
05.001.006	Locação de praças com piquetes de madeira (área interna)	m3	1.676,38		**1.676,38**	1.676,38	-	0,63	1.056,12		**1.056,12**	1.056,12	-	100,00
05.002	**PAVIMENTAÇÃO**								**65.293,97**	**-**	**65.293,97**	**65.293,97**	**-**	100,00
05.002.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	331,74		**331,74**	331,74	-	41,29	13.697,54		**13.697,54**	13.697,54	-	100,00
05.002.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.881,99		**1.881,99**	1.881,99	-	1,07	2.013,73		**2.013,73**	2.013,73	-	100,00
05.002.011	Regularização Manual	m2	39,85		**39,85**	39,85	-	5,28	210,57		**210,57**	210,57	-	100,00
05.002.012	Colchão de areia	m3	0,35		**0,35**	0,35	-	141,59	49,56		**49,56**	49,56	-	100,00
05.002.013	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	72,00		**72,00**	72,00	-	1,07	77,04		**77,04**	77,04	-	100,00
05.002.014	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	175,14		**175,14**	175,14	-	9,87	1.728,63		**1.728,63**	1.728,63	-	100,00
05.002.015	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	7,56		**7,56**	7,56	-	1,21	9,15		**9,15**	9,15	-	100,00
05.002.016	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m	tkm	170,10		**170,10**	170,10	-	1,07	182,01		**182,01**	182,01	-	100,00
05.002.017	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	63,16		**63,16**	63,16	-	108,04	6.823,81		**6.823,81**	6.823,81	-	100,00
05.002.018	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m	tkm	1.421,10		**1.421,10**	1.421,10	-	1,07	1.520,58		**1.520,58**	1.520,58	-	100,00
05.002.019	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m3	196,98		**196,98**	196,98	-	173,82	34.239,06		**34.239,06**	34.239,06	-	100,00
05.002.020	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	4.432,05		**4.432,05**	4.432,05	-	1,07	4.742,29		**4.742,29**	4.742,29	-	100,00
07	**CANTEIRO 2**								**9.138,21**	**-**	**9.138,21**	**9.138,21**	**-**	**100,00**
07.002	**PAVIMENTAÇÃO**								**9.138,21**	**-**	**9.138,21**	**9.138,21**	**-**	100,00
07.002.006	Demolição de concreto com martelete e compressor	m3	19,96		**19,96**	19,96	-	426,22	8.507,35		**8.507,35**	8.507,35	-	100,00
07.002.007	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	24,95		**24,95**	24,95	-	1,21	30,19		**30,19**	30,19	-	100,00
07.002.008	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	561,37		**561,37**	561,37	-	1,07	600,67		**600,67**	600,67	-	100,00
08	**CANTEIRO 3**								**3.886,72**	**-**	**3.886,72**	**3.886,72**	**-**	**100,00**

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo

Danyelson Leite dos Santos:98986546515

Assinado digitalmente por Danyelson Leite dos Santos:98986546515
ND: C=BR, CN=Danyelson Leite dos Santos:98986546515, O=ICP-Brasil, OU=AC Solucao Digital Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.08 17:22:02-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.2.1

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engª Civil - CREA/SE 270936244

OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO	BOLETIM DE MEDIÇÃO - 1º ADITIVO	CONTRATO: 104/2026
CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	B.M.Nº 01	ORDEM DE SERVIÇO : 07/04/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	Período: 25/09/2026 A 07/10/2026	DATA: 07/10/2026

Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R$)	Valores (R$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
08.003	**DIVERSOS**								**3.886,72**	**-**	**3.886,72**	**3.886,72**	**-**	**100,00**
08.003.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	161,61		**161,61**	161,61	-	24,05	3.886,72		**3.886,72**	3.886,72	-	100,00
09	**CANTEIRO 4**								**50.622,43**	**-**	**50.622,43**	**50.622,43**	**-**	**100,00**
09.001	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**								**131,73**	**-**	**131,73**	**131,73**	**-**	100,00
09.001.006	Locação de praças com piquetes de madeira	m2	209,09		**209,09**	209,09	-	0,63	131,73		**131,73**	131,73	-	100,00
09.002	**PAVIMENTAÇÃO**								**45.792,94**	**-**	**45.792,94**	**45.792,94**	**-**	100,00
09.002.003	Lona plástica preta	m2	26,46		**26,46**	26,46	-	7,05	186,54		**186,54**	186,54	-	100,00
09.002.004	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	26,46		**26,46**	26,46	-	49,95	1.321,68		**1.321,68**	1.321,68	-	100,00
09.002.008	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	142,00		**142,00**	142,00	-	9,87	1.401,54		**1.401,54**	1.401,54	-	100,00
09.002.009	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	6,39		**6,39**	6,39	-	1,21	7,73		**7,73**	7,73	-	99,98
09.002.010	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m	tkm	143,77		**143,77**	143,77	-	1,07	153,83		**153,83**	153,83	-	100,00
09.002.011	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m3	60,89		**60,89**	60,89	-	108,04	6.578,56		**6.578,56**	6.578,56	-	100,00
09.002.012	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m	tkm	1.370,02		**1.370,02**	1.370,02	-	1,07	1.465,92		**1.465,92**	1.465,92	-	100,00
09.002.013	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m3	175,23		**175,23**	175,23	-	173,82	30.458,48		**30.458,48**	30.458,48	-	100,00
09.002.014	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m	tkm	3.942,67		**3.942,67**	3.942,67	-	1,07	4.218,66		**4.218,66**	4.218,66	-	100,00
09.003	**DIVERSOS**								**4.697,77**	**-**	**4.697,77**	**4.697,77**	**-**	100,00
09.003.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	169,86		**169,86**	169,86	-	24,05	4.085,13		**4.085,13**	4.085,13	-	100,00
09.003.005	Limpeza geral	m2	209,09		**209,09**	209,09	-	2,93	612,63		**612,63**	612,63	-	100,00
15	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**6.263,68**	**-**	**6.263,68**	**6.263,68**	**-**	**100,00**
15.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,0000		**6,00**	6,00	-	377,28	2.263,68		**2.263,68**	2.263,68	-	100,00
15.002	Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m	mês	5,0000		**5,00**	5,00	-	800,00	4.000,00		**4.000,00**	4.000,00	-	100,00
TOTAL:									**285.940,95**	**0,00**	**285.940,95**	**285.940,95**	**0,00**	**100,00**
PERCENTUAL										-	100,00	**100,00**	-	

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº_____ FORAM MEDIDOS E RECEBIDOS PELA FISCALIZAÇÃO EM PERFEITA ORDEM EM ___/___/_____

MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Danyelson Leite dos Santos:98986546515

Assinado digitalmente por Danyelson Leite dos Santos:98986546515
ND: C=BR, CN=Danyelson Leite dos Santos:98986546515, O=ICP-Brasil, OU=AC Solucao Digital Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.08 17:22:27-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.2.1

ASSINATURA DA EMPRESA

APROVADO PARA PAGAMENTO ___/___/_____

PROTOCOLO

Kelly Pinto Freire
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engª Civil - CREA/SE 270936244-9

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - 1º ADITIVO

OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades
02	**CANTEIRO - MARCO "JOÃO DE DEUS SOUSA"**		
02.002	**PAVIMENTAÇÃO**		
02.002.001	**Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3**	**m**	**186,12**
> 21,98m + 16,48m + 4,00m + 8,73m + 4,00m + 5,02m + 44,16m + 3,70m + 12,56m + 23,51m + 2,34m + 4,88m + 23,98m + 17,45m + 16,77m + 5,80m + 6,11m + 7,84m + 8,15m + 3,70m + 1,00m + 2,00m + 0,50m + 2,08m + 10,75m + 20,26m + 3,37m = 281,12m (levantado) - 95,00 (contratado) = **186,12m**			
02.002.007	**Regularização Manual**	**m2**	**22,29**
> 281,12m (meio-fio levantado) x 0,13m = 36,54m2 (levantado) - 14,25m2 (contratado) = **22,29m2**			
02.002.008	**Colchão de areia**	**m3**	**1,12**
> 36,54m2 x 0,05m = 1,83m3 (levantado) - 0,71m3 (contratado) = **1,12m3**			
02.002.009	**Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado**	**m**	**146,48**
> **146,48m (externo)**			
02.002.010	**Carga mecânica de material de 1ª categoria**	**m3**	**6,59**
> Meio-fio = (146,48m x 0,12m x 0,30m) x 1,25 = **6,59m3**			
02.002.011	**Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³**	**tkm**	**14,82**
> Meio-fio = 6,59m3 x1,5t/m3 x 1,50km = **14,82tkm**			
02.004	**MARCO "AV. JOAO DE DEUS SOUZA"**		
02.004.009	**Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem**	**m2**	**2,00**
> 4,25m2 (levantado) - 2,25m2 (contratado) = **2,00m2**			
02.006	**DIVERSOS**		
02.006.001	**Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio**	**m2**	**8,19**
> 424,34m2 + 3,37m2 + 11,10m2 = 438,81m2 (levantado) - 430,62m2 (contratado) = **8,19m2**			
02.006.004	**Limpeza geral**	**m2**	**40,22**
> 644,06m2 (levantado) - 603,84m2 (contratado) = **40,22m2**			
02.006.005	**Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada**	**m3**	**43,88**
> 438,81m2 x 0,10m = **43,88m3**			
02.006.006	**Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³**	**tkm**	**987,30**
> 43,88m3 x1,5t/m3 x 15km = **987,30tkm**			
03	**ROTATÓRIA 1**		
03.001	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**		
03.001.006	**Locação de praças com piquetes de madeira**	**m2**	**1.256,63**
> **Locação interna da rotatória = 1.256,63m2**			
03.002	**PAVIMENTAÇÃO**		
03.002.005	**Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3**	**m**	**88,70**
> 125,66m (externo) + 66,32m (trevo) + 49,51m (trevo) + 273,51m (interno) = 515,00m (levantado) - 426,30m (contratado) = **88,70m**			
03.002.013	**Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³**	**tkm**	**71,94**
> 3,19725m3 x 1,5t/m3 x 15km = **71,94tkm**			
03.002.014	**Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado**	**m**	**125,66**
> **125,66m (externo)**			
03.002.015	**Carga mecânica de material de 1ª categoria**	**m3**	**5,65**
> Meio-fio = (125,66m x 0,12m x 0,30m) x 1,25 = **5,65m3**			
03.002.016	**Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³**	**tkm**	**12,71**
> Meio-fio = 5,65m3 x1,5t/m3 x 1,50km = **12,71tkm**			
03.002.017	**Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada**	**m3**	**70,15**
> 50,84m2 + 170,35m2 + 50,84m2 + 316,40m2 + (153,94m2 + 40,89m2) = 701,48m2 x 0,10m = **70,15m3**			

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engª Civil - CREA/SE 270936244

Danyelson Leite dos Santos:98986546515

Assinado digitalmente por Danyelson Leite dos Santos:98986546515
ND: C=BR, CN=Danyelson Leite dos Santos:98986546515, O=ICP-Brasil, OU=AC Solucao Digital Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.08 17:27:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.2.1

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - 1º ADITIVO

OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades
03.002.018	**Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³**	**tkm**	**1.578,37**
> 70,15m3 x1,5t/m3 x 15km = **1.578,37tkm**			
03.002.019	**Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04**	**m3**	**106,59**
> 443,70m2 + 188,74m2 + 91,71m2 + 164,11m2 = 888,26m2 x 0,12m = **106,59m3**			
03.002.020	**Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³**	**tkm**	**2.398,27**
> 106,59m3 x1,5t/m3 x 15km = **2.398,27tkm**			
03.004	**MARCO "SIMBOLO ITABAIANA"**		
03.004.010	**Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem**	**m2**	**30,21**
> 1,25m2 (estrelas amarelas) + 1,00m2 (estrela vermelha) +2,82m2 (pés 06 estrelas) + 36,41m2 (escudo) = 41,48m2 (levantado) 11,27m2 (contratado) = **30,21m2**			
03.006	**DIVERSOS**		
03.006.001	**Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio**	**m2**	**248,62**
> 50,84m2 + 170,35m2 + 113,54m2 + 50,84m2 (rotatória) + 121,05m2 (trevo) + 162,83m2 (trevo) = **669,45m2 (levantado) - 420,83m2 (contratado) = 248,62m2**			
04	**ROTATÓRIA 2**		
04.001	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**		
04.001.006	**Locação de praças com piquetes de madeira**	**m2**	**1.940,00**
> **Locação interna da rotatória = 1.940,00m2**			
04.002	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		
04.002.001	**Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3**	**m**	**229,86**
> 156,14m (externo) + 6,37m + 38,63m + 5,66m + 7,95m + 35,68m + 8,68m + 10,34m + 25,34m + 10,74m + 12,11m + 24,12m + 10,12m + 8,70m + 35,68m + 8,44m + 6,19m + 38,63m + 6,43m + 2,10m + 12,86m + 2,10m + 2,10m + 12,34m + 2,10m + 2,10m + 12,34m + 2,10m + 2,10m + 12,86m + 2,10m (interno) + 17,60m + 22,95m + 22,30m + 15,00m + 23,26m + 24,30m + 3,20m (trevos) = 651,76m (levantado) - 421,90m (contratado) = **229,86m**			
04.002.011	**Regularização Manual**	**m2**	**21,44**
> 651,76m x 0,13m = 84,73m2 (levantado) - 63,285m2 (contratado) = **21,44m2**			
04.002.012	**Colchão de areia**	**m3**	**1,07**
> 84,73m2 x 0,05m = 4,23m3 (levantado) - 3,1642m3 (contratado) = **1,07m3**			
04.002.013	**Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³**	**tkm**	**95,17**
> 4,23m³ x1,5t/m3 x 15km = **95,17tkm**			
04.002.014	**Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado**	**m**	**156,14**
> **156,14m (externo)**			
04.002.015	**Carga mecânica de material de 1ª categoria**	**m3**	**7,02**
> **Meio-fio =** (156,14m x 0,12m x 0,30m) x 1,25 = **7,02m3**			
04.002.016	**Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³**	**tkm**	**15,79**
> **Meio-fio =** 7,02m³ x1,5t/m3 x 1,50km = **15,79tkm**			
04.002.017	**Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada**	**m3**	**63,15**
> 116,15m2 + 124,97m2 + 21,32m2 + 20,40m2 + 20,40m2 + 21,32m2 + 125,93m2 + 138,95m2 + 42,14m2 = 631,58m2 x 0,10m = **63,15m3**			
04.002.018	**Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³**	**tkm**	**1.420,87**
> 63,15m3 x 1,5t/m3 x 15km = **1.420,87tkm**			

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engª Civil - CREA/SE 2709362449

Danyelson Leite dos Santos:98986546515

Assinado digitalmente por Danyelson Leite dos Santos:98986546515
ND: C=BR, CN=Danyelson Leite dos Santos:98986546515, O=ICP-Brasil, OU=AC Solucao Digital Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.08 17:27:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.2.1

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - 1º ADITIVO

OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades
04.002.019	**Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04**	**m3**	**196,98**
> 1767,83m2 - 126,32m2 (área de grama) = 1.641,51m2 x 0,12m = **196,98m3**			
04.002.020	**Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³**	**tkm**	**4.432,05**
> 196,98m3 x 1,50t/m3 x 15km = **4.432,05tkm**			
04.004	**ESCULTURA DE CONCRETO ARMADO**		
04.004.005	**Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem**	**m2**	**8,00**
> 44,72m2 - 36,72m2 = **8,00m2**			
04.005	**DIVERSOS**		
04.005.001	**Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio**	**m2**	**288,15**
>138,95m2 + 125,93m2 + 20,40m2 + 21,32m2 + 20,40m2 + 21,32m2 + 42,14m2 + 124,67m2 + 116,14m2 (rotatória) + 125,93m2 + 138,95m2 (trevos) = 896,45m2 (levantado) - 608,30m2 (contratado) = **288,15m2**			
05	**RÓTULA 3**		
05.001	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**		
05.001.006	**Locação de praças com piquetes de madeira**	**m2**	**1.676,38**
> Locação interna da rotatória = 1.676,38m2			
05.002	**PAVIMENTAÇÃO**		
05.002.001	**Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3**	**m**	**331,74**
> 145,14 (externo) + 17,80m + 20,92m + 9,36m + 9,36m + 10,86m + 7,71m + 22,33m + 11,51m + 8,51m + 45,48m + 8,35m + 6,24m + 49,04m + 6,30m + 37,70m (circ. central) + 1,60m + 11,68m + 1,60m + 2,00m + 11,68m + 2,00m + 7,73m + 1,50m + 11,68m + 1,50m + 2,00m + 11,68m + 2,00m + 7,73m = 492,99m (levantado) - 161,25m (contratado) = **331,74m**			
05.002.004	**Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³**	**tkm**	**1.881,99**
> 114,06m3 x 1,5t/m3 x 12km = 2.053,08tkm (levantado) - 171,09tkm (contratado) = **1.881,99tkm**			
05.002.011	**Regularização Manual**	**m2**	**39,85**
> 492,63m (meio-fio levantado) x 0,13m = 64,04m2 > 64,04m2 - 24,1875m2 = **39,85m2**			
05.002.012	**Colchão de areia**	**m3**	**0,35**
> 64,04m2 x 0,05m = 3,20m3 > 3,20m3 - 2,8519m3 = **0,35m3**			
05.002.013	**Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³**	**tkm**	**72,00**
> 3,20m³ x1,5t/m3 x 15km = **72,00m³**			
05.002.014	**Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado**	**m**	**175,14**
> Meio-fio = 145,14m + 30,00m = **175,14m**			
05.002.015	**Carga mecânica de material de 1ª categoria**	**m3**	**7,56**
> Meio-fio = (175,14m x 0,12m x 0,30m) x 1,25 = **7,56m3**			
05.002.016	**Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³**	**tkm**	**170,10**
> Meio-fio = 7,56m³ x1,5t/m3 x 15km = **170,10tkm**			
05.002.017	**Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada**	**m3**	**63,16**
> 116,15m2 + 124,97m2 + 21,32m2 + 20,40m2 + 20,40m2 + 21,32m2 + 125,93m2 + 138,95m2 + 42,14m2 = 631,58m2 x 0,10m = **63,16m3**			
05.002.018	**Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³**	**tkm**	**1.421,10**
> 63,16m3 x 1,5t/m3 x 15km = **1.421,10tkm**			

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engª Civil - CREA/SE 2609362449

Danyelson Leite dos Santos:98986546515

Assinado digitalmente por Danyelson Leite dos Santos:98986546515
ND: C=BR, CN=Danyelson Leite dos Santos:98986546515, O=ICP-Brasil, OU=AC Solucao Digital Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.08 17:27:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.2.1

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - 1º ADITIVO

OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades
05.002.019	**Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04**	**m3**	**196,98**
> 1767,83m2 - 126,32m2 (área de grama) = 1.641,51m2 x 0,12m = **196,98m3**			
05.002.020	**Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³**	**tkm**	**4.432,05**
> 196,98m3 x 1,5t/m3 x 15km = **4.432,05tkm**			
08	**CANTEIRO 2**		
07.002	**PAVIMENTAÇÃO**		
07.002.006	**Demolição de concreto com martelete e compressor**	**m3**	**19,96**
> Área da ciclovia = 499,005m2 (levantado) x 0,04m = **19,96m3**			
07.002.007	**Carga mecânica de material de 1ª categoria**	**m3**	**24,95**
> Área da ciclovia = 19,96m³ x 1,25 = 24,95m3			
07.002.008	**Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³**	**tkm**	**561,37**
> Área da ciclovia = 24,95m³ x1,5t/m3 x 15km = 561,37tkm			
08	**CANTEIRO 3**		
08.003	**DIVERSOS**		
08.003.001	**Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio**	**m2**	**161,61**
> 238,83m2 + 313,89m2 + 76,18m2 = 628,90m2 (levantado) - 467,29m2 (contratado) = **161,61m2**			
09	**CANTEIRO 4**		
09.001	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**		
09.001.006	**Locação de praças com piquetes de madeira**	**m2**	**209,09**
> 1.851,85m2 (levantado) - 1.642,76m2 (contratado) = **209,09m2**			
09.002	**PAVIMENTAÇÃO**		
09.002.003	**Lona plástica preta**	**m2**	**26,46**
> 482,75m2 + 260,01m2 + 701,46m2 + 16,02m2 = 1.128,85m2 (levantado) - 1.102,39m2 (contratado) = **26,46m2**			
09.002.004	**Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos**	**m2**	**26,46**
> 482,75m2 + 260,01m2 + 701,46m2 + 16,02m2 = 1.128,85m2 (levantado) - 1.102,39m2 (contratado) = **26,46m2**			
09.002.008	**Demolição de concreto com martelete e compressor**	**m**	**142,00**
> **142,00m**			
09.002.009	**Carga mecânica de material de 1ª categoria**	**m3**	**6,39**
> (142,00m x 0,12m x 0,30m) x 1,25 = **6,39m3**			
09.002.010	**Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³**	**tkm**	**143,77**
> 6,93m³ x1,5t/m3 x 15km = **143,77tkm**			
09.002.011	**Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada**	**m3**	**60,89**
> 75,13m2 + 347,86m2 + 75,13m2 + 110,79m2 = 608,91m2 x 0,10m = **60,89m3**			
09.002.012	**Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³**	**tkm**	**1.370,02**
> 60,89m3 x 1,5t/m3 x 15km = **1.370,02km**			
09.002.013	**Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04**	**m3**	**175,23**
> 1.460,24m2 x 0,12m = **175,23m3**			
09.002.014	**Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³**	**tkm**	**3.942,67**
> 175,23m3 x 1,5t/m3 x 15km = **3.942,67tkm**			

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freira
Engª Civil - CREA/SE 270936244-9

Danyelson Leite dos Santos:98986546515

Assinado digitalmente por Danyelson Leite dos Santos:98986546515
ND: C=BR, CN=Danyelson Leite dos Santos:98986546515, O=ICP-Brasil, OU=AC Solucao Digital Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.08 17:27:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.2.1

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO - 1º ADITIVO OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO			
Item	**Discriminação dos Serviços**	**Und**	**Quantidades**
09.003	**DIVERSOS**		
09.003.001	**Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio**	**m2**	**169,86**
> 110,79m2 + 74,85m2 + 75,13m2 + 347,86m2 = 608,63m2 (levantado) - 438,77m2 (contratado) = **169,86m2**			
09.003.005	**Limpeza geral**	**m2**	**209,09**
> 1.851,85m2 (levantado) - 1.642,76m2 (contratado) = **209,09m2**			
15	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
15.001	**Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022**	**m2**	**6,00**
> 3,00m x 2,00m = **6,00m2**			
15.002	**Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m**	**mês**	**5,00**
> **05 meses**			

Prefeitura Municipal do Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engª Civil - CREA/SE 2709362449

Danyelson Leite dos Santos:98986546515
Assinado digitalmente por Danyelson Leite dos Santos:98986546515
ND: C=BR, CN=Danyelson Leite dos Santos:98986546515, O=ICP-Brasil, OU=AC Solucao Digital Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.08 17:27:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.2.1

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO C[illegible]TEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 01 - ADITIVO	CONTRATO nº 104/2026 ORDEM DE SERVIÇO INICIO - 07/04/2026



MEIO-FIO, REGULARIZAÇÃO, COLCHÃO DE AREIA DO CANTEIRO DO MARCO "JOÃO DE DEUS"



COLCHÃO DE AREIA E TERRA VEGETAL DO CANTEIRO DO MARCO "JOÃO DE DEUS"



REVESTIMENTO METÁLICO DO MARCO JOAO DE DEUS SOUSA



GRAMA DO CANTEIRO DO MARCO "JOÃO DE DEUS"



LOCAÇÃO, DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO, MEIO-FIO - ROTATÓRIA 01



TERRA VEGETAL, ATERRO E GRAMA - ROTATÓRIA 01

ELABORADO POR:

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engª Civil - CREA/SE 270362449

Danyelson Leite dos Santos:98986546515

Assinado digitalmente por Danyelson Leite dos Santos:98986546515
ND: C=BR, CN=Danyelson Leite dos Santos:98986546515, O=ICP-Brasil, OU=AC Solucao Digital Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.08 17:28:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.2.1

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO C[illegible]EIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 01 - ADITIVO	CONTRATO nº 104/2026 ORDEM DE SERVIÇO INICIO - 07/04/2026



REVESTIMENTO METÁLICO - ROTATÓRIA 01



DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO, LOCAÇÃO E MEIO-FIO DO ROTATÓRIA 02



REGULARIZAÇÃO - ROTATÓRIA 02



TERRA VEGETAL E ATERRO - ROTATÓRIA 02

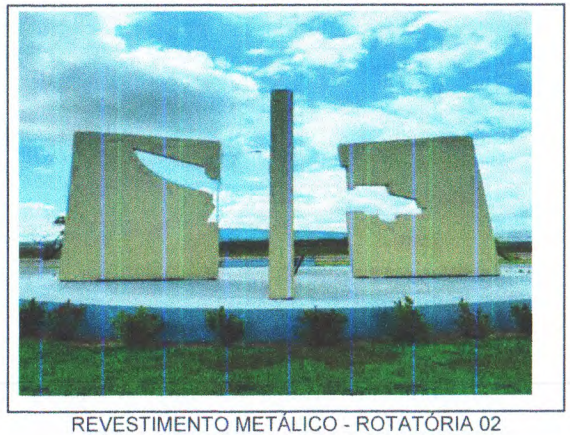

REVESTIMENTO METÁLICO - ROTATÓRIA 02



GRAMA - ROTATÓRIA 02

ELABORADO POR:

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Danyelson Leite dos Santos:9898 6546515

Assinado digitalmente por Danyelson Leite dos Santos:98986546515
ND: C=BR, CN=Danyelson Leite dos Santos:98986546515, O=ICP-Brasil, OU=AC Solucao Digital Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.08 17:28:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.2.1

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engª Civil - CREA/SE 2709362449

OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 01 - ADITIVO	CONTRATO nº 104/2026 ORDEM DE SERVIÇO INICIO - 07/04/2026

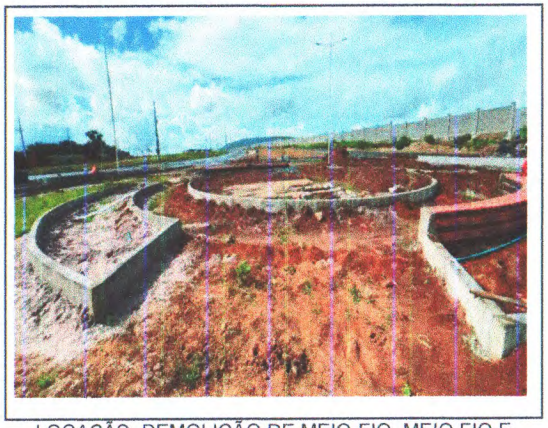

LOCAÇÃO, DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO, MEIO FIO E REGULARIZAÇÃO - RÓTULA 03



TERRA VEGETAL E ATERRO - RÓTULA 03



DEMOLIÇÃO DE CONCRETO - CANTEIRO 02



GRAMA - CANTEIRO 03



GRAMA - CANTEIRO 03



DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO E MEIO-FIO - CANTEIRO 04

ELABORADO POR:

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Danyelson Leite dos Santos:98986546515

Assinado digitalmente por Danyelson Leite dos Santos:98986546515
ND: C=BR, CN=Danyelson Leite dos Santos:98986546515, O=ICP-Brasil, OU=AC Solucao Digital Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.08 17:28:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.2.1

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engª Civil - CREA/SE 2709362449

OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 01 - ADITIVO	CONTRATO nº 104/2026 ORDEM DE SERVIÇO INICIO - 07/04/2026



LOCAÇÃO, LONA E PISO DE CONCRETO - CANTEIRO 04



TERRA VEGETAL E ATERRO - RÓTULA 04



GRAMA - CANTEIRO 04



GRAMA - CANTEIRO 04



PLACA DE OBRA



CONTAINER

ELABORADO POR:

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Danyelson Leite dos Santos:98986546515

Assinado digitalmente por Danyelson Leite dos Santos:98986546515
ND: C=BR, CN=Danyelson Leite dos Santos:98986546515, O=ICP-Brasil, OU=AC Solucao Digital Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.08 17:28:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.2.1

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engª Civil - CREA/SE 270936244
