| EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MÀNUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA NO BAIRRO OVIEDO TEIXEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE. | DATA DE INICIO: 13/10/2025 | BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 | NOVATEC |
|---|---|---|---|
| CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | DATA DE TÉRMINO: 02/12/2025 | PERÍODO: 13/10/2025 a 11/11/2025 | CONTRATO 336/25 |
| CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA | | DATA DE MEDIÇÃO: 17/11/2025 | |

| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANTIDADES | | | | | VALORES (R$) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONTRATO | ACUMULADO ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO ATÉ O PERÍODO | SALDO A MEDIR | PREÇO UNIT | CONTRATO | ACUMULADO ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO ATÉ O PERÍODO | SALDO A MEDIR | % Medido |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | R$ 11.082,20 | R$ - | R$ 9.641,50 | R$ 9.641,50 | R$ 1.440,70 | 87,00 |
| 01.01 | Equipe Dirigente | UN | 0,006 | - | 0,00522 | 0,00500 | 0,00100 | 1.667.154,61 | R$ 10.002,93 | R$ - | R$ 8.702,54 | R$ 8.702,54 | R$ 1.300,39 | 87,00 |
| 01.02 | Manutenção do Canteiro | UN | 0,005 | - | 0,00435 | 0,00435 | 0,00065 | 128.490,70 | R$ 642,45 | R$ - | R$ 558,93 | R$ 558,93 | R$ 83,52 | 87,00 |
| 01.03 | Equipamentos de Apoio à Produção | UN | 0,005 | - | 0,00435 | 0,00435 | 0,00065 | 87.364,20 | R$ 436,82 | R$ - | R$ 380,03 | R$ 380,03 | R$ 56,79 | 87,00 |
| 2 | SEVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | R$ 3.880,32 | R$ - | R$ 2.586,88 | R$ 2.586,88 | R$ 1.293,44 | 66,67 |
| 02.01 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev. 02_01/2022 | m² | 12,00 | | 8,00 | 8,00 | 4,00 | 323,36 | R$ 3.880,32 | R$ - | R$ 2.586,88 | R$ 2.586,88 | R$ 1.293,44 | 66,67 |
| 3 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | | | | | | | | R$ 205.913,32 | | R$ 203.676,15 | R$ 203.676,15 | R$ 2.237,20 | 98,91 |
| 03.01 | Locação de serviços de pavimentação | m² | 1935,86 | - | 1.935,86 | 1935,86 | 0,00 | 1,40 | R$ 2.710,20 | R$ - | R$ 2.710,20 | R$ 2.710,20 | R$ - | 100,00 |
| 03.02 | Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019 | m² | 1935,86 | - | 1.935,86 | 1935,86 | 0,00 | 2,42 | R$ 4.684,78 | R$ - | R$ 4.684,78 | R$ 4.684,78 | R$ - | 100,00 |
| 03.03 | Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte | m² | 1935,86 | - | 1.935,86 | 1935,86 | 0,00 | 1,93 | R$ 3.736,21 | R$ - | R$ 3.736,22 | R$ 3.736,22 | R$ - | 100,00 |
| 03.04 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019 | m² | 96,79 | - | 96,79000 | 96,79 | 0,00 | 1750,10 | R$ 169.392,18 | R$ - | R$ 169.392,19 | R$ 169.392,19 | R$ - | 100,00 |
| 03.05 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m³xkm | 6968,88 | - | 6.194,76 | 6194,76 | 774,12 | 2,89 | R$ 20.140,06 | R$ - | R$ 17.902,86 | R$ 17.902,86 | R$ 2.237,20 | 88,89 |
| 03.06 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m³xkm | 4645,92 | - | 4.645,92 | 4645,92 | 0,00 | 1,13 | R$ 5.249,89 | R$ - | R$ 5.249,90 | R$ 5.249,90 | R$ - | 100,00 |
| 3.07 | SINALIZAÇÃO | | | | | | | | R$ 12.405,36 | | R$ - | R$ - | R$ 12.405,36 | 0,00 |
| 3.07.001 | PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTIC EM ALTO RELEVO TIPO I POR EXTRUSÃO - RELEVO DUPLO COM BASE | m² | 54,00 | - | - | - | 54,00 | 124,91 | R$ 6.745,14 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 6.745,14 | |
| 3.07.002 | PINTURA DE FAIXA COM PLÁSTICO A FRIO TRICOMPONENTE À BASE DE RESINAS METACRÍLICAS POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 0,6 MM | m² | 65,27 | - | - | - | 65,27 | 78,99 | R$ 5.155,99 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 5.155,99 | 0,00 |
| 3.07.003 | Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva | m² | 0,50 | - | - | - | 0,50 | 505,09 | R$ 252,55 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 252,55 | 0,00 |
| 3.07.004 | Fornecimento e instalação de suporte de madeira para placas de si nalização, em solo, com h= de 2,0 m e seção de 7,5 x 7,5 cm. af_0 3/2022 | UN | 2,00 | - | - | - | 2,00 | 125,84 | R$ 251,68 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 251,68 | 0,00 |
| 3.08 | PROJETO | | | | | | | | R$ 3.663,18 | | R$ 784,58 | R$ 784,58 | R$ 2.878,60 | 21,42 |
| 03.08.001 | Projeto Executivo | km | 0,218 | - | 0,0466 | 0,046 | 0,17 | 16836,00 | R$ 3.663,18 | R$ - | R$ 784,58 | R$ 784,58 | R$ 2.878,60 | 21,42 |
| 3.09 | LIMPEZA | | | | | | | | R$ 677,55 | | R$ - | | R$ 677,55 | 0,00 |
| 03.09.001 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 1935,86 | - | - | - | 1935,86 | 0,35 | R$ 677,55 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 677,55 | 0,00 |
| | TOTAL DO ORÇAMENTO | | | | | | | | R$ 237.621,93 | R$ - 0,00% | R$ 216.689,11 91,19% | R$ 216.689,11 91,19% | R$ 20.932,82 8,81% | 91,19% |

| ASSINATURA RESPONSÁVEL TÉCNICO | ASSINATURA FISCALIZAÇÃO | VALOR DA MEDIÇÃO: 216.689,11 duzentos e dezesseis mil seiscentos e oitenta e nove reais e onze centavos). |
|---|---|---|
| ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415 Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415 | | DATA LIBERAÇÃO : _____/_____/_____ |

gov.br Documento assinado digitalmente
RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJ
Data: 25/11/2025 16:01:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA: 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

# EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA NO BAIRRO OVIEDO TEIXEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

**CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA**
**CONTRATO 336/2025**
**CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

| ITEM | DESCRIMINAÇAO DO CALCULO | | | UND | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRAÇAO LOCAL | | | | |
| 01.01 | Equipe Dirigente | | | QUANT CONTRATO | QUANT MEDIDA |
| | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | |
| | | | | | |
| VALOR TOTAL DO CONTRATO (A) | | VALOR MEDIDO S/ ADM (B) | =B/A | | |
| | R$ 237.621,93 | R$ 207.047,61 | 0,87 | 0,006 | 0,00522 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| EXECUTADO NO PERÍODO: | | | | | 0,00522 |
| ACUMULADO ANTERIOR: | | | | | 0,00 |
| ACUMULADO ATUAL: | | | | | 0,005220 |
| SALDO DO CONTRATO ( A MEDIR) | | | | | 0,00100 |
| A MEDIR NO PERÍODO: | | | | | 0,00522 |
| | | | | | |

José Arnaldo de M. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

# EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA NO BAIRRO OVIEDO TEIXEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

**CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA**
**CONTRATO 336/2025**
**CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

| ITEM | DESCRIMINAÇAO DO CALCULO | | | UND | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRAÇAO LOCAL | | | | |
| 01.02 | Manutenção do Canteiro | | | QUANT CONTRATO | QUANT MEDIDA |
| | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | |
| | | | | | |
| VALOR TOTAL DO CONTRATO (A) | | VALOR MEDIDO S/ ADM (B) | =B/A | | |
| | R$ 237.621,93 | R$ 207.047,61 | 0,87 | 0,005 | 0,0044 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| EXECUTADO NO PERÍODO: | | | | | 0,00435 |
| ACUMULADO ANTERIOR: | | | | | 0,00 |
| ACUMULADO ATUAL: | | | | | 0,004350 |
| SALDO DO CONTRATO ( A MEDIR) | | | | | 0,00065 |
| À MEDIR NO PERÍODO: | | | | | 0,00435 |
| | | | | | |

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

# EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA NO BAIRRO OVIEDO TEIXEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

**CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA**
**CONTRATO 336/2025**
**CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

| ITEM | DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO | | | UND | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | |
| 01.03 | Equipamentos de Apoio à Produção | | | QUANT CONTRATO | QUANT MEDIDA |
| | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | |
| | | | | | |
| VALOR TOTAL DO CONTRATO (A) | | VALOR MEDIDO S/ ADM (B) | =B/A | | |
| | R$ 237.621,93 | R$ 207.047,61 | 0,87 | 0,005 | 0,004350 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| EXECUTADO NO PERÍODO: | | | | | 0,004350 |
| ACUMULADO ANTERIOR: | | | | | 0,0 |
| ACUMULADO ATUAL: | | | | | 0,004350 |
| SALDO DO CONTRATO ( A MEDIR) | | | | | 0,000650 |
| A MEDIR NO PERÍODO: | | | | | 0,004350 |
| | | | | | |

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2321031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

# EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA NO BAIRRO OVIEDO TEIXEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 336/2025
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

| ITEM | DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO | UND | |
|---|---|---|---|
| 2 | SEVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 02.01 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev. 02_01/2022 | m² | m² |
| | | | |
| | PLACA DE OBRA | | |
| | | | |
| | Placa da obra: 2,0x4,00m | 8,00 | 8,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| EXECUTADO NO PERÍODO: | | m² | 8,00 |
| ACUMULADO ANTERIOR: | | | 0,00 |
| ACUMULADO ATUAL: | | | 8,00 |
| SALDO DO CONTRATO ( A MEDIR): | | | 4,00 |
| À MEDIR NO PERÍODO: | | | 8,00 |
| | | | |

Jose Arnaldo de N Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

# EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA NO BAIRRO OVIEDO TEIXEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

**CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA**
**CONTRATO 336/2025**
**CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

| ITEM | DESCRIMINAÇAO DO CALCULO | UND | AREA |
|---|---|---|---|
| 3 | RECAPEAMENTO ASFALTICO - RUA FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | | |
| 03.01 | Locação de serviços de pavimentação | m² | ÁREA |
| | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA | | |
| | | | |
| De acordo com o projeto topográfico | | 1.935,86 | 1.935,86 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| EXECUTADO NO PERÍODO: | | m² | 1.935,86 |
| ACUMULADO ANTERIOR: | | | 0,00 |
| ACUMULADO ATUAL: | | | 1.935,86 |
| SALDO DO CONTRATO ( A MEDIR) | | | 0,00 |
| A MEDIR NO PERÍODO: | | | 1.935,86 |
| | | | |

Jose Arnaldo do N Pereira Junior
Eng. Civil CREA 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

# EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA NO BAIRRO OVIEDO TEIXEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 336/2025
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

| ITEM | DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO | UND | AREA |
|---|---|---|---|
| 3 | RECAPEAMENTO ASFALTICO - RUA FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA | | |
| 03.02 | Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019 | m² | ÁREA |
| | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA | | |
| | | | |
| De acordo com o projeto topográfico | | 1.935,86 | 1935,86 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| EXECUTADO NO PERÍODO: | | m² | 1.935,86 |
| ACUMULADO ANTERIOR: | | | 0,00 |
| ACUMULADO ATUAL: | | | 1.935,86 |
| SALDO DO CONTRATO ( A MEDIR) | | | 0,00 |
| À MEDIR NO PERÍODO: | | | 1.935,86 |
| | | | |

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

# EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA NO BAIRRO OVIEDO TEIXEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

**CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA**
**CONTRATO 336/2025**
**CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

| ITEM | DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO | UND | ÁREA |
|---|---|---|---|
| 3 | RECAPEAMENTO ASFALTICO - RUA FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | | |
| 03.03 | Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte | m² | ÁREA |
| | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA | | |
| | | | |
| De acordo com o projeto topográfico | | 1.935,86 | 1935,86 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| EXECUTADO NO PERÍODO: | | m² | 1.935,86 |
| ACUMULADO ANTERIOR: | | | 0,00 |
| ACUMULADO ATUAL: | | | 1.935,86 |
| SALDO DO CONTRATO ( A MEDIR) | | | 0,00 |
| A MEDIR NO PERIODO: | | | 1.935,86 |
| | | | |

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

# EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA NO BAIRRO OVIEDO TEIXEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

**CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA**
**CONTRATO 336/2025**
**CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

| ITEM | DESCRIMINAÇAO DO CALCULO | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | RECAPEAMENTO ASFALTICO - RUA FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | | | |
| 03.04 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019 | ÁREA | ESP. | VOLUME DE CBUQ |
| | | | | |
| | | ÁREA (m²) | ESP. (m) | CONCRETO ASFÁLTICO (m³) |
| Camada | | 1.935,86 | 0,0500 | 96,79 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| EXECUTADO NO PERÍODO: | | | ESP. | 96,79 |
| ACUMULADO ANTERIOR: | | | | 0,00 |
| ACUMULADO ATUAL: | | | | 96,79 |
| SALDO DO CONTRATO (A MEDIR) | | | | 0,00 |
| A MEDIR NO PERÍODO: | | | | 96,79 |

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

# EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA NO BAIRRO OVIEDO TEIXEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 336/2025

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

| ITEM | DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | RECAPEAMENTO ASFALTICO - RUA FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | | | |
| 03.05 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | VOLUME DE CBUQ | DMT | QUANTIDADE TOTAL |
| | | | | |
| | | m³ | Km | (m³XKm) |
| Camada | | 96,79 | 30 | 2903,79 |
| | | 96,79 | 34,00 | 3290,97 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| EXECUTADO NO PERÍODO: | | | | 6.194,76 |
| ACUMULADO ANTERIOR: | | | | 0,00 |
| ACUMULADO ATUAL: | | | | 6.194,76 |
| SALDO DO CONTRATO | | | | 774,12 |
| A MEDIR NO PERÍODO: | | | | 6.194,76 |
| | | | | |

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

# EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA NO BAIRRO OVIEDO TEIXEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 336/2025
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

| ITEM | DESCRIMINAÇAO DO CALCULO | UND | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | RECAPEAMENTO ASFALTICO - RUA FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | | | |
| 03.06 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | VOLUME DE CBUQ | DMT | QUANTIDADE TOTAL |
| | | | | |
| | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA | m³ | Km | (m³XKm) |
| | Camada | 96,790 | 48,0000 | 4645,92 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| EXECUTADO NO PERÍODO: | | | | 4.645,92 |
| ACUMULADO ANTERIOR: | | | | 0,00 |
| ACUMULADO ATUAL: | | | | 4.645,92 |
| SALDO DO CONTRATO ( A MEDIR) | | | | 0,00 |
| A MEDIR NO PERÍODO: | | | | 4.645,92 |
| | | | | |

José Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

# EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA NO BAIRRO OVIEDO TEIXEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

**CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA**
**CONTRATO 336/2025**
**CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

| ITEM | DESCRIMINAÇAO DO CALCULO | UND | |
|---|---|---|---|
| 3.08 | PROJETO | | |
| 03.08.001 | Projeto Executivo | m² | Km |
| | PROJETO | | |
| | | | |
| De acordo com o levantamento | | 46,60 | 0,05 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| EXECUTADO NO PERÍODO: | | km | 0,05 |
| ACUMULADO ANTERIOR: | | | 0,00 |
| ACUMULADO ATUAL: | | | 0,05 |
| SALDO DO CONTRATO ( A MEDIR) | | | 0,17 |
| À MEDIR NO PERÍODO: | | | 0,04660 |
| | | | |

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA NO BAIRRO OVIEDO TEIXEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.**

| ITEM | DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO | | |
|---|---|---|---|
| | DMT | | |

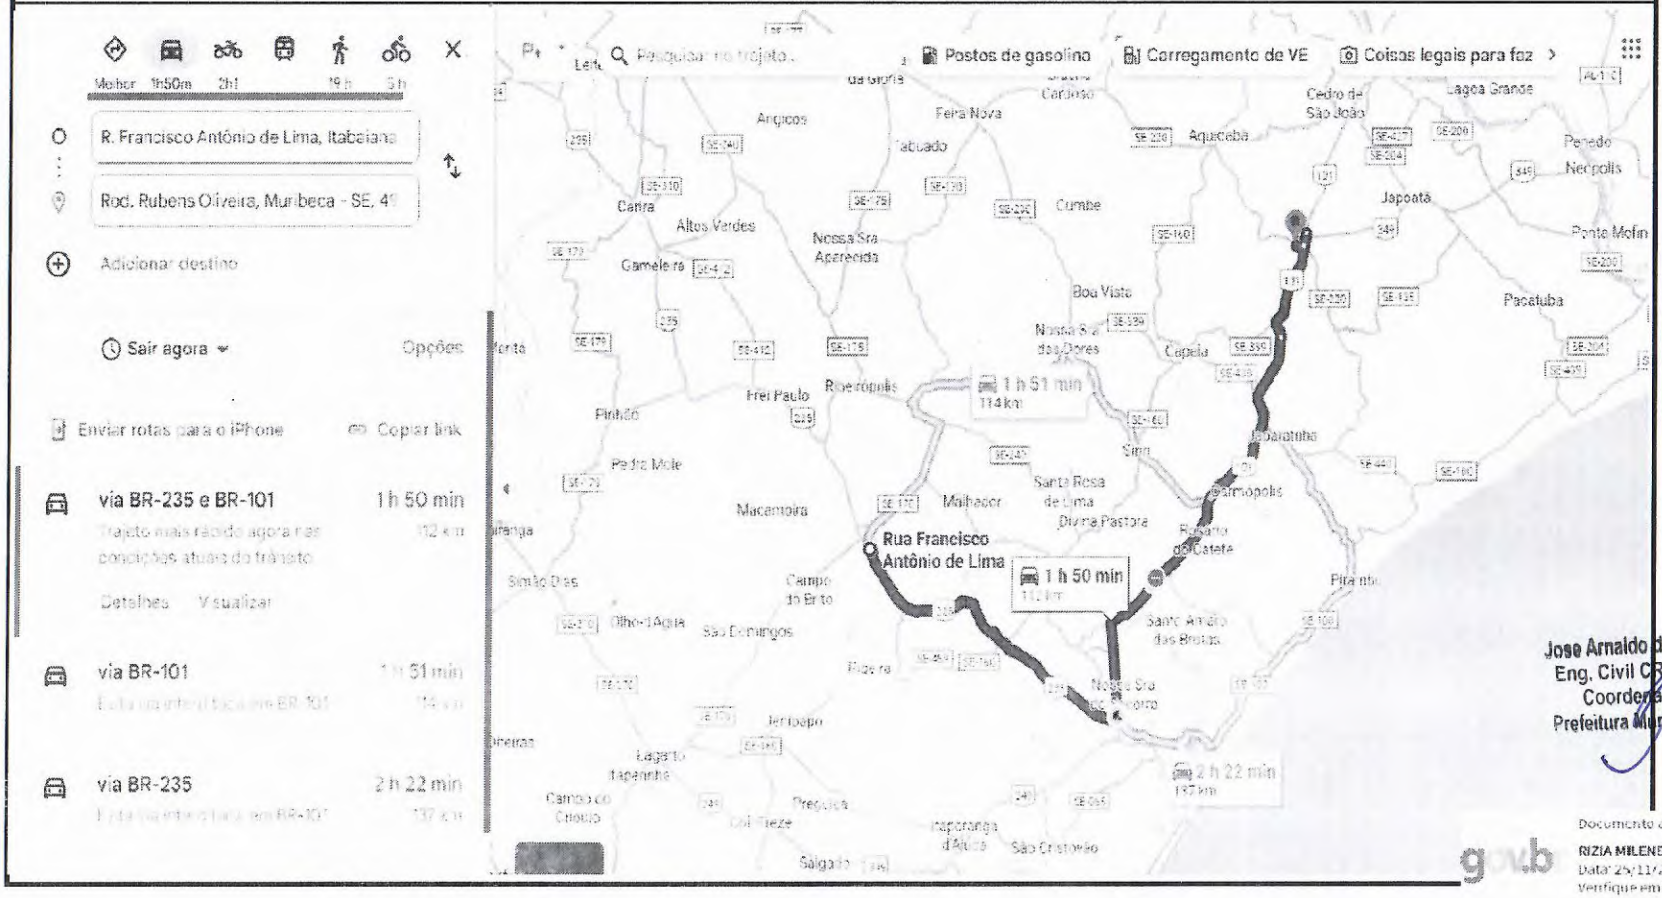


Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Documento assinado digitalmente
RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJ
Data: 25/11/2025 16:01:0-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415

**OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA NO BAIRRO OVIEDO TEIXEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.**

**LOCAL DA OBRA: RUA FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA - ITABAIANA-SE**

**CONTRATO: 336/2025**

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

# MEDIÇÃO 01

**Período: 13/10/2025 a 11/11/2025**

| ITEM | RELATÓRIO FOTOGRÁFICO | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

FOTO 01- RUA FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA- LIMPEZA

FOTO 02- RUA FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA-LIMPEZA

FOTO 03- RUA FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA -PINTURA

FOTO 04- RUA FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA-PINTURA

FOTO 05- RUA FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA-PINTURA

FOTO 06- RUA FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA- APLICAÇÃO DE CBUQ

FOTO 07- RUA FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA-APLICAÇÃO DE CBUQ

FOTO 08- RUA FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA-APLICAÇÃO DE CBUQ

José Arnaldo de M. Vieira Júnior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA NO BAIRRO OVIEDO TEIXEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.**

**LOCAL DA OBRA: RUA FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA - ITABAIANA-SE**

**CONTRATO: 336/2025**

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

# MEDIÇÃO 01

**Período: 13/10/2025 a 11/11/2025**

| ITEM | RELATÓRIO FOTOGRÁFICO | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

FOTO 09-RUA FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA-APLICAÇÃO DE CBUQ

FOTO 10 - RUA FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA-APLICAÇÃO DE CBUQ

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415

gov.br
Documento assinado digitalmente
RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJ
Data: 25/11/2025 16:01:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

José Arnaldo de N Pereira Junior
Eng. Civil/CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana
