OBA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO (REVITALIZAÇÃO PRAÇA POVOADO QUEIMADAS)	BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO Nº 193/2026/PMI	CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE
	B.M.Nº. 01	ORDEM DE SERVIÇO: 08/06/2026	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA -SE	PERIODO: 08/06/2026 a 30/06/2026	DATA: 30/06/2026	

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE					VALORES R$						Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período	Preço Unitário R$	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período				
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							7.833,19	0,00	7.833,19	7.833,19			0,00	100,00
1.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00		6,00	6,00	355,94	2.135,64	0,00	2.135,64	2.135,64			0,00	100,00
1.002	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	207,41		207,41	207,41	27,47	5.697,55	0,00	5.697,55	5.697,55			0,00	100,00
2	**MOVIMENTAÇÕES DE SOLO**							12.501,50	0,00	1.304,10	1.304,10			11.197,40	10,43
2.001	Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023	m3	5,00		5,00	5,00	96,90	484,50	0,00	484,50	484,50			0,00	100,00
2.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	102,42		102,42	102,42	54,72	5.604,42	0,00	5.604,42	5.604,42			0,00	100,00
2.003	Destocamento de árvores de diâmetro de 0,15 a 0,30m	un	8,00		8,00	8,00	36,68	293,44	0,00	293,44	293,44			0,00	100,00
2.004	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	132,50		132,50	132,50	10,81	1.432,33	0,00	1.432,33	1.432,33			0,00	100,00
2.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.987,56		1.987,56	1.987,56	1,20	2.385,07	0,00	2.385,07	2.385,07			0,00	100,00
2.006	Colchão de areia	m3	17,65		10,00	10,00	130,41	2.301,74	0,00	1.304,10	1.304,10			997,64	56,66
3	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**							14.217,22	0,00	2.642,18	2.642,18			11.575,04	18,58
3.001	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m3	43,64		43,64	43,64	56,32	2.457,80	0,00	2.457,80	2.457,80			0,00	100,00
3.002	Demolição de concreto manualmente	m3	29,71		29,71	29,71	266,29	7.911,48	0,00	7.911,48	7.911,48			0,00	100,00
3.003	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	102,52		102,52	102,52	10,16	1.041,60	0,00	1.041,60	1.041,60			0,00	100,00
3.004	Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)	m²	3,00		3,00	3,00	54,72	164,16	0,00	164,16	164,16			0,00	100,00
3.005	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	91,71		91,71	91,71	10,81	991,39	0,00	991,39	991,39			0,00	100,00
3.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.375,66		1.375,66	1.375,66	1,20	1.650,79	0,00	1.650,79	1.650,79			0,00	100,00
4	**PAVIMENTAÇÃO**							67.617,66	0,00	20.305,28	20.305,28			47.312,38	30,03
4.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	248,00		248,00	248,00	44,38	11.006,24	0,00	11.006,24	11.006,24			0,00	100,00
4.002	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022	m3	28,25		12,00	12,00	774,92	21.891,49	0,00	9.299,04	9.299,04			12.592,45	42,48
4.003	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 16 faces, 11x22cm, e=8cm, 39un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	289,14		0,00	0,00	120,08	34.719,93	0,00	0,00	0,00			34.719,93	0,00
5	**ACESSIBILIDADE**							832,96	0,00	0,00	0,00			832,96	0,00
5.001	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00		0,00	0,00	416,48	832,96	0,00	0,00	0,00			832,96	0,00
6	**REVISÕES, ELEVAÇÕES E ESTRUTURAS**							1.979,04	0,00	0,00	0,00			1.979,04	0,00
6.001	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021	m2	5,40		0,00	0,00	64,57	348,68	0,00	0,00	0,00			348,68	0,00
6.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	7,00		0,00	0,00	6,66	46,62	0,00	0,00	0,00			46,62	0,00
6.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	38,50		0,00	0,00	34,43	1.325,56	0,00	0,00	0,00			1.325,56	0,00
6.004	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	m3	0,40		0,00	0,00	645,44	258,18	0,00	0,00	0,00			258,18	0,00
7	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**							54.218,87	0,00	0,00	0,00			54.218,87	0,00
7.001	Fornecimento de Luminária Decorativa à Led ref. EGEU II 60w da Ilumatic ou similar, inclusive poste cônico contínuo de aço reto, h=6,0m - Rev 01	un	9,00		0,00	0,00	3.821,15	34.390,35	0,00	0,00	0,00			34.390,35	0,00

Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONSTRUTORA ROCHA LTDA
MARIA GARDÊNIA ARAÚJO SILVA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 270439694-9

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO (REVITALIZAÇÃO PRAÇA POVOADO QUEIMADAS)	BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO Nº 193/2026/PMI	CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE
	B.M.Nº. 01	ORDEM DE SERVIÇO: 08/06/2026	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA -SE	PERIODO: 08/06/2026 a 30/06/2026	DATA: 30/06/2026	

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R$	VALORES R$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		
7.002	Tubo aço galvanizado c/costura 1 1/4" (32mm), procedência nacional, classe leve, e=2,65mm, 2,71kg/m, NBR-5580	m	31,00		0,00	0,00	66,32	2.055,92	0,00	0,00	0,00	2.055,92	0,00
7.003	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 1 1/4"	un	1,00		0,00	0,00	68,97	68,97	0,00	0,00	0,00	68,97	0,00
7.004	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1 1/4"	un	10,00		0,00	0,00	27,83	278,30	0,00	0,00	0,00	278,30	0,00
7.005	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	8,00		0,00	0,00	3,75	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
7.006	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1,00		0,00	0,00	508,06	508,06	0,00	0,00	0,00	508,06	0,00
7.007	Caixa pré moldada em concreto cinzenta para alinhamento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00		0,00	0,00	18,27	18,27	0,00	0,00	0,00	18,27	0,00
7.008	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	9,00		0,00	0,00	41,79	376,11	0,00	0,00	0,00	376,11	0,00
7.009	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	un	9,00		0,00	0,00	5,83	52,47	0,00	0,00	0,00	52,47	0,00
7.010	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	un	2,00		0,00	0,00	15,83	31,66	0,00	0,00	0,00	31,66	0,00
7.011	Fornecimento e execução de junta de dilatação DELNE 60 2545 44 LT DM / UT 25 VMA, inclusive execução de lábios poliméricos	m	20,00		0,00	0,00	574,56	11.491,20	0,00	0,00	0,00	11.491,20	0,00
7.012	Contator LC1-D1810 - Telemecanick	un	1,00		0,00	0,00	369,68	369,68	0,00	0,00	0,00	369,68	0,00
7.013	Disjuntor termomagnetico tripolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	2,00		0,00	0,00	102,54	205,08	0,00	0,00	0,00	205,08	0,00
7.014	Eletrodulo de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	82,00		0,00	0,00	16,45	1.348,90	0,00	0,00	0,00	1.348,90	0,00
7.015	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	28,00		0,00	0,00	3,63	101,64	0,00	0,00	0,00	101,64	0,00
7.016	Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento	Un	1,00		0,00	0,00	11,85	11,85	0,00	0,00	0,00	11,85	0,00
7.017	Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento	Un	1,00		0,00	0,00	12,31	12,31	0,00	0,00	0,00	12,31	0,00
7.018	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	106,00		0,00	0,00	10,56	1.119,36	0,00	0,00	0,00	1.119,36	0,00
7.019	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	9,00		0,00	0,00	15,95	143,55	0,00	0,00	0,00	143,55	0,00
7.020	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af_02/2025	un	1,00		0,00	0,00	36,49	36,49	0,00	0,00	0,00	36,49	0,00
7.021	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	10,00		0,00	0,00	156,87	1.568,70	0,00	0,00	0,00	1.568,70	0,00
8	**PINTURA**							3.056,39	0,00	0,00	0,00	3.056,39	0,00
8.001	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	105,87		0,00	0,00	20,22	2.140,69	0,00	0,00	0,00	2.140,69	0,00
8.002	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	10,00		0,00	0,00	46,18	461,80	0,00	0,00	0,00	461,80	0,00
8.003	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	15,00		0,00	0,00	30,26	453,90	0,00	0,00	0,00	453,90	0,00
9	**EQUIPAMENTOS DIVERSOS**							70.487,20	0,00	0,00	0,00	70.487,20	0,00
9.001	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	62,00		0,00	0,00	214,18	13.279,16	0,00	0,00	0,00	13.279,16	0,00
9.002	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m	un	2,00		0,00	0,00	806,46	1.612,92	0,00	0,00	0,00	1.612,92	0,00
9.003	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	4,00		0,00	0,00	333,63	1.334,52	0,00	0,00	0,00	1.334,52	0,00
9.004	Parque infantil tipo casinha, em concreto armado fck=35mpa, dimensões l=2,0m, c=2,0m h=3,0m, escorregador nas dimen. c=3,5m l=1,0m, e	un	1,00		0,00	0,00	12.822,76	12.822,76	0,00	0,00	0,00	12.822,76	0,00
9.005	Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo	un	1,00		0,00	0,00	3.706,09	3.706,09	0,00	0,00	0,00	3.706,09	0,00
9.007	Brinquedo - Gangorra em estrutura de concreto, tubo de ferro galvanizado de 3" e 4" e assento de madeira, com 03 pranchas	un	1,00		0,00	0,00	4.987,04	4.987,04	0,00	0,00	0,00	4.987,04	0,00
9.008	1,80m, inclusive aplicação de zarcão e pintada com esmalte sintético, ref.	Un	1,00		0,00	0,00	2.552,69	2.552,69	0,00	0,00	0,00	2.552,69	0,00

Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONSTRUTORA ROCHA LTDA
MARIA GARDÊNIA ARAÚJO SILVA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 2724316949

Jose Arnaldo do N Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO (REVITALIZAÇÃO PRAÇA POVOADO QUEIMADAS)	BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO Nº 193/2026/PMI	CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE
	B.M.Nº. 01	ORDEM DE SERVIÇO: 08/06/2026	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA -SE	PERIODO: 08/06/2026 a 30/06/2026	DATA: 30/06/2026	

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R$	VALORES R$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		
9.009	galv. de 2" e rampa em chapa de aço galvanizado	un	1,00		0,00	0,00	8.944,94	8.944,94	0,00	0,00	0,00	8.944,94	0,00
9.010	de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1,00		0,00	0,00	3.859,06	3.859,06	0,00	0,00	0,00	3.859,06	0,00
9.011	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	un	1,00		0,00	0,00	2.883,47	2.883,47	0,00	0,00	0,00	2.883,47	0,00
9.012	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00		0,00	0,00	2.845,39	2.845,39	0,00	0,00	0,00	2.845,39	0,00
9.013	Rev 01	un	1,00		0,00	0,00	4.177,74	4.177,74	0,00	0,00	0,00	4.177,74	0,00
9.014	Equipamento de ginástica - paralela dupla - galvanizado - Rev 01	un	1,00		0,00	0,00	1.974,48	1.974,48	0,00	0,00	0,00	1.974,48	0,00
9.015	Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01	un	1,00		0,00	0,00	3.438,09	3.438,09	0,00	0,00	0,00	3.438,09	0,00
9.016	Equipamento de ginástica - barra fixa em tubo de ferro galv. ø=2", conjunto com 03 unidades, Sergipark ou similar	Un	1,00		0,00	0,00	2.068,85	2.068,85	0,00	0,00	0,00	2.068,85	0,00
10	**PERGOLADO**							**1.671,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.671,24**	**0,00**
10.001	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=10 a 13cm para confecção de pergolado (ref:obra Sergipetec)	m	45,00		0,00	0,00	17,26	776,70	0,00	0,00	0,00	776,70	0,00
10.002	Peça de eucalipto tratado, d= 10 a 13cm, L = 3,00m - Fornecimento	un	17,00		0,00	0,00	52,62	894,54	0,00	0,00	0,00	894,54	0,00
11	**PAISAGISMO**							**7.029,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.029,94**	**0,00**
11.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	138,25		0,00	0,00	25,37	3.507,40	0,00	0,00	0,00	3.507,40	0,00
11.002	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	un	70,00		0,00	0,00	46,05	3.223,50	0,00	0,00	0,00	3.223,50	0,00
11.003	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	8,00		0,00	0,00	37,38	299,04	0,00	0,00	0,00	299,04	0,00
12	**DIVERSOS**							**4.424,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.424,37**	**0,00**
12.001	Limpeza geral	m2	965,34		0,00	0,00	2,42	2.336,12	0,00	0,00	0,00	2.336,12	0,00
12.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00		0,00	0,00	2.088,25	2.088,25	0,00	0,00	0,00	2.088,25	0,00
13	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**							**11.004,35**	**0,00**	**1.394,91**	**1.394,91**	**9.609,44**	**12,68**
13.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	35,00		4,50	4,50	154,93	5.422,55	0,00	697,19	697,19	4.725,37	12,86
13.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	70,00		8,75	8,75	79,74	5.581,80	0,00	697,73	697,73	4.884,08	12,50
	TOTAL GERAL							**256.873,93**	**0,00**	**33.479,66**	**33.479,66**	**223.394,27**	**13,03**

CONSTRUTORA ROCHA LTDA

CONSTRUTORA ROCHA LTDA

MARIA GARDENIA ARAÚJO SILVA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 270439694-9

Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.
Data: __/__/_____

Aprovado para pagamento
Data: __/__/_____

Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEMÓRIA DE CÁLCULO

BM 01 30/06/2026

CONSTRUTORA ROCHA
SOLIDEZ E QUALIDADE

CONTRATO Nº	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO:
193/2026/PMI	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (REVITALIZAÇÃO PRAÇA POVOADO QUEIMADAS)
01	**SERVIÇOS PRELIMINARES**
1.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 = 3,00MX2,00: 6,00 M2
1.002	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto = 50,00 m+65,00 m+50,00m+20,00m+22,41m: 207,41m
02	**MOVIMENTAÇÕES DE SOLO**
2.001	Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023= 50,0 m2* 0,10m: 5,00 m3
2.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m= 102,42m²*1,0m:102,42m³
2.003	Destocamento de árvores de diâmetro de 0,15 a 0,30m= 8 und
2.004	Carga manual de material de 1ª categoria= 132,50m*1,00m*1,00m:132,50m³
2.005	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³: 198,756t*10km: 1.987,56 tkm
2.006	Colchão de areia= 100,00m*1,0m*0,10m:10,00m³
03	**DEMOLIÇÕES**
3.001	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023=43,64m*1,00m*1,00:43,64m³
3.002	Demolição de concreto manualmente:297,10m*1,00m*0,10m:29,71m³
3.003	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado=30m+40m+32,52m: 102,52m
3.004	Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)= 3 und
3.005	Carga manual de material de 1ª categoria= 917,10m*1,00m*0,10m:91,71m³
3.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³= 137,566t*10km:1375,66tkm
04	**PAVIMENTAÇÃO**
4.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x baseinferior x base superior x altura). af_01/2024=50 m+75m+25m+98m: 248m
4.002	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022=150m²*0,08m:12,00m³
10	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**
10.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares = 4,5 H
10.002	Mestre de obras com encargos complementares = 8,75 H

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA
Data: 24/08/2026 15:09:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Jose Arnaldo do N Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (REVITALIZAÇÃO PRAÇA POVOADO QUEIMADAS)	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 01	CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE
CONTRATADA: **CONSTRUTORA ROCHA LTDA**		**CONTRATO Nº: 193/2026**
CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE**		DATA: **30/06/2026**



PLACA DE OBRA


DEMOLIÇÃO


DESTOCAMENTO DE ARVORE


DEMOLIÇÃO


DEMOLIÇÃO


MEIO-FIO

ELABORADO POR: CONSTRUTORA ROCHA LTDA MARIA GARDÊNIA DE ALMEIDA SILVA ENGENHEIRA CIVIL CREA Nº 270435694-9	FISCALIZAÇÃO:	Observações:

José Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (REVITALIZAÇÃO PRAÇA POVOADO QUEIMADAS)	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 01	CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE
CONTRATADA: **CONSTRUTORA ROCHA LTDA**		**CONTRATO Nº: 193/2026**
CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE**		DATA: **30/06/2026**

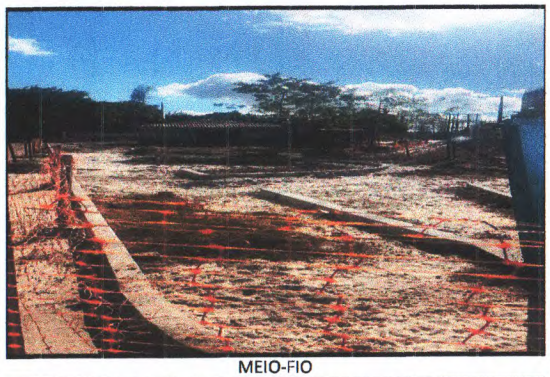

MEIO-FIO



EXECUÇÃO DE PASSEIO



EXECUÇÃO DE PASSEIO

BANCO CONCRETO

ELABORADO POR:	FISCALIZAÇÃO:	Observações:
CONSTRUTORA ROCHA LTDA MARIA GARDENIA ARAÚJO SILVA ENGENHEIRA CIVIL CREA Nº 270439694-9		

e Arnaldo do N Pereira Junior
Civil CREA - 2721031899
ador de Núcleo
de Itabaiana

Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana
