OBA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO (PRAÇA FRANCISCO BRAGANCA)								BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 260/2026/PMI				CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE								B.M.Nº. 01				ORDEM DE SERVIÇO: 03/08/2026					
								PERIODO: 03/08/2026 a 31/08/2026				DATA: 10/09/2026					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R$	VALORES R$				Saldo a Medir	% Medido				
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							3.139,13	0,00	3.139,13	3.139,13	0,00	100,00				
1.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	0,00	6,00	6,00	355,94	2.135,64	0,00	2.135,64	2.135,64	0,00	100,00				
1.002	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	36,53	0,00	36,53	36,53	27,47	1.003,48	0,00	1.003,48	1.003,48	0,00	100,00				
2	PAVIMENTAÇÃO							6.517,54	0,00	6.517,54	6.517,54	0,00	100,00				
2.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	55,26	0,00	55,26	55,26	44,38	2.452,44	0,00	2.452,44	2.452,44	0,00	100,00				
2.002	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022	m3	2,61	0,00	2,61	2,61	774,92	2.022,54	0,00	2.022,54	2.022,54	0,00	100,00				
2.003	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 16 faces, 11x22cm, e=8cm, 39un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	17,01	0,00	17,01	17,01	120,08	2.042,56	0,00	2.042,56	2.042,56	0,00	100,00				
3	ACESSIBILIDADE							416,48	0,00	416,48	416,48	0,00	100,00				
3.001	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	1,00	0,00	1,00	1,00	416,48	416,48	0,00	416,48	416,48	0,00	100,00				
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							10.756,05	0,00	10.756,05	10.756,05	0,00	100,00				
4.001	Poste ferro galvanizado 148mmx 10m, 02 braços, inclusive base sustentação	un	1,00	0,00	1,00	1,00	3.978,14	3.978,14	0,00	3.978,14	3.978,14	0,00	100,00				
4.002	Luminaria em Led p/	um	2,00	0,00	2,00	2,00	1.645,99	3.291,98	0,00	3.291,98	3.291,98	0,00	100,00				
4.003	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 1 1/4"	m	9,00	0,00	9,00	9,00	66,32	596,88	0,00	596,88	596,88	0,00	100,00				
4.004	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1 1/4"	un	2,00	0,00	2,00	2,00	68,97	137,94	0,00	137,94	137,94	0,00	100,00				
4.005	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	um	3,00	0,00	3,00	3,00	27,83	83,49	0,00	83,49	83,49	0,00	100,00				
4.006	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	m	20,00	0,00	20,00	20,00	3,75	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	100,00				
4.007	padrão Energisa	um	1,00	0,00	1,00	1,00	508,06	508,06	0,00	508,06	508,06	0,00	100,00				
4.007	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	um	1,00	0,00	1,00	1,00	18,27	18,27	0,00	18,27	18,27	0,00	100,00				
4.009	Rev 02 (10/2021)	um	1,00	0,00	1,00	1,00	41,79	41,79	0,00	41,79	41,79	0,00	100,00				
4.010	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"	um	1,00	0,00	1,00	1,00	5,83	5,83	0,00	5,83	5,83	0,00	100,00				
4.011	UT 25 VMA, inclusive execução de lábios poliméricos	um	1,00	0,00	1,00	1,00	15,83	15,83	0,00	15,83	15,83	0,00	100,00				
4.012	Contator LC1-D1810 - Telemecanick	um	1,00	0,00	1,00	1,00	369,68	369,68	0,00	369,68	369,68	0,00	100,00				
4.013	Disjuntor termomagnetico tripolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	2,00	0,00	2,00	2,00	102,54	205,08	0,00	205,08	205,08	0,00	100,00				
4.014	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	2,00	0,00	2,00	2,00	7,86	15,72	0,00	15,72	15,72	0,00	100,00				
4.015	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	20,00	0,00	20,00	20,00	10,57	211,40	0,00	211,40	211,40	0,00	100,00				
4.016	Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento	m	50,00	0,00	50,00	50,00	13,08	654,00	0,00	654,00	654,00	0,00	100,00				
4.017	Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento	un	17,00	0,00	17,00	17,00	2,32	39,44	0,00	39,44	39,44	0,00	100,00				
4.018	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	5,00	0,00	5,00	5,00	11,85	59,25	0,00	59,25	59,25	0,00	100,00				
4.019	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	5,00	0,00	5,00	5,00	12,31	61,55	0,00	61,55	61,55	0,00	100,00				
4.020	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af_02/2025	un	2,00	0,00	2,00	2,00	36,49	72,98	0,00	72,98	72,98	0,00	100,00				

CONSTRUTORA ROCHA LTDA

MARIA CAROLINA ARAUJO SILVA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 270439694-9

Jose Arnaldo do N. Pereira Junio
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Engª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO (PRAÇA FRANCISCO BRAGANCA)

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE

BOLETIM DE MEDIÇÃO

B.M.Nº. 01

PERIODO: 03/08/2026 a 31/08/2026

CONTRATO Nº 260/2026/PMI

ORDEM DE SERVIÇO: 03/08/2026

DATA: 10/09/2026

CONSTRUTORA ROCHA
SOLIDEZ E QUALIDADE

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R$	VALORES R$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		
4.021	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	2,00	0,00	2,00	2,00	156,87	313,74	0,00	313,74	313,74	0,00	100,00
5	**PINTURA**							**338,08**	**0,00**	**338,08**	**338,08**	**0,00**	**100,00**
5.001	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	16,72	0,00	16,72	16,72	20,22	338,08	0,00	338,08	338,08	0,00	100,00
6	**EQUIPAMENTOS DIVERSOS**							**1.685,11**	**0,00**	**1.685,11**	**1.685,11**	**0,00**	**100,00**
6.001	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	1,00	0,00	1,00	1,00	333,63	333,63	0,00	333,63	333,63	0,00	100,00
6.002	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	6,31	0,00	6,31	6,31	214,18	1.351,48	0,00	1.351,48	1.351,48	0,00	100,00
7	**PAISAGISMO**							**1.771,61**	**0,00**	**1.771,61**	**1.771,61**	**0,00**	**100,00**
7.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	10,00	0,00	10,00	10,00	25,37	253,70	0,00	253,70	253,70	0,00	100,00
7.002	Planta -Palmeira Imperial h=1,00m, fornecimento e plantio	un	1,00	0,00	1,00	1,00	793,93	793,93	0,00	793,93	793,93	0,00	100,00
7.003	Planta -ipê amarelol h=1,00m, fornecimento e plantio	un	2,00	0,00	2,00	2,00	81,64	163,28	0,00	163,28	163,28	0,00	100,00
7.004	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	15,00	0,00	15,00	15,00	37,38	560,70	0,00	560,70	560,70	0,00	100,00
8	**DIVERSOS**							**2.254,92**	**0,00**	**166,67**	**166,67**	**2.088,25**	**7,39**
8.001	Limpeza geral	m2	68,87	0,00	68,87	68,87	2,42	166,67	0,00	166,67	166,67	0,00	100,00
8.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	0,00	0,00	0,00	2.088,25	2.088,25	0,00	0,00	0,00	2.088,25	0,00
10	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**							**1.337,38**	**0,00**	**1.337,38**	**1.337,38**	**0,00**	**100,00**
10.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	4,00	0,00	4,00	4,00	154,93	619,72	0,00	619,72	619,72	0,00	100,00
10.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	9,00	0,00	9,00	9,00	79,74	717,66	0,00	717,66	717,66	0,00	100,00
	TOTAL GERAL							**28.216,29**	**0,00**	**26.128,04**	**26.128,04**	**2.088,25**	**92,60**

CONSTRUTORA ROCHA LTDA

CONSTRUTORA ROCHA LTDA

MARIA GARDÊNIA ARAÚJO SILVA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 270439694-9

Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.

Data: ___/___/_____

Aprovado para pagamento

Data: ___/___/_____

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031699
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEMÓRIA DE CÁLCULO 01

BM 01 02/03/2026

CONSTRUTORA ROCHA
SOLIDEZ E QUALIDADE

CONTRATO Nº:	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO:
260/2026/PMI	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (PRAÇA FRANCISCO BRAGANÇA)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES
01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 = 3M² X 2M²: 6M²
01.002	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1 20 com bloco de concreto = 15M+15M+6,53: 36,53M
2	PAVIMENTAÇÕES
2.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024=20M+20M+15,26M:55,26M
2.002	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022=26,101MX0,10MX1,00:2,61M³
2.003	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 16 faces, 11x22cm, e=8cm, 39un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.=7,01M²+5,00M²+5,00M²:17,01
3	ACESSIBILIDADE
03.001	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos= 1UND
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.001	Poste ferro galvanizado 148mmx 10m, 02 braços, inclusive base sustentação= 1 UM
4.002	Luminaria em Led p/ =2 UND
4.003	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 1 1/4"= 5 UND +4 UND : 9 UND
4.004	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1 1/4"= 2 UND
4.005	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento= 1 UN+2UN:3UN
4.006	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em nori= 10UND +10UND :20UND
4.007	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa= 1 UND
4.007	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m= 1 UND
4.009	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)= 1 UND
4.010	Cabeçote de alumínio de 1 1/4"= 1 UND
4.011	Fornecimento e execução de junta de dilatação JEENE JJ 2540 VV EPDM / UT 25 VMA, inclusive execução de lábios poliméricos= 1 UND
4.012	Contator LC1-D1810 - Telemecanick= 1 UND
4.013	Disjuntor termomagnetico tripolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)=2 UND
4.014	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")= 2 UND
4.015	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")= 10UND +10UND :20UND
4.016	Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento= 20 UND+20UND +10UND: 50UND
4.017	Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento= 10UND+5 UND+2 UND:17 UND
4.018	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023=2UND+ 3 UN: 5 UN
4.019	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023=2UND+ 3 UN: 5 UN
4.020	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af_02/2025= 1UN+1UN:2 UND
4.021	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m= 1UN+1UN:2 UND
5	PINTURA
5.001	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021= 5M²+10M²+1,72M²:16,72M²
6	EQUIPAMENTOS DIVERSOS
6.001	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar:1 UND
6.002	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos: 3,M+3,31M:6,31M
7	PAISAGISMO
7.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio= 5M²+5M²:10M²
7.002	Planta -Palmeira Imperial h=1,00m, fornecimento e plantio= 1 UM
7.003	Planta -ipê amarelol h=1,00m, fornecimento e plantio= 1UN+1UN:2UN
7.004	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais=5 UM+5UN+5UN:15UN
8	DIVERSOS
8.001	Limpeza geral: 25,00M²+25,00M²+18,87M²:68,87
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
10.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares = 4,00 H
10.002	Mestre de obras com encargos complementares = 9,00 H

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA
Data: 22/10/2026 11:36:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO (PRAÇA FRANCISCO BRAGANÇA)	**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 01**	CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE
CONTRATADA: **CONSTRUTORA ROCHA LTDA**		CONTRATO Nº: **260/2026**
CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE**		DATA: **10/09/2026**



PLACA DE OBRA


TAPUME


ASSENTAMENTO BLOCO CONCRETO


PASSEIO

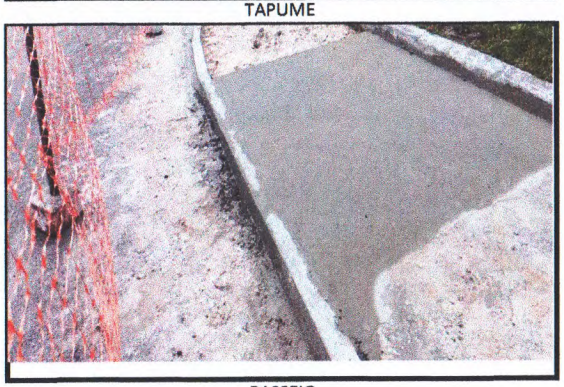
PASSEIO


PASSEIO

ELABORADO POR: CONSTRUTORA ROCHA LTDA MARIA GABRIELA ARAUJO SILVA ENGENHEIRA CIVIL CREA Nº 270439694-9	FISCALIZAÇÃO:	Observações:

Jose Arnaldo do N Pereira Jun.
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO (PRAÇA FRANCISCO BRAGANÇA)	**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 01**	CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE
CONTRATADA: **CONSTRUTORA ROCHA LTDA**		CONTRATO Nº: **260/2026**
CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE**		DATA: **10/09/2026**

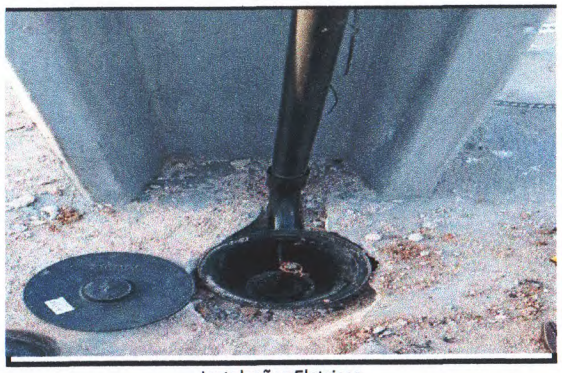

Instalações Eletricas



Instalações Eletricas



Paisagismo



Paisagismo

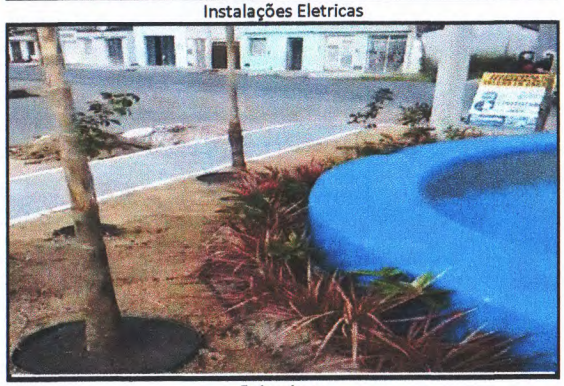

Paisagismo



Banco

ELABORADO POR:	FISCALIZAÇÃO:	Observações:
CONSTRUTORA ROCHA LTDA MARIA GARDENIA APOLLO SILVA ENGENHEIRA CIVIL CREA Nº 270439604-9		

José Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO (PRAÇA FRANCISCO BRAGANÇA)	**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 01**	CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE
CONTRATADA: **CONSTRUTORA ROCHA LTDA**		CONTRATO Nº: **260/2026**
CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE**		DATA: **10/09/2026**

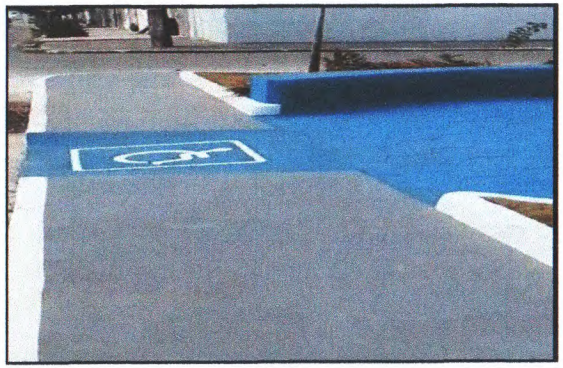

RAMPA

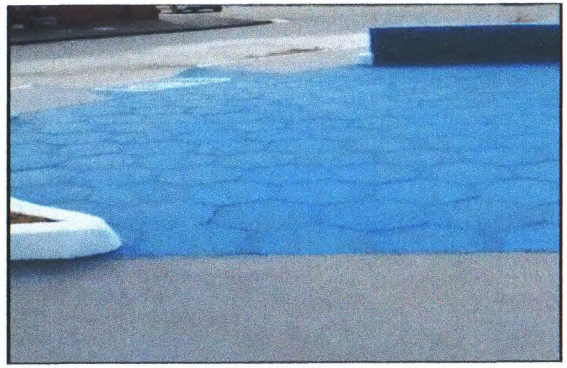

PINTURA



PINTURA

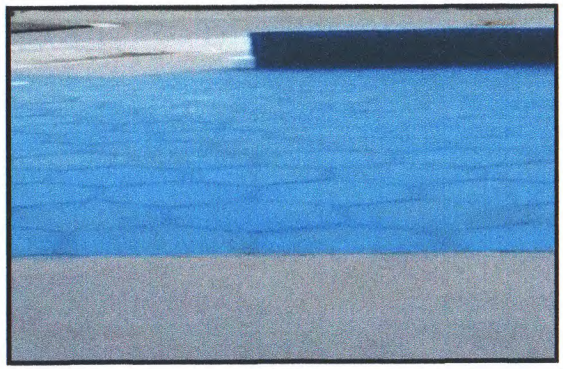

PINTURA



LIXEIRA

ELABORADO POR: CONSTRUTORA ROCHA LTDA MARIA CAROLINA ARAÚJO SILVA ENGENHEIRA CIVIL CREA Nº 270439694-9	FISCALIZAÇÃO:	Observações:

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana
