MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO					DATA DE INICIO: 21/01/2026			BOLETIM DE MEDIÇÃO 01							NOVATEC
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA															
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA					DATA DE TÉRMINO: 21/08/2026			PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026							CONTRATO 015/2026
								DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)							
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								R$ 95.642,60	R$ -	R$ 90.860,45	R$ 90.860,45	R$ 4.782,15	95,00%
01.01	Equipe Dirigente	UN	0,025		0,02375	0,02	0,00	R$ 1.667.154,61	R$ 41.678,87		R$ 39.594,92	R$ 39.594,92	R$ 2.083,95	95,00
01.02	Manutenção do Canteiro UNID	UN	0,25		0,2375	0,24	0,01	R$ 128.490,70	R$ 32.122,68		R$ 30.516,54	R$ 30.516,54	R$ 1.606,14	95,00
01.03	Equipamentos de Apoio à Produção	UN	0,25		0,2375	0,24	0,01	R$ 87.364,20	R$ 21.841,05		R$ 20.748,99	R$ 20.748,99	R$ 1.092,06	95,00
2	RUA CECÍLIA VIEIRA DOS SANTOS								R$ 248.468,84	R$ -	R$ 245.743,65	R$ 247.340,86	R$ 1.127,94	98,90%
2.01	Recapeamento asfáltico								R$ 247.602,93	R$ -	R$ 245.743,65	R$ 247.340,86	R$ 262,05	
02.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	2473,98		2473,98	2473,98	0,00	R$ 1,40	R$ 3.463,57		R$ 3.463,57	R$ 3.463,57	R$ -	100,00
02.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	2473,98		2473,98	2473,98	0,00	R$ 2,42	R$ 5.987,03		R$ 5.987,03	R$ 5.987,03	R$ -	100,00
02.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	2473,98		2473,98	2473,98	0,00	R$ 1,93	R$ 4.774,78		R$ 4.774,78	R$ 4.774,78	R$ -	100,00
02.01.004	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltic o de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	418,29		418,29		418,29	R$ 2,30	R$ 962,07		R$ 962,07	R$ 962,07	R$ -	100,00
02.01.005	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000L, em vai urbana pavimentada, adicional para excedente a 30 KM (Unidade: TxKM. Af_07/2020	txkm	890,63		602,66		890,63	R$ 0,91	R$ 810,47		R$ 548,42	R$ 548,42	R$ 262,05	67,67
02.01.006	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m³	123,70		123,70	123,70	0,00	R$ 1.750,10	R$ 216.487,37		R$ 216.487,37	R$ 216.487,37	R$ -	100,00
02.01.007	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	3711,00		3711,00	3711,00	0,00	R$ 2,89	R$ 10.724,79		R$ 10.724,79	R$ 10.724,79	R$ -	100,00
02.01.008	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	2474,00		2474,00	2474,00	0,00	R$ 1,13	R$ 2.795,62		R$ 2.795,62	R$ 2.795,62	R$ -	100,00
02.01.009	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em cami nhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020	T	296,88		296,88		296,88	R$ 5,38	R$ 1.597,21		R$ 1.597,21	R$ 1.597,21	R$ -	100,00
2.2	Limpeza								R$ 865,89	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 865,89	0,00%
02.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2473,98		0,00	0,00	2473,98	R$ 0,35	R$ 865,89		R$ -	R$ -	R$ 865,89	0,00
3	RUA MARIA ANGELINA SANTANA								R$ 233.883,22	R$ -	R$ 232.821,17	R$ 232.821,17	R$ 1.062,05	99,55%
3.01	Recapeamento asfáltico								R$ 233.067,92	R$ -	R$ 232.821,17	R$ 232.821,17	R$ 246,75	
03.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	2329,43		2329,43	2329,43	0,00	R$ 1,40	R$ 3.261,20		R$ 3.261,20	R$ 3.261,20	R$ -	100,00
03.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	2329,43		2329,43	2329,43	0,00	R$ 2,42	R$ 5.637,22		R$ 5.637,22	R$ 5.637,22	R$ -	100,00

Jose Arnaldo do N Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO					DATA DE INICIO: 21/01/2026			BOLETIM DE MEDIÇÃO 01						
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA					DATA DE TÉRMINO: 21/08/2026			PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026						
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026						CONTRATO 015/2026
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
03.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	2329,43		**2329,43**	2329,43	0,00	R$ 1,93	R$ 4.495,80		**R$ 4.495,80**	R$ 4.495,80	R$ -	100,00
03.01.004	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltic o de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm).	txkm	366,25		**366,25**	366,25	0,00	R$ 2,30	R$ 842,39		**R$ 842,39**	R$ 842,39	R$ -	100,00
03.01.005	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000L, em vai urbana pavimentada, adicional para excedente a 30 KM	txkm	838,59		**567,45**	567,45	271,14	R$ 0,91	R$ 763,12		**R$ 516,37**	R$ 516,37	R$ 246,75	67,67
03.01.006	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m³	116,47		**116,47**	116,47	0,00	R$ 1.750,10	R$ 203.834,15		**R$ 203.834,15**	R$ 203.834,15	R$ -	100,00
03.01.007	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	3494,10		**3494,10**	3494,10	0,01	R$ 2,89	R$ 10.097,95		**R$ 10.097,95**	R$ 10.097,95	R$ -	100,00
03.01.008	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	2329,40		**2329,40**	2329,40	0,00	R$ 1,13	R$ 2.632,22		**R$ 2.632,22**	R$ 2.632,22	R$ -	100,00
03.01.009	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em cami nhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020	T	279,53		**279,53**	279,53	0,00	R$ 5,38	R$ 1.503,87		**R$ 1.503,87**	R$ 1.503,87	R$ -	100,00
3.2	**Limpeza**								**R$ 815,30**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 815,30**	**0,00%**
03.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	2329,43		**0,00**	0,00	2329,43	R$ 0,35	R$ 815,30		**R$ -**	R$ -	R$ 815,30	0,00
4	**RUA ABILIO DE OLIVEIRA**								**R$ 310.085,81**	**R$ -**	**R$ 308.511,87**	**R$ 308.511,87**	**R$ 1.573,93**	**99,49%**
4.01	**Recapeamento asfáltico**								**R$ 309.008,11**	**R$ -**	**R$ 308.511,87**	**R$ 308.511,87**	**R$ 494,23**	
04.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	3084,85		**3084,85**	3084,85	0,00	R$ 1,40	R$ 4.318,79		**R$ 4.318,79**	R$ 4.318,79	R$ -	100,00
04.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	3084,85		**3084,85**	3084,85	0,00	R$ 2,42	R$ 7.465,34		**R$ 7.465,34**	R$ 7.465,34	R$ -	100,00
04.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	3084,85		**3084,85**	3084,85	0,00	R$ 1,93	R$ 5.953,76		**R$ 5.953,76**	R$ 5.953,76	R$ -	100,00
04.01.004	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltic o de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm).	txkm	638,21		**638,21**	638,21	0,00	R$ 2,30	R$ 1.467,87		**R$ 1.467,87**	R$ 1.467,87	R$ -	100,00
04.01.005	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000L, em vai urbana pavimentada, adicional para excedente a 30 KM	txkm	1110,55		**567,45**	567,45	543,10	R$ 0,91	R$ 1.010,60		**R$ 516,37**	R$ 516,37	R$ 494,23	51,10
04.01.006	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m³	154,24		**154,24**	154,24	0,00	R$ 1.750,10	R$ 269.939,80		**R$ 269.939,80**	R$ 269.939,80	R$ -	100,00

José Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO								DATA DE INICIO: 21/01/2026				BOLETIM DE MEDIÇÃO 01					
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA												PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026					
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE TÉRMINO: 21/08/2026				DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026					CONTRATO 015/2026
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)									
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido			
04.01.007	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	4627,20		**4627,20**	4627,20	0,01	R$ 2,89	R$ 13.372,61		**R$ 13.372,61**	R$ 13.372,61	R$ -	100,00			
04.01.008	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	3084,80		**3084,80**	3084,80	0,00	R$ 1,13	R$ 3.485,82		**R$ 3.485,82**	R$ 3.485,82	R$ -	100,00			
04.01.009	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em cami nhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020	T	370,17		**370,17**	370,17	0,00	R$ 5,38	R$ 1.991,51		**R$ 1.991,51**	R$ 1.991,51	R$ -	100,00			
4.2	**Limpeza**								**R$ 1.079,70**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 1.079,70**	**0,00%**			
04.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	3084,85		**0,00**	0,00	3084,85	R$ 0,35	R$ 1.079,70	R$ -	**R$ -**	R$ -	R$ 1.079,70	0,00			
5	**RUA PREFEITO VICENTE MACHADO DE MENEZES**								**R$ 296.684,96**	**R$ -**	**R$ 295.339,09**	**R$ 295.339,09**	**R$ 1.345,87**	**99,55%**			
5.01	**Recapeamento asfáltico**								**R$ 295.651,78**	**R$ -**	**R$ 295.339,09**	**R$ 295.339,09**	**R$ 312,69**				
05.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	2951,94		**2951,94**	2951,94	0,00	R$ 1,40	R$ 4.132,72		**R$ 4.132,72**	R$ 4.132,72	R$ -	100,00			
05.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	2951,94		**2951,94**	2951,94	0,00	R$ 2,42	R$ 7.143,69		**R$ 7.143,69**	R$ 7.143,69	R$ -	100,00			
05.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	2951,94		**2951,94**	2951,94	0,00	R$ 1,93	R$ 5.697,24		**R$ 5.697,24**	R$ 5.697,24	R$ -	100,00			
05.01.004	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltic o de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm).	txkm	590,36		**590,36**	590,36	0,00	R$ 2,30	R$ 1.357,82		**R$ 1.357,82**	R$ 1.357,82	R$ -	100,00			
05.01.005	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000L, em vai urbana pavimentada, adicional para excedente a 30 KM	txkm	1062,70		**719,09**	719,09	343,61	R$ 0,91	R$ 967,06		**R$ 654,37**	R$ 654,37	R$ 312,69	67,67			
05.01.006	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m³	147,60		**147,60**	147,60	0,00	R$ 1.750,10	R$ 258.314,76		**R$ 258.314,76**	R$ 258.314,76	R$ -	100,00			
05.01.007	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	4428,00		**4428,00**	4428,00	0,00	R$ 2,89	R$ 12.796,92		**R$ 12.796,92**	R$ 12.796,92	R$ -	100,00			
05.01.008	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	2952,00		**2952,00**	2952,00	0,00	R$ 1,13	R$ 3.335,76		**R$ 3.335,76**	R$ 3.335,76	R$ -	100,00			
05.01.009	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em cami nhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ /	T	354,24		**354,24**	354,24	0,00	R$ 5,38	R$ 1.905,81		**R$ 1.905,81**	R$ 1.905,81	R$ -	100,00			
5.2	**Limpeza**								**R$ 1.033,18**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 1.033,18**	**0,00%**			
05.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	2951,94		**0,00**	0,00	2951,94	R$ 0,35	R$ 1.033,18		**R$ -**	R$ -	R$ 1.033,18	0,00			
6	**RUA ONELIA OLIVEIRA DOS SANTOS/ RUA BERÍLIO LEITE**								**R$ 229.648,30**	**R$ -**	**R$ 228.605,42**	**R$ 228.605,42**	**R$ 1.042,90**	**99,55%**			
6.01	**Recapeamento asfáltico**								**R$ 228.847,71**	**R$ -**	**R$ 228.605,42**	**R$ 228.605,42**	**R$ 242,30**				

Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA 2221031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO					DATA DE INICIO: 21/01/2026			BOLETIM DE MEDIÇÃO 01						NOVATEC
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA								PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026						
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA					DATA DE TÉRMINO: 21/08/2026			DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026						CONTRATO 015/2026
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
06.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	2287,42		**2287,42**	2287,42	0,00	R$ 1,40	R$ 3.202,39		**R$ 3.202,39**	R$ 3.202,39	R$ -	100,00
06.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	2287,42		**2287,42**	2287,42	0,00	R$ 2,42	R$ 5.535,56		**R$ 5.535,56**	R$ 5.535,56	R$ -	100,00
06.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	2287,42		**2287,42**	2287,42	0,00	R$ 1,93	R$ 4.414,72		**R$ 4.414,72**	R$ 4.414,72	R$ -	100,00
06.01.004	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltic o de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm).	txkm	351,13		**351,13**	351,13	0,00	R$ 2,30	R$ 807,60		**R$ 807,60**	R$ 807,60	R$ -	100,00
06.01.005	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000L, em vai urbana pavimentada, adicional para excedente a 30 KM	txkm	823,47		**557,22**	557,22	266,26	R$ 0,91	R$ 749,36		**R$ 507,06**	R$ 507,06	R$ 242,30	67,67
06.01.006	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m³	114,37		**114,37**	114,37	0,00	R$ 1.750,10	R$ 200.160,69		**R$ 200.160,69**	R$ 200.160,69	R$ -	100,00
06.01.007	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	3431,10		**3431,10**	3431,10	0,00	R$ 2,89	R$ 9.915,88		**R$ 9.915,88**	R$ 9.915,88	R$ -	100,00
06.01.008	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	2287,40		**2287,40**	2287,40	0,00	R$ 1,13	R$ 2.584,76		**R$ 2.584,76**	R$ 2.584,76	R$ -	100,00
06.01.009	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em cami nhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020	T	274,49		**274,49**	274,49	0,00	R$ 5,38	R$ 1.476,76		**R$ 1.476,76**	R$ 1.476,76	R$ -	100,00
6.2	**Limpeza**								**R$ 800,60**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 800,60**	**0,00%**
06.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	2287,42		**0,00**	0,00	2287,42	R$ 0,35	R$ 800,60		**R$ -**	R$ -	R$ 800,60	0,00
7	**RUA GILMAR SANTOS COSTA**								**R$ 106.210,69**	**R$ -**	**R$ 105.730,58**	**R$ 105.730,58**	**R$ 480,15**	**99,55%**
7.01	**Recapeamento asfáltico**								**R$ 105.842,12**	**R$ -**	**R$ 105.730,58**	**R$ 105.730,58**	**R$ 111,56**	
07.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	1053,10		**1053,10**	1053,10	0,00	R$ 1,40	R$ 1.474,34		**R$ 1.474,34**	R$ 1.474,34	R$ -	100,00
07.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	1053,10		**1053,10**	1053,10	0,00	R$ 2,42	R$ 2.548,50		**R$ 2.548,50**	R$ 2.548,50	R$ -	100,00
07.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	1053,10		**1053,10**	1053,10	0,00	R$ 1,93	R$ 2.032,48		**R$ 2.032,48**	R$ 2.032,48	R$ -	100,00
07.01.004	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltic o de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm).	txkm	379,12		**379,12**	379,12	0,00	R$ 2,30	R$ 871,97		**R$ 871,97**	R$ 871,97	R$ -	100,00
07.01.005	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000L, em vai urbana pavimentada, adicional para excedente a 30 KM	txkm	379,12		**256,54**	256,54	122,59	R$ 0,91	R$ 345,00		**R$ 233,44**	R$ 233,44	R$ 111,56	67,66
07.01.006	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m³	52,66		**52,66**	52,66	0,00	R$ 1.750,10	R$ 92.151,52		**R$ 92.151,52**	R$ 92.151,52	R$ -	100,00

Jose Arnaldo do N Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO					DATA DE INICIO: 21/01/2026			BOLETIM DE MEDIÇÃO 01							NOVATEC
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA					DATA DE TÉRMINO: 21/08/2026			PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026							
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026							CONTRATO 015/2026
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)							
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
07.01.007	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	1579,50		**1579,50**	1579,50	0,00	R$ 2,89	R$ 4.564,76		**R$ 4.564,76**	R$ 4.564,76	R$ -	100,00
07.01.008	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	1053,00		**1053,00**	1053,00	0,00	R$ 1,13	R$ 1.189,89		**R$ 1.189,89**	R$ 1.189,89	R$ -	100,00
07.01.009	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em cami nhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020	T	123,36		**123,36**	123,36	0,00	R$ 5,38	R$ 663,68		**R$ 663,68**	R$ 663,68	R$ -	100,00
7.2	**Limpeza**								**R$ 368,59**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 368,59**	**0,00%**
07.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	1053,10			0,00	1053,10	R$ 0,35	R$ 368,59		**R$ -**	R$ -	R$ 368,59	0,00
8	**RUA JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA**								**R$ 427.768,02**	**R$ -**	**R$ 425.824,74**	**R$ 425.824,74**	**R$ 1.943,28**	**99,55%**
8.01	**Recapeamento asfáltico**								**R$ 426.276,23**	**R$ -**	**R$ 425.824,74**	**R$ 425.824,74**	**R$ 451,48**	
08.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	4262,28		**4262,28**	4262,28	0,00	R$ 1,40	R$ 5.967,19		**R$ 5.967,19**	R$ 5.967,19	R$ -	100,00
08.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	4262,28		**4262,28**	4262,28	0,00	R$ 2,42	R$ 10.314,72		**R$ 10.314,72**	R$ 10.314,72	R$ -	100,00
08.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	4262,28		**4262,28**	4262,28	0,00	R$ 1,93	R$ 8.226,20		**R$ 8.226,20**	R$ 8.226,20	R$ -	100,00
08.01.004	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltic o de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm).	txkm	589,74		**589,74**	589,74	0,00	R$ 2,30	R$ 1.356,40		**R$ 1.356,40**	R$ 1.356,40	R$ -	100,00
08.01.005	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000L, em vai urbana pavimentada, adicional para excedente a 30 KM	txkm	1534,42		**1038,29**	1038,29	496,13	R$ 0,91	R$ 1.396,32		**R$ 944,84**	R$ 944,84	R$ 451,48	67,67
08.01.006	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m³	213,11		**213,11**	213,11	0,00	R$ 1.750,10	R$ 372.970,81		**R$ 372.970,81**	R$ 372.970,81	R$ -	100,00
08.01.007	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	6393,30		**6393,30**	6393,30	0,00	R$ 2,89	R$ 18.476,64		**R$ 18.476,64**	R$ 18.476,64	R$ -	100,00
08.01.008	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	4262,20		**4262,20**	4262,20	0,00	R$ 1,13	R$ 4.816,29		**R$ 4.816,29**	R$ 4.816,29	R$ -	100,00
08.01.009	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em cami nhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ /	T	511,46		**511,46**	511,46	0,00	R$ 5,38	R$ 2.751,65		**R$ 2.751,65**	R$ 2.751,65	R$ -	100,00
8.2	**Limpeza**								**R$ 1.491,80**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 1.491,80**	**0,00%**
08.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	4262,28		**0,00**	0,00	4262,28	R$ 0,35	R$ 1.491,80		**R$ -**	R$ -	R$ 1.491,80	0,00
9	**SINALIZAÇÃO**								**R$ 112.077,42**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 112.077,42**	**0,00%**
9.01.001	Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo i por extrusão - relevo duplo com base	m²	568,24		**0,00**	0,00	568,24	124,91	R$ 70.978,85		**R$ -**	R$ -	R$ 70.978,85	0,00

Jose Arnaldo da N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO									DATA DE INICIO: 21/01/2026			BOLETIM DE MEDIÇÃO 01				NOVATEC
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA									DATA DE TÉRMINO: 21/08/2026			PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026				
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA												DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026				CONTRATO 015/2026
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES						VALORES (R$)							
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido		
9.01.002	Pintura de faixa com plástico a frio tricomponente à base de resinas metacrílicas por aspersão - espessura de 0,6 mm	m²	443,70		**0,00**	0,00	443,70	78,99	R$ 35.047,86		**R$ -**	R$ -	R$ 35.047,86	0,00		
9.01.003	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	6,00		**0,00**	0,00	6,00	505,09	R$ 3.030,55		**R$ -**	R$ -	R$ 3.030,55	0,00		
9.01.004	Fornecimento e instalação de suporte de madeira para placas de si nalização, em solo, com h= de 2,0 m e seção de 7,5 x 7,5 cm. af_0	UN	24,00		**0,00**	0,00	24,00	125,84	R$ 3.020,16		**R$ -**	R$ -	R$ 3.020,16	0,00		
10	**PROJETO**								**R$ 5.221,52**	**R$ -**	**R$ 5.221,52**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**		
10.01.001	Projeto Executivo	km	0,31		**0,3104018**	0,31	0,00	16.836,00	R$ 5.221,52		**R$ 5.221,52**	R$ 5.221,52	R$ -	100,00		
TOTAL DO ORÇAMENTO									**R$ 2.065.691,38**	**R$ -**	**R$ 1.940.255,70**	**R$ 1.940.255,70**	**R$ 125.435,68**	**93,92%**		
										0,00%	**93,92%**	**93,92%**	**6,08%**			

VALOR DA MEDIÇÃO: R$ 1.940.255,70 (Um milhão, novecentos e quarenta mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos).

ASSINATURA RESPONSÁVEL TÉCNICO

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.02.24 13:18:04 -03'00'

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

gov.br

Documento assinado digitalmente
RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJ
Data: 25/02/2026 08:18:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DATA LIBERAÇÃO : _____/_____/_____

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026

DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO			UND	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
01.01	Equipe Dirigente			QUANT CONTRATO	QUANT MEDIDA
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
VALOR TOTAL DO CONTRATO (A)		VALOR MEDIDO S/ ADM (B)	=B/A		
R$ 2.065.691,38		R$ 1.970.048,79	0,95	0,025	0,02375
EXECUTADO NO PERÍODO:					0,02375
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					0,02375
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)					0,001
A MEDIR NO PERÍODO:					0,02375

José Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026

DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO			UND	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
01.02	Manutenção do Canteiro UNID			QUANT CONTRATO	QUANT MEDIDA
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
VALOR TOTAL DO CONTRATO (A)		VALOR MEDIDO S/ ADM (B)	=B/A		
R$ 2.065.691,38		R$ 1.970.048,79	0,95	0,25	0,2375
EXECUTADO NO PERÍODO:					0,238
ACUMULADO ANTERIOR:					0,000
ACUMULADO ATUAL:					0,238
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)					0,013
A MEDIR NO PERÍODO:					0,2375

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026

DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO			UND	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
01.03	Equipamentos de Apoio à Produção			QUANT CONTRATO	QUANT MEDIDA
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
VALOR TOTAL DO CONTRATO (A)		VALOR MEDIDO S/ ADM (B)	=B/A		
R$ 2.065.691,38		R$ 1.970.048,79	0,95	0,25	0,2375
EXECUTADO NO PERÍODO:					0,2375
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					0,2375
SALDO DO CONTRATO					0,01
A MEDIR NO PERÍODO:					0,2375

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026

DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
2	RUA CECILIA VIEIRA DOS SANTOS		
02.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	ÁREA
	RUA CECÍLIA VIEIRA DOS SANTOS		
De acordo com o projeto topográfico		2.473,98	2.473,98
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	2.473,98
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			2.473,98
SALDO DO CONTRATO:			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			2.473,98

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026

DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
2	RUA CECILIA VIEIRA DOS SANTOS		
02.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	ÁREA
RUA CECÍLIA VIEIRA DOS SANTOS			
De acordo com o projeto topográfico		2.473,98	2473,98
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	2.473,98
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			2.473,98
SALDO DO CONTRATO:			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			2.473,98

José Arnaldo de M. Ferreira Junior
Eng. Civil CREA 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026

DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
2	RUA CECILIA VIEIRA DOS SANTOS		
02.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	ÁREA
RUA CECÍLIA VIEIRA DOS SANTOS			2.473,98
De acordo com o projeto topográfico		2.473,98	2473,98
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	2.473,98
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			2.473,98
SALDO DO CONTRATO:			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			2.473,98

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026

DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND			
2	RUA CECÍLIA VIEIRA DOS SANTOS				
02.01.004	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltic o de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	Área (m²)	taxa	DMT	txkm
RUA CECÍLIA VIEIRA DOS SANTOS					
PINTURA DE LIGAÇÃO		1.161,92	0,012	30,0	418,29
EXECUTADO NO PERÍODO:					418,29
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					418,29
SALDO DO CONTRATO:					0,00
ADITIVO:					418,29

José Arnaldo de N Pereira Junior
Eng. Civil CREA: 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026

DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND			
2	RUA CECÍLIA VIEIRA DOS SANTOS				
02.01.005	transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	Área (m²)	taxa	DMT	txkm
RUA CECÍLIA VIEIRA DOS SANTOS					
PINTURA DE LIGAÇÃO		2.473,98	0,012	20,3	602,66
EXECUTADO NO PERÍODO:					602,66
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					602,66
SALDO DO CONTRATO:					0,00
ADITIVO:					602,66

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026

DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	
2	RUA CECÍLIA VIEIRA DOS SANTOS		
02.01.006	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019		
	ÁREA (m²)	ESP. (m)	ONCRETO ASFÁLTICO (m
Camada	2.473,98	0,05	123,70
EXECUTADO NO PERÍODO:		0,00	123,70
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			123,70
SALDO DO CONTRATO			0.00
A MEDIR NO PERÍODO:			123,70

José Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026
DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND		
2	RUA CECÍLIA VIEIRA DOS SANTOS			
02.01.007	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
		m³	Km	(m³XKm)
Camada		123,70	30	3711,00
EXECUTADO NO PERÍODO:				3.711,00
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				3.711,00
SALDO DO CONTRATO				0,00
A MEDIR NO PERÍODO:				3.711,00

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026

DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
2	RUA CECÍLIA VIEIRA DOS SANTOS			
02.01.008	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
	RUA CECÍLIA VIEIRA DOS SANTOS	m³	Km	(m³XKm)
	Camada	123,70	20	2474,00
EXECUTADO NO PERÍODO:				2.474,00
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				2.474,00
SALDO DO CONTRATO				0,00
À MEDIR NO PERÍODO:				2.474,00

Jose Arnaldo do N Pereira Junior
Eng. Civil CREA 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026

DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
2	RUA CECÍLIA VIEIRA DOS SANTOS			
02.01.009	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em cami nhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DENSIDADE	QUANTIDADE TOTAI
	RUA CECÍLIA VIEIRA DOS SANTOS	m³		T
	Camada	123,70	2,4	296,88
EXECUTADO NO PERÍODO:				296,88
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				296,88
SALDO DO CONTRATO				0,00
À MEDIR NO PERÍODO:				296,88

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026

DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
3	RUA MARIA ANGELINA SANTANA		
03.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	ÁREA
	RUA MARIA ANGELINA SANTANA		
De acordo com o projeto topográfico		2.329,43	2.329,43
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	2.329,43
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			2.329,43
SALDO DO CONTRATO:			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			2.329,43

Jose Arnaldo de M. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026

DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
3	RUA MARIA ANGELINA SANTANA		
03.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	ÁREA
	RUA MARIA ANGELINA SANTANA		
De acordo com o projeto topográfico		2.329,43	2329,43
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	2.329,43
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			2.329,43
SALDO DO CONTRATO:			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			2.329,43

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026

DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
3	RUA MARIA ANGELINA SANTANA		
03.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	ÁREA
RUA MARIA ANGELINA SANTANA			2.329,43
De acordo com o projeto topográfico		2.329,43	2329,43
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	2.329,43
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			2.329,43
SALDO DO CONTRATO:			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			2.329,43

José Arnaldo de M. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador do Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026

DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND			
3	RUA MARIA ANGELINA SANTANA				
03.01.004	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltic o de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	Área (m²)	taxa	DMT	txkm
RUA MARIA ANGELINA SANTANA					
PINTURA DE LIGAÇÃO		1.017,36	0,012	30,0	366,25
EXECUTADO NO PERÍODO:					366,25
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					366,25
SALDO DO CONTRATO:					0,00
ADITIVO:					366,25

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026

DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND			
3	RUA MARIA ANGELINA SANTANA				
03.01.005	transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	Área (m²)	taxa	DMT	txkm
	RUA MARIA ANGELINA SANTANA				
PINTURA DE LIGAÇÃO		2.329,43	0,012	20,3	567,45
EXECUTADO NO PERÍODO:					567,45
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					567,45
SALDO DO CONTRATO:					0,00
ADITIVO:					567,45

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026

DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
3	RUA MARIA ANGELINA SANTANA		
03.01.006	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019		
		ÁREA (m²)	ESP. (m)	ONCRETO ASFÁLTICO (m
Camada		2.329,43	0,05	116,47
EXECUTADO NO PERÍODO:			0,00	116,47
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				116,47
SALDO DO CONTRATO				0,00
A MEDIR NO PERÍODO:				116,47

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026
DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
3	RUA MARIA ANGELINA SANTANA			
03.01.007	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
		m³	Km	(m³XKm)
Camada		116,47	30	3494,10
EXECUTADO NO PERÍODO:				3.494,10
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				3.494,10
SALDO DO CONTRATO				0,00
A MEDIR NO PERÍODO:				3.494,10

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026

DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
3	RUA MARIA ANGELINA SANTANA			
03.01.008	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
RUA MARIA ANGELINA SANTANA		m³	Km	(m³XKm)
Camada		116,47	20	2329,40
EXECUTADO NO PERÍODO:				2.329,40
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				2.329,40
SALDO DO CONTRATO				0,00
A MEDIR NO PERÍODO:				2.329,40

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026

DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
3	RUA MARIA ANGELINA SANTANA			
03.01.009	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em cami nhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DENSIDADE	QUANTIDADE TOTAI
	RUA MARIA ANGELINA SANTANA	m³		T
	Camada	116,47	2,4	279,53
EXECUTADO NO PERÍODO:				279,53
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				279,53
SALDO DO CONTRATO				0,00
A MEDIR NO PERÍODO:				279,53

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2121031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026

DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
4	RUA ABILIO DE OLIVEIRA		
04.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	ÁREA
	RUA ABILIO DE OLIVEIRA		
De acordo com o projeto topográfico		3.084,85	3.084,85
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	3.084,85
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			3.084,85
SALDO DO CONTRATO:			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			3.084,85

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026

DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
4	RUA ABILIO DE OLIVEIRA		
04.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	ÁREA
	RUA ABILIO DE OLIVEIRA		
De acordo com o projeto topográfico		3.084,85	3084,85
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	3.084,85
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			3.084,85
SALDO DO CONTRATO:			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			3.084,85

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026

DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
4	RUA ABILIO DE OLIVEIRA		
04.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	ÁREA
	RUA ABILIO DE OLIVEIRA		3.084,85
De acordo com o projeto topográfico		3.084,85	3084,85
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	3.084,85
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			3.084,85
SALDO DO CONTRATO:			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			3.084,85

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026

DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND			
4	RUA ABILIO DE OLIVEIRA				
04.01.004	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltic o de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	Área (m²)	taxa	DMT	txkm
RUA ABILIO DE OLIVEIRA					
PINTURA DE LIGAÇÃO		1.772,80	0,012	30,0	638,21
EXECUTADO NO PERÍODO:					638,21
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					638,21
SALDO DO CONTRATO:					0,00
ADITIVO:					638,21

Jose Arnaldo de N Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026

DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND			
4	RUA ABILIO DE OLIVEIRA				
04.01.005	transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	Área (m²)	taxa	DMT	txkm
RUA ABILIO DE OLIVEIRA					
PINTURA DE LIGAÇÃO		2.329,43	0,0120000	20,3	567,45
EXECUTADO NO PERÍODO:					567,45
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					567,45
SALDO DO CONTRATO:					0,00
ADITIVO:					567,45

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026

DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
4	RUA ABILIO DE OLIVEIRA		
04.01.006	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019		
	ÁREA (m²)	ESP. (m)	ONCRETO ASFÁLTICO (m
Camada	3.084,85	0,05	154,24
EXECUTADO NO PERÍODO:		0,00	154,24
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			154,24
SALDO DO CONTRATO			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			154,24

José Arnaldo de M Teixeira
Eng. Civil CREA - 27210
Coordenador de N
Prefeitura Municipal de

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026
DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
4	RUA ABILIO DE OLIVEIRA			
04.01.007	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
		m³	Km	(m³XKm)
Camada		154,24	30	4627,20
EXECUTADO NO PERÍODO:				4.627,20
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				4.627,20
SALDO DO CONTRATO				0,00
A MEDIR NO PERÍODO:				4.627,20

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026

DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
4	RUA ABILIO DE OLIVEIRA			
04.01.008	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
	RUA ABILIO DE OLIVEIRA	m³	Km	(m³XKm)
	Camada	154,24	20	3084,80
EXECUTADO NO PERÍODO:				3.084,80
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				3.084,80
SALDO DO CONTRATO				0,00
A MEDIR NO PERÍODO:				3.084,80

Jose Arnaldo do N Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026

DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
4	RUA ABILIO DE OLIVEIRA			
04.01.009	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em cami nhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DENSIDADE	QUANTIDADE TOTAI
	RUA ABILIO DE OLIVEIRA	m³		T
	Camada	154,24	2,4	370,17
EXECUTADO NO PERÍODO:				370,17
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				370,17
SALDO DO CONTRATO				0,00
A MEDIR NO PERÍODO:				370,17

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026

DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
5	RUA PREFEITO VICENTE MACHADO DE MENEZES		
05.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	ÁREA
	RUA PREFEITO VICENTE MACHADO DE MENEZES		
De acordo com o projeto topográfico		2.951,94	2.951,94
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	2.951,94
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			2.951,94
SALDO DO CONTRATO:			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			2.951,94

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026

DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
5	RUA PREFEITO VICENTE MACHADO DE MENEZES		
05.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	ÁREA
	RUA PREFEITO VICENTE MACHADO DE MENEZES		
De acordo com o projeto topográfico		2.951,94	2951,94
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	2.951,94
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			2.951,94
SALDO DO CONTRATO:			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			2.951,94

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026

DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
5	RUA PREFEITO VICENTE MACHADO DE MENEZES		
05.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	ÁREA
RUA PREFEITO VICENTE MACHADO DE MENEZES			2.951,94
De acordo com o projeto topográfico		2.951,94	2951,94
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	2.951,94
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			2.951,94
SALDO DO CONTRATO:			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			2.951,94

José Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026

DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND			
5	RUA PREFEITO VICENTE MACHADO DE MENEZES				
05.01.004	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltic o de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	Área (m²)	taxa	DMT	txkm
RUA PREFEITO VICENTE MACHADO DE MENEZES					
PINTURA DE LIGAÇÃO		1.639,89	0,012	30,0	590,36
EXECUTADO NO PERÍODO:					590,36
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					590,36
SALDO DO CONTRATO:					0,00
ADITIVO:					590,36

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026

DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND			
5	RUA PREFEITO VICENTE MACHADO DE MENEZES				
05.01.005	transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	Área (m²)	taxa	DMT	txkm
	RUA PREFEITO VICENTE MACHADO DE MENEZES				
PINTURA DE LIGAÇÃO		2.951,94	0,012	20,3	719,09
EXECUTADO NO PERÍODO:					719,09
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					719,09
SALDO DO CONTRATO:					0,00
ADITIVO:					719,09

Jose Arnaldo do N Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026

DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
5	RUA PREFEITO VICENTE MACHADO DE MENEZES		
05.01.006	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019		
	ÁREA (m²)	ESP. (m)	ONCRETO ASFÁLTICO (m
Camada	2.951,94	0,05	147,60
EXECUTADO NO PERÍODO:		0,00	147,60
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			147,60
SALDO DO CONTRATO			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			147,60

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026
DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
5	RUA PREFEITO VICENTE MACHADO DE MENEZES			
05.01.007	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
		m³	Km	(m³XKm)
	Camada	147,60	30	4428,00
EXECUTADO NO PERÍODO:				4.428,00
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				4.428,00
SALDO DO CONTRATO				0,00
À MEDIR NO PERÍODO:				4.428,00

Jose Arnaldo do N Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026

DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
5	RUA PREFEITO VICENTE MACHADO DE MENEZES			
05.01.008	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
	RUA PREFEITO VICENTE MACHADO DE MENEZES	m³	Km	(m³XKm)
	Camada	147,60	20	2952,00
EXECUTADO NO PERÍODO:				2.952,00
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				2.952,00
SALDO DO CONTRATO				0,00
À MEDIR NO PERÍODO:				2.952,00

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026

DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
5	RUA PREFEITO VICENTE MACHADO DE MENEZES			
05.01.009	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em cami nhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DENSIDADE	QUANTIDADE TOTAI
	RUA PREFEITO VICENTE MACHADO DE MENEZES	m³		T
	Camada	147,60	2,4	354,24
EXECUTADO NO PERÍODO:				354,24
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				354,24
SALDO DO CONTRATO				0,00
À MEDIR NO PERÍODO:				354,24

José Arnaldo de V. Pereira Jú
Eng. Civil CREA - 272031
Coordenador de Nucle
Prefeitura Municipal de Itab

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026

DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
6	RUA ONELIA OLIVEIRA DOS SANTOS/ RUA BERÍLIO LEITE		
06.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	ÁREA
	RUA ONELIA OLIVEIRA DOS SANTOS/ RUA BERÍLIO LEITE		
De acordo com o projeto topográfico		2.287,42	2.287,42
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	2.287,42
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			2.287,42
SALDO DO CONTRATO:			0,00
À MEDIR NO PERÍODO:			2.287,42

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026

DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	AREA
6	RUA ONELIA OLIVEIRA DOS SANTOS/ RUA BERÍLIO LEITE		
06.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	ÁREA
	RUA ONELIA OLIVEIRA DOS SANTOS/ RUA BERÍLIO LEITE		
De acordo com o projeto topográfico		2.287,42	2287,42
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	2.287,42
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			2.287,42
SALDO DO CONTRATO:			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			2.287,42

Jose Arnaldo de N Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026

DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	AREA
6	RUA ONELIA OLIVEIRA DOS SANTOS/ RUA BERÍLIO LEITE		
06.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	ÁREA
	RUA ONELIA OLIVEIRA DOS SANTOS/ RUA BERÍLIO LEITE		2.287,42
De acordo com o projeto topográfico		2.287,42	2287,42
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	2.287,42
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			2.287,42
SALDO DO CONTRATO:			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			2.287,42

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026

DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND			
6	RUA ONELIA OLIVEIRA DOS SANTOS/ RUA BERÍLIO LEITE				
06.01.004	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltic o de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	Área (m²)	taxa	DMT	txkm
	RUA ONELIA OLIVEIRA DOS SANTOS/ RUA BERÍLIO LEITE				
PINTURA DE LIGAÇÃO		975,36	0,012	30,0	351,13
EXECUTADO NO PERÍODO:					351,13
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					351,13
SALDO DO CONTRATO:					0,00
ADITIVO:					351,13

Jose Arnaldo de N Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026

DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND			
6	RUA ONELIA OLIVEIRA DOS SANTOS/ RUA BERÍLIO LEITE				
06.01.005	transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	Área (m²)	taxa	DMT	txkm
	RUA ONELIA OLIVEIRA DOS SANTOS/ RUA BERÍLIO LEITE				
PINTURA DE LIGAÇÃO		2.287,42	0,012	20,3	557,22
EXECUTADO NO PERÍODO:					557,22
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					557,22
SALDO DO CONTRATO:					0,00
ADITIVO:					557,22

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026

DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
6	RUA ONELIA OLIVEIRA DOS SANTOS/ RUA BERÍLIO LEITE		
06.01.006	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019		
	ÁREA (m²)	ESP. (m)	ONCRETO ASFÁLTICO (m
Camada	2.287,42	0,05	114,37
EXECUTADO NO PERÍODO:		0,00	114,37
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			114,37
SALDO DO CONTRATO			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			114,37

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026
DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
6	RUA ONELIA OLIVEIRA DOS SANTOS/ RUA BERÍLIO LEITE			
06.01.007	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
		m³	Km	(m³XKm)
Camada		114,37	30	3431,10
EXECUTADO NO PERÍODO:				3.431,10
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				3.431,10
SALDO DO CONTRATO				0,00
A MEDIR NO PERÍODO:				3.431,10

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026

DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
6	RUA ONELIA OLIVEIRA DOS SANTOS/ RUA BERÍLIO LEITE			
06.01.008	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
RUA ONELIA OLIVEIRA DOS SANTOS/ RUA BERÍLIO LEITE		m³	Km	(m³XKm)
Camada		114,37	20	2287,40
EXECUTADO NO PERÍODO:				2.287,40
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				2.287,40
SALDO DO CONTRATO				0,00
A MEDIR NO PERÍODO:				2.287,40

Jose Arnaldo de N Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026

DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
6	RUA ONELIA OLIVEIRA DOS SANTOS/ RUA BERÍLIO LEITE			
06.01.009	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em cami nhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DENSIDADE	QUANTIDADE TOTAI
RUA ONELIA OLIVEIRA DOS SANTOS/ RUA BERÍLIO LEITE		m³		T
Camada		114,37	2,4	274,49
EXECUTADO NO PERÍODO:				274,49
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				274,49
SALDO DO CONTRATO				0,00
A MEDIR NO PERÍODO:				274,49

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026

DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	AREA
7	RUA GILMAR SANTOS COSTA		
07.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	ÁREA
	RUA GILMAR SANTOS COSTA		
De acordo com o projeto topográfico		1.053,10	1.053,10
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	1.053,10
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			1.053,10
SALDO DO CONTRATO:			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			1.053,10

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA: 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026
DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	AREA
7	RUA GILMAR SANTOS COSTA		
07.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	ÁREA
	RUA GILMAR SANTOS COSTA		
De acordo com o projeto topográfico		1.053,10	1053,10
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	1.053,10
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			1.053,10
SALDO DO CONTRATO:			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			1.053,10

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026
DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
7	RUA GILMAR SANTOS COSTA		
07.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	ÁREA
RUA GILMAR SANTOS COSTA			1.053,10
De acordo com o projeto topográfico		1.053,10	1053,10
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	1.053,10
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			1.053,10
SALDO DO CONTRATO:			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			1.053,10

José Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026
DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND			
7	RUA GILMAR SANTOS COSTA				
07.01.004	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltic o de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	Área (m²)	taxa	DMT	txkm
RUA GILMAR SANTOS COSTA					
PINTURA DE LIGAÇÃO		1.053,10	0,012	30,0	379,12
EXECUTADO NO PERÍODO:					379,12
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					379,12
SALDO DO CONTRATO:					0,00
ADITIVO:					379,12

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026
DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND			
7	RUA GILMAR SANTOS COSTA				
07.01.005	transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	Área (m²)	taxa	DMT	txkm
	RUA GILMAR SANTOS COSTA				
PINTURA DE LIGAÇÃO		1.053,10	0,012	20,3	256,54
EXECUTADO NO PERÍODO:					256,54
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					256,54
SALDO DO CONTRATO:					0,00
ADITIVO:					256,54

Jose Arnaldo do N. Pereira Jun.
Eng. Civil/CREA - 272103
Coordenador de Nucle
Prefeitura Municipal de Itab

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026
DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
7	RUA GILMAR SANTOS COSTA		
07.01.006	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019		
	ÁREA (m²)	ESP. (m)	ONCRETO ASFÁLTICO (m
Camada	1.053,10	0,05	52,66
EXECUTADO NO PERÍODO:		0,00	52,66
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			52,66
SALDO DO CONTRATO			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			52,66

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026
DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
7	RUA GILMAR SANTOS COSTA			
07.01.007	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
		m³	Km	(m³XKm)
	Camada	52,66	30	1579,50
EXECUTADO NO PERÍODO:				1.579,50
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				1.579,50
SALDO DO CONTRATO				0,00
A MEDIR NO PERÍODO:				1.579,50

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026
DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
7	RUA GILMAR SANTOS COSTA			
07.01.008	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
RUA GILMAR SANTOS COSTA		m³	Km	(m³XKm)
	Camada	52,66	20	1053,00
EXECUTADO NO PERÍODO:				1.053,00
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				1.053,00
SALDO DO CONTRATO				0,00
A MEDIR NO PERÍODO:				1.053,00

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026
DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
7	RUA GILMAR SANTOS COSTA			
07.01.009	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em cami nhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DENSIDADE	QUANTIDADE TOTAI
	RUA GILMAR SANTOS COSTA	m³		T
	Camada	52,66	2,4	123,36
EXECUTADO NO PERÍODO:				123,36
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				123,36
SALDO DO CONTRATO				0,00
A MEDIR NO PERÍODO:				123,36

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026
DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
8	RUA JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA		
08.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	ÁREA
	RUA JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA		
De acordo com o projeto topográfico		4.262,28	4.262,28
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	4.262,28
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			4.262,28
SALDO DO CONTRATO:			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			4.262,28

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026
DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
8	RUA JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA		
08.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	ÁREA
	RUA JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA		
De acordo com o projeto topográfico		4.262,28	4262,28
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	4.262,28
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			4.262,28
SALDO DO CONTRATO:			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			4.262,28

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026
DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
8	RUA JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA		
08.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	ÁREA
	RUA JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA		4.262,28
De acordo com o projeto topográfico		4.262,28	4262,28
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	4.262,28
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			4.262,28
SALDO DO CONTRATO:			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			4.262,28

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026
DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND			
8	RUA JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA				
08.01.004	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltic o de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	Área (m²)	taxa	DMT	txkm
	RUA JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA				
PINTURA DE LIGAÇÃO		1.638,16	0,012	30,0	589,74
EXECUTADO NO PERÍODO:					589,74
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					589,74
SALDO DO CONTRATO:					0,00
ADITIVO:					589,74

Jose Arnaldo de N Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026
DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND			
8	RUA JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA				
08.01.005	transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	Área (m²)	taxa	DMT	txkm
	RUA JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA				
PINTURA DE LIGAÇÃO		4.262,28	0,012	20,3	1.038,29
EXECUTADO NO PERÍODO:					1.038,29
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					1.038,29
SALDO DO CONTRATO:					0,00
ADITIVO:					1.038,29

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026
DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
8	RUA JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA		
08.01.006	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019		
	ÁREA (m²)	ESP. (m)	ONCRETO ASFÁLTICO (m
Camada	4.262,28	0,05	213,11
EXECUTADO NO PERÍODO:		0,00	213,11
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			213,11
SALDO DO CONTRATO			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			213,11

José Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026
DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
8	RUA JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA			
08.01.007	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
		m³	Km	(m³XKm)
Camada		213,11	30	6393,30
EXECUTADO NO PERÍODO:				6.393,30
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				6.393,30
SALDO DO CONTRATO				0,00
A MEDIR NO PERÍODO:				6.393,30

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026
DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND		
8	RUA JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA			
08.01.008	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
	RUA JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA	m³	Km	(m³XKm)
	Camada	213,11	20	4262,20
EXECUTADO NO PERÍODO:				4.262,20
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				4.262,20
SALDO DO CONTRATO				0,00
A MEDIR NO PERÍODO:				4.262,20

Jose Arnaldo do N Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO: 015/26
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026
DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND		
8	RUA JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA			
08.01.009	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em cami nhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t).	VOLUME DE CBUQ	DENSIDADE	QUANTIDADE TOTAI
	RUA JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA	m³		T
	Camada	213,11	2,4	511,46
EXECUTADO NO PERÍODO:				511,46
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				511,46
SALDO DO CONTRATO				0,00
A MEDIR NO PERÍODO:				511,46

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 015/2026
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026
DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
10	PROJETO		
10.01.001	Projeto Executivo	m²	Km
	PROJETO		
De acordo com o levantamento		310,40	0,3104018
EXECUTADO NO PERÍODO:		km	0,3104018
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			0,3104018
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			0,3104018

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.02.23 11:26:17 -03'00'

Jose Arnaldo do N Pereira Junior
Eng. Civil CREA: 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV DR PEDRO GARCIA MORENO

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 015/2026
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 22/01/2026 até 12/02/2026
DATA DE MEDIÇÃO: 13/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO		
	DMT		

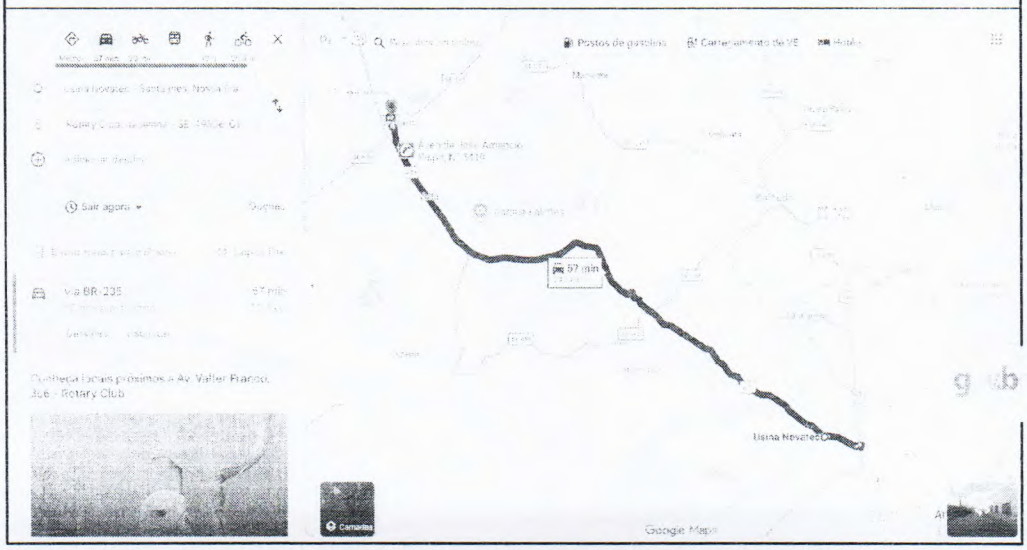

RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJO

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415

OBJETO: MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV. DR. PEDRO GARCIA MORENO.

LOCAL DA OBRA: RUAS ADJACENTES A AV. DR. PEDRO GARCIA MORENO - ITABAIANA-SE

CONTRATO: 015/2026

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

MEDIÇÃO 01

Período: 22/01/2026 a 12/02/2026

	Data da medição:13/02/2026	
ITEM	**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**	

FOTO 01- RUA GILMAR SANTOS COSTA

FOTO 02- RUA GILMAR SANTOS COSTA

FOTO 03- RUA GILMAR SANTOS COSTA

FOTO 04- RUA GILMAR SANTOS COSTA

FOTO 05 - RUA GILMAR SANTOS COSTA

FOTO 06 - RUA JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA

João Arnaldo de Oliveira Junior
Eng. Civil CREA 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

FOTO 07 - RUA ABÍLIO DE OLIVEIRA

FOTO 08 - RUA MARIA ANGELINA SANTANA

OBJETO: MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SERGIPE RUAS ADJACENTES A AV. DR. PEDRO GARCIA MORENO.

LOCAL DA OBRA: RUAS ADJACENTES A AV. DR. PEDRO GARCIA MORENO - ITABAIANA-SE

CONTRATO: 015/2026

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

MEDIÇÃO 01

Período: 22/01/2026 a 12/02/2026

Data da medição:13/02/2026

ITEM	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

FOTO 09 - RUA MARIA ANGELINA SANTANA

FOTO 10 - RUA CECÍLIA VIEIRA SANTOS

FOTO 11 - RUA CECÍLIA VIEIRA SANTOS

FOTO 12 - RUA CECÍLIA VIEIRA SANTOS

FOTO 13 - RUA PREFEITO VICENTE MACHADO MENEZES

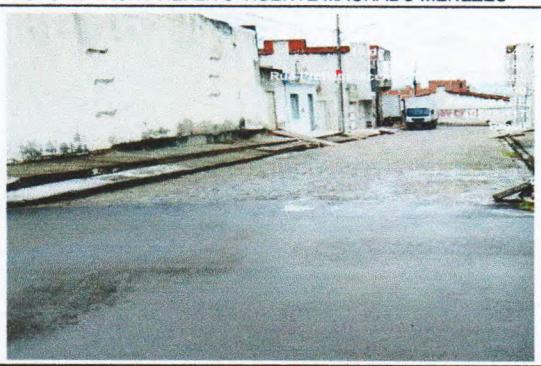

FOTO 14 - RUA ONELIA OLIVEIRA DOS SANTOS/ RUA BERÍLIO LEITE

gov.br
Documento assinado digitalmente
RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJ
Data: 23/02/2026 11:53:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415

José Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana
