CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

BOLETIM DE MEDIÇÃO 02
DO ADITIVO

CONTRATADA: AGC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Período: 26/11/2025 A 15/01/2026

CONTRATO
227/2025

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

Data de medição: 20/01/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CODIGO	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)					
				CONTRATADA	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO ATÉ O PERIODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	ADITIVO	ACUMULADO ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO ATÉ O PERIODO	SALDO A MEDIR	% Medido
1	**Pavimentação de estradas vicinais, no município de**									**R$ 267.917,24**	**R$ 142.920,88**	**R$ 124.996,35**	**R$ 267.917,23**	**R$ -**	**100,00%**
1.01	**PAVIMENTAÇÃO**														100,00%
01.01.001	Transporte com caminhão basculante de 10m³ - rodovia pavimentada (SICRO - 5914389)	0007 / PMI	tkm	87.066,86	0,00	**87.066,86**	87.066,86	-	0,97	R$ 84.454,85	R$ -	**R$ 84.454,85**	R$ 84.454,85	R$ -	100,00%
01.01.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	94273/ SINAPI	m	2.407,00	2.407,00		2.407,00	-	47,36	R$ 113.988,16	R$ 113.988,16	**R$ -**	R$ 113.988,16	R$ -	100,00%
01.01.003	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação	00071/ORSE	m³	180,53	180,53		180,53	-	77,45	R$ 13.981,09	R$ 13.981,09	**R$ -**	R$ 13.981,09	R$ -	100,00%
01.01.004	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga, exclusive transporte	11722/ORSE	m³	862,12	862,12		862,12	-	17,34	R$ 14.951,64	R$ 14.951,63	**R$ -**	R$ 14.951,63	R$ -	100,00%
01.01.005	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	02593/ORSE	m²	23.708,48	0,00	**23.708,48**	23.708,48	-	1,71	R$ 40.541,50	R$ -	**R$ 40.541,50**	R$ 40.541,50	R$ -	100,00%
1.02	**REDE COLETORA - DRENAGEM**									**R$ 150.820,45**	**R$ 150.820,38**	**R$ -**	**R$ 150.820,38**	**R$ -**	**100,00%**
01.02.001	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria (SICRO - 4805757)	0030 / PMI	m³	675,00	675,00		675,00	-	7,77	R$ 5.244,75	R$ 5.244,75	**R$ -**	R$ 5.244,75	R$ -	100,00%
01.02.002	Apiloamento manual de fundo de vala	02660/ORSE	m²	365,00	365,00		365,00	-	31,93	R$ 11.654,45	R$ 11.654,45	**R$ -**	R$ 11.654,45	R$ -	100,00%
01.02.003	Reaterro e compactação com soquete vibratório (SICRO - 4 815671)	0031 / PMI	m³	603,37	603,37		603,37	-	19,97	R$ 12.049,37	R$ 12.049,37	**R$ -**	R$ 12.049,44	R$ -	100,00%
01.02.004	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado c a2 d=0,40 m	02675/ORSE	m	365,00	365,00		365,00	-	106,76	R$ 38.967,40	R$ 38.967,40	**R$ -**	R$ 38.967,40	R$ -	100,00%
01.02.005	Entrada para descida d'agua - EDA 01 A - areia extraída e brita produzida (SICRO - 2003104)	0033 / PMI	un	2,00	2,00		2,00	-	126,81	R$ 253,62	R$ 253,62	**R$ -**	R$ 253,62	R$ -	100,00%
01.02.006	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 40-20 - arei a extraída e brita produzida (SICRO - 2003388)	0034 / PMI	m	6,00	6,00		6,00	-	192,00	R$ 1.152,00	R$ 1.152,00	**R$ -**	R$ 1.152,00	R$ -	100,00%
01.02.007	Caixa de ligação e passagem - CLP 01 - areia extraída e brita produzida (SICRO - 2003641)	0035 / PMI	un	3,00	3,00		3,00	-	1044,52	R$ 3.133,56	R$ 3.133,56	**R$ -**	R$ 3.133,56	R$ -	100,00%
01.02.008	Boca de lobo simples - BLS 02 - areia extraída e brita p roduzida (SICRO - 2003619)	0036 / PMI	un	3,00	3,00		3,00	-	952,89	R$ 2.858,67	R$ 2.858,67	**R$ -**	R$ 2.858,67	R$ -	100,00%
01.02.009	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo PEAD e brita comercial	2003578/ SICRO	m	400,00	400,00		400,00	-	188,77	R$ 75.506,63	R$ 75.506,63	**R$ -**	R$ 75.506,63	R$ -	100,00%
	TOTAL DO ORÇAMENTO									**R$ 418.737,69**	**R$ 293.741,26**	**R$ 124.996,43**	**R$ 418.737,69**	**R$ -**	**100,00%**
												29,85%	**100,00%**	**0,00%**	

ASSINATURA RESPONSÁVEL TÉCNICO

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415 Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

VALOR DA MEDIÇÃO: 124.996,43 (cento e vinte e quatro mil novecentos e noventa e seis reais e quarenta e três centavos).

DATA LIBERAÇÃO : _____/_____/_____

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND				
1.01	PAVIMENTAÇÃO					
01.01.001	Transporte com caminhão basculante de 10m³ - rodovia pavimentada (SICRO - 5914389)	VOLUME TOTAL (m³)	DENSIDADE	FATOR DE EMPOLAMENTO	DMT	QUANTIDADE
POVOADO PÉ DE VIADO		m³			km	Kmxt
ESCORAMENTO MEIO-FIO		180,53	1,50	1,15	70,20	21.860,67
REPOSIÇÃO DA DRENAGEM		234,66	1,50	1,15	70,20	28.415,67
CAMADA		497,64	2,4	1,02	30,20	36.790,51
EXECUTADO NO PERÍODO:						87.066,86
ACUMULADO ANTERIOR:						0,00
ACUMULADO ATUAL:						0,00
SALDO A MEDIR:						0,00
CONTRATO:						87.066,86
A MEDIR NO PERÍODO:						87.066,86

MEMORIA DE CÁLCULO

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO		
1.01	PAVIMENTAÇAO		
01.01.005	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte		ÁREA TOTAL (m²)
POVOADO PÉ DE VIADO		m²	m²
Área de Cobertura Asfáltica - Primeira camada		11.854,24	11.854,24
Área de Cobertura Asfáltica - Segunda camada		11.854,24	11.854,24
EXECUTADO NO PERÍODO:			23.708,48
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			23.708,48
SALDO A MEDIR:			0,00
CONTRATO:			23.708,48
À MEDIR NO PERÍODO:			23.708,48

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415 Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO		
	DMT		

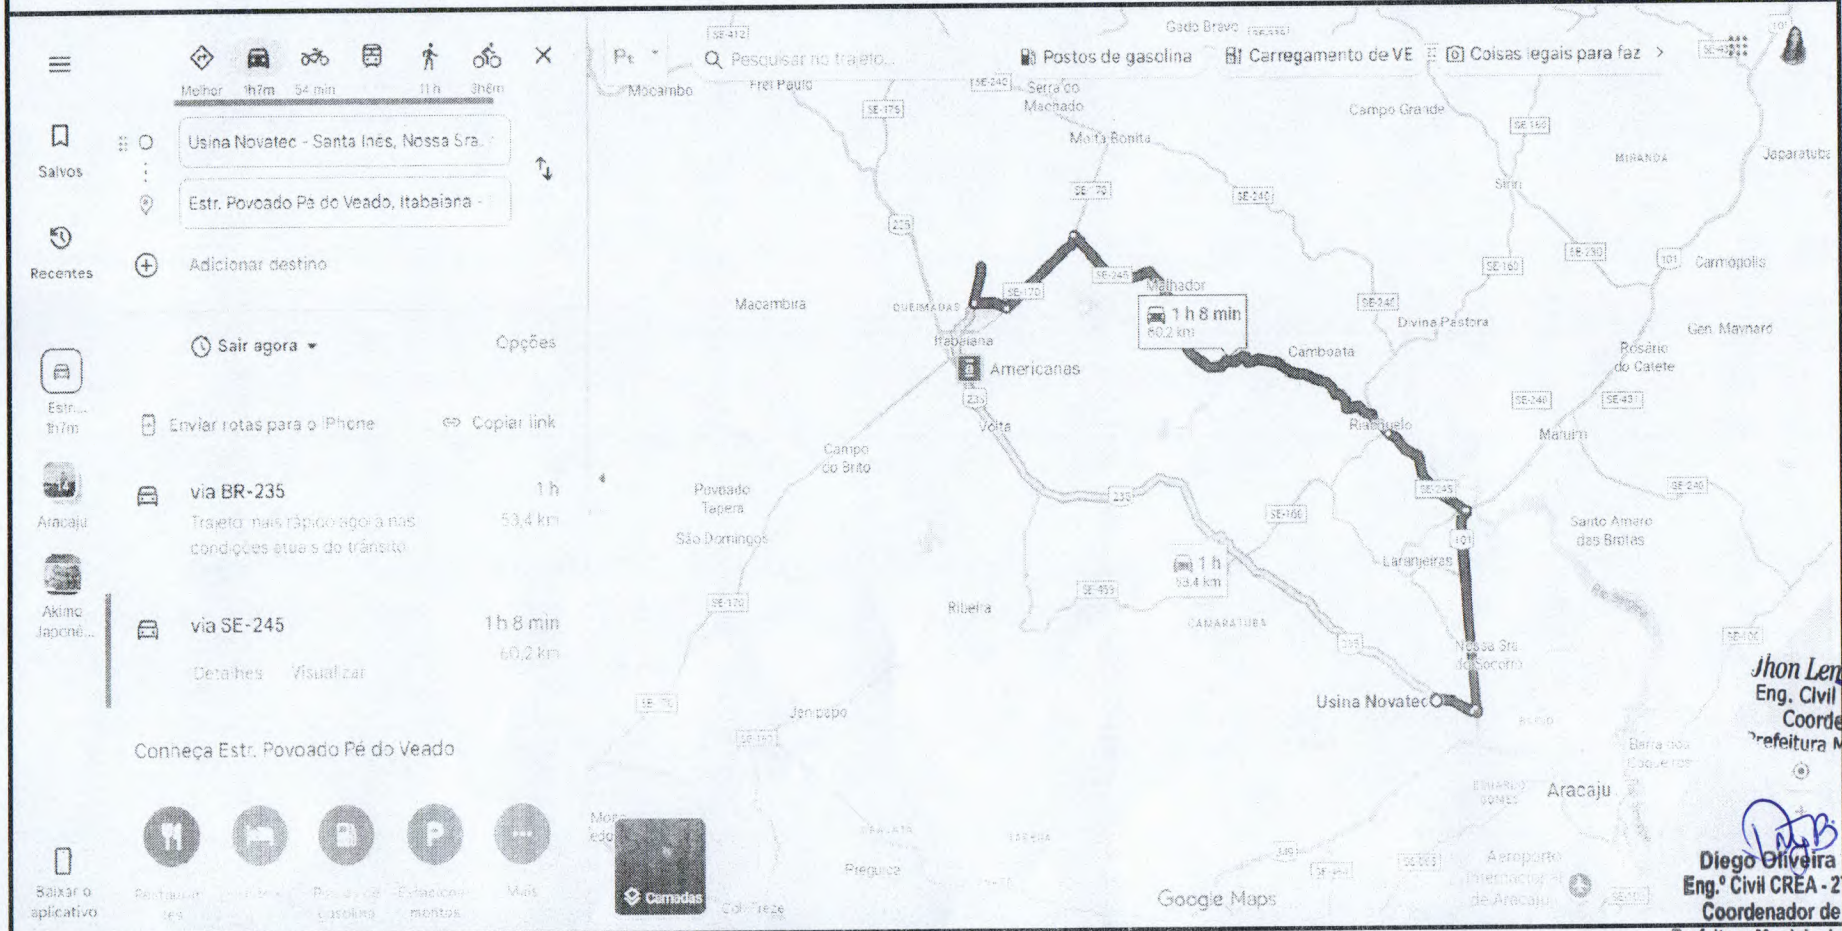

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

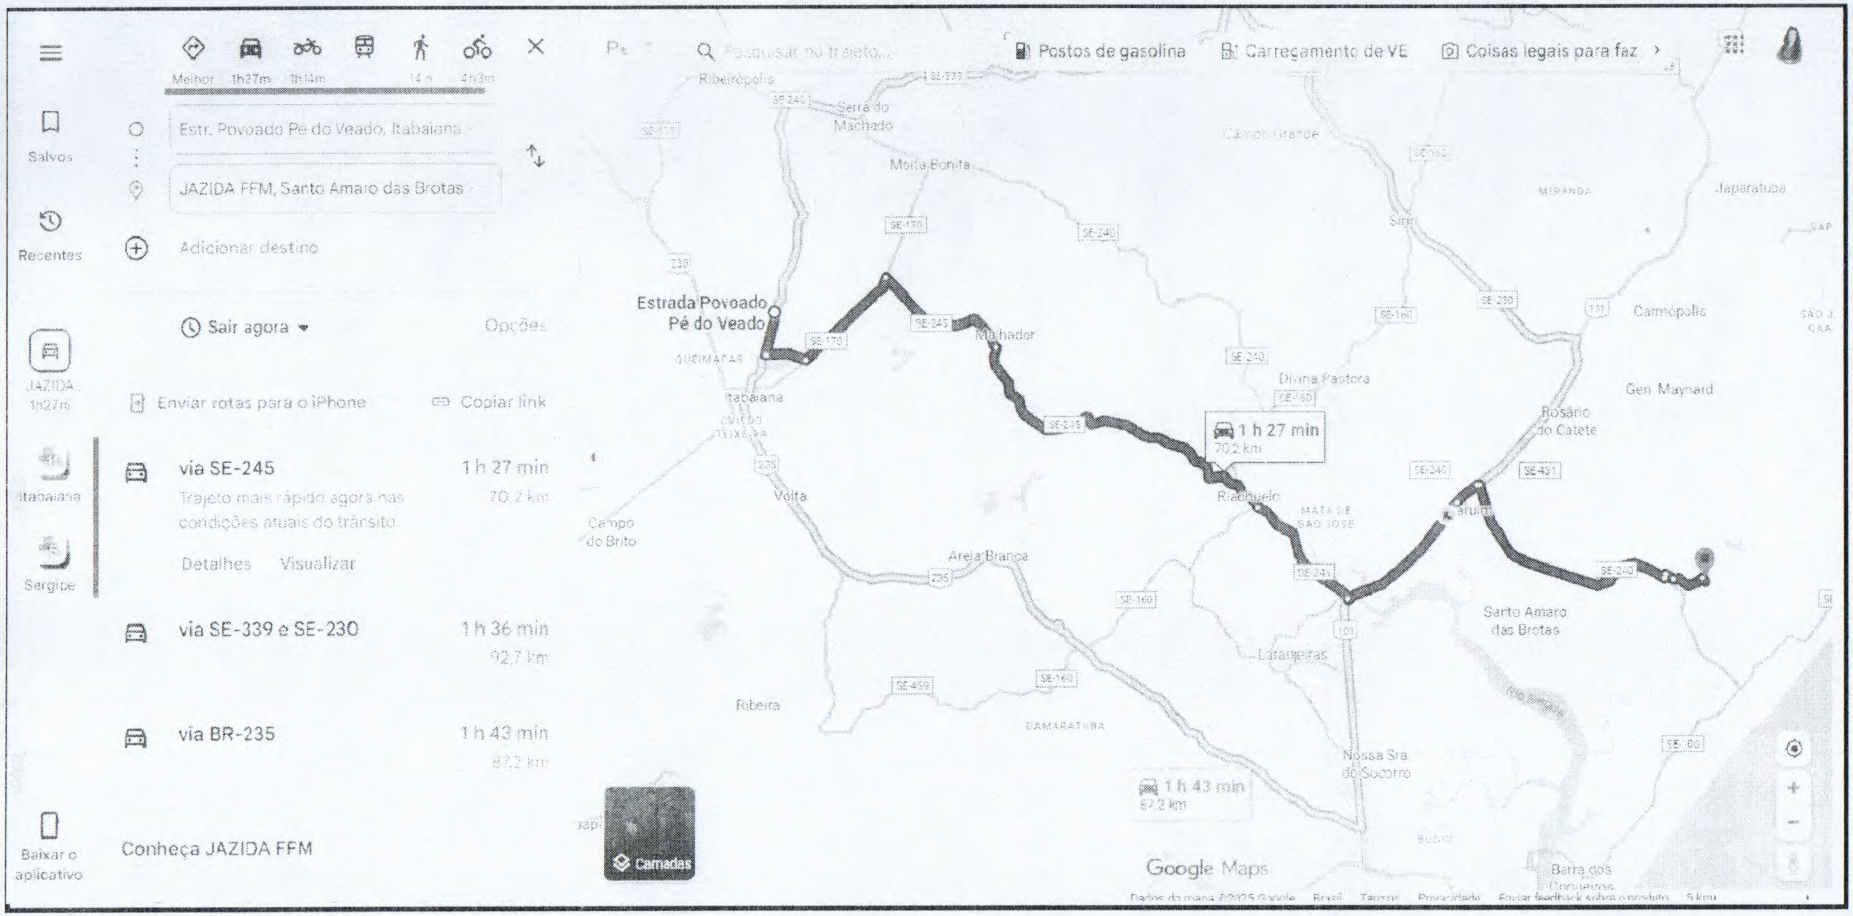

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

LOCAL DA OBRA: POVOADO PÉ DO VEADO- ITABAIANA-SE

PROCESSO ADMINISTRATIVO: CONTRATO: 227/2025

MEDIÇÃO 02 DO ADITIVO

Período: 26/11/2025 A 15/01/2026

ITEM	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

FOTO 01

FOTO 02

FOTO 03

FOTO 04

FOTO 05

FOTO 06-

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana
