PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DO REPASSE Nº 945052/2023/OP 1.088.278-94/MIDR (POVOADO LAGOA DO FORNO)	BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO Nº 157/2024	CONSTRUIR
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	B.M.Nº. 02	ORDEM DE SERVIÇOS = 02/07/2025	
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS LTDA	PERIODO: 01/12/2025 a 31/01/2026	DATA: 31/01/2026	

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço	VALORES R$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Unitário R$	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01	**CANTEIRO DE OBRAS**							**3.660,00**	**3.660,00**	**0,00**	**3.660,00**	**0,00**	**100,00**
01.001	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	5,00	5,00		5,00	732,00	3.660,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	**100,00**
02	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							**2.218,74**	**2.218,74**	**0,00**	**2.218,74**	**0,00**	**100,00**
02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	6,00		6,00	369,79	2.218,74	2.218,74	0,00	2.218,74	0,00	**100,00**
03	**TRECHO 1**							**263.130,66**	**0,00**	**258.720,55**	**258.720,55**	**4.410,11**	**98,32**
03.001	**PAVIMENTAÇÃO**							**229.973,91**	**0,00**	**229.973,91**	**229.973,91**	**0,00**	**100,00**
03.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	2.141,28		2.141,28	2.141,28	1,35	2.890,73	0,00	2.890,73	2.890,73	0,00	**100,00**
03.001.002	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidraúlica, dmt 1801 a 2000m	m3	265,56		265,56	265,56	13,04	3.462,90	0,00	3.462,90	3.462,90	0,00	**100,00**
03.001.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga, exclusive transporte	m3	64,66		64,66	64,66	14,64	946,62	0,00	946,62	946,62	0,00	**100,00**
03.001.004	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019	m3	64,66		64,66	64,66	12,24	791,44	0,00	791,44	791,44	0,00	**100,00**
03.001.005	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	193,98		193,98	193,98	1,40	271,57	0,00	271,57	271,57	0,00	**100,00**
03.001.006	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.858,73		1.858,73	1.858,73	96,81	179.943,65	0,00	179.943,65	179.943,65	0,00	**100,00**
03.001.007	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	941,84		941,84	941,84	44,24	41.667,00	0,00	41.667,00	41.667,00	0,00	**100,00**
03.002	**DRENAGEM SUPERFICIAL**							**28.746,64**	**-**	**28.746,64**	**28.746,64**	**-**	**100,00**
03.002.001	Sarjeta de paralelepípedo rejuntados, exclusive frete	m2	282,55		282,55	282,55	101,74	28.746,64	0,00	28.746,64	28.746,64	0,00	**100,00**
03.003	**SERVIÇOS FINAIS**							**4.410,11**	**-**	**-**	**-**	**4.410,11**	**0,00**
03.003.001	Pintura de meio fio (caiação)	m	941,84			0,00	3,50	3.296,44	0,00	0,00	0,00	3.296,44	**0,00**
03.003.002	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.141,68			0,00	0,52	1.113,67	0,00	0,00	0,00	1.113,67	**0,00**
04	**TRECHO 2**							**324.011,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**324.011,16**	**0,00**
04.001	**PAVIMENTAÇÃO**							**280.980,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280.980,58**	**0,00**
04.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	2.603,13			0,00	1,35	3.514,23	0,00	0,00	0,00	3.514,23	**0,00**
04.001.002	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidraúlica, dmt 1801 a 2000m	m3	434,88			0,00	13,04	5.670,84	0,00	0,00	0,00	5.670,84	**0,00**
04.001.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga, exclusive transporte	m3	37,65			0,00	14,64	551,20	0,00	0,00	0,00	551,20	**0,00**
04.001.004	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019	m3	37,65			0,00	12,24	460,84	0,00	0,00	0,00	460,84	**0,00**

André Agassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DO REPASSE Nº 945052/2023/OP 1.088.278-94/MIDR (POVOADO LAGOA DO FORNO)	BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO Nº 157/2024	CONSTRUIR
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	B.M.Nº. 02	ORDEM DE SERVIÇOS = 02/07/2025	
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS LTDA	PERIODO: 01/12/2025 a 31/01/2026	DATA: 31/01/2026	

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço	VALORES R$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Unitário R$	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
04.001.005	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	112,95			0,00	1,40	158,13	0,00	0,00	0,00	158,13	0,00
04.001.006	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	2.235,63			0,00	96,81	216.431,34	0,00	0,00	0,00	216.431,34	0,00
04.001.007	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	1.225,00			0,00	44,24	54.194,00	0,00	0,00	0,00	54.194,00	0,00
04.002	**DRENAGEM SUPERFICIAL**							**37.389,45**	**-**	**-**	**-**	**37.389,45**	**0,00**
04.002.001	Sarjeta de paralelepípedo rejuntados, exclusive frete	m2	367,50			0,00	101,74	37.389,45	0,00	0,00	0,00	37.389,45	0,00
04.003	**SERVIÇOS FINAIS**							**5.641,13**	**-**	**-**	**-**	**5.641,13**	**0,00**
04.003.001	Pintura de meio fio (caiação)	m	1.225,00			0,00	3,50	4.287,50	0,00	0,00	0,00	4.287,50	0,00
04.003.002	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.603,13			0,00	0,52	1.353,63	0,00	0,00	0,00	1.353,63	0,00
05	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**							**30.859,40**	**-**	**15.429,70**	**15.429,70**	**15.429,70**	**50,00**
05.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	130,00		65,0000	65,00	110,50	14.365,00	0,00	7.182,50	7.182,50	7.182,50	50,00
05.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	260,00		130,0000	130,00	63,44	16.494,40	0,00	8.247,20	8.247,20	8.247,20	50,00
	Total geral							**623.879,96**	**5.878,74**	**274.150,25**	**280.028,99**	**343.850,97**	**44,89**

Engº Civil Paulo César Lima Júnior CREA RN 2719934232	Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/_____	Aprovado para pagamento Data: ___/___/_____

gov.br Documento assinado digitalmente
PAULO CESAR LIMA JUNIOR
Data: 20/02/2026 11:12:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
DIEGO OLIVEIRA BARROS
Data: 20/02/2026 11:32:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

André Agassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DO REPASSE Nº 945052/2023/OP 1.088.278-94/MIDR (POVOADO LAGOA DO FORNO)	BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO Nº 157/2024	CONSTRUIR
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	B.M.Nº. 02	ORDEM DE SERVIÇOS = 02/07/2025	
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS LTDA	PERIODO: 01/12/2025 a 31/01/2026	DATA: 31/01/2026	

ITEM	Discriminação dos Serviços	UND	MEDIDO	CÁLCULO
03	TRECHO 1			
03.001	PAVIMENTAÇÃO			
03.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	2.141,28	> 475,84 x 4,50 = 2141,28m²
03.001.002	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidraúlica, dmt 1801 a 2000m	m3	265,56	> 265,56 conforme destacado na tabela abaixo
03.001.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga, exclusive transporte	m3	64,66	> 64,66 conforme destacado na tabela abaixo
03.001.004	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019	m3	64,66	> 64,66 conforme destacado na tabela abaixo

SECÇÃO	ÁREAS (m²)		SOMA DAS ÁREAS (m²)		SEMI-DISTÂNCIA (m)	VOLUME PARCIAL (m³)		VOLUME TOTAL (m³)	
	CORTE	ATERRO	CORTE	ATERRO		CORTE	ATERRO	CORTE	ATERRO
E0	0,558	0,080							
E1	0,460	0,110	1,018	0,190	10,000	10,180	1,900	10,180	1,900
E2	0,400	0,176	0,860	0,286	10,000	8,600	2,860	18,780	4,760
E3	0,340	0,188	0,740	0,364	10,000	7,400	3,640	26,180	8,400
E4	0,490	0,080	0,830	0,268	10,000	8,300	2,680	34,480	11,080
E5	0,470	0,090	0,960	0,170	10,000	9,600	1,700	44,080	12,780
E6	0,500	0,060	0,970	0,150	10,000	9,700	1,500	53,780	14,280
E7	0,384	0,188	0,884	0,248	10,000	8,840	2,480	62,620	16,760
E8	0,618	0,030	1,002	0,218	10,000	10,020	2,180	72,640	18,940
E9	0,514	0,246	1,132	0,276	10,000	11,320	2,760	83,960	21,700
E10	0,535	0,226	1,049	0,472	10,000	10,490	4,720	94,450	26,420
E11	0,566	0,104	1,101	0,330	10,000	11,010	3,300	105,460	29,720
E12	0,639	0,124	1,205	0,228	10,000	12,050	2,280	117,510	32,000
E13	0,472	0,110	1,111	0,234	10,000	11,110	2,340	128,620	34,340
E14	0,560	0,080	1,032	0,170	10,000	10,320	1,700	138,940	36,040
E15	0,578	0,070	1,138	0,130	10,000	11,380	1,300	150,320	37,340
E16	0,600	0,070	1,178	0,140	10,000	11,780	1,400	162,100	38,740
E17	0,476	0,135	1,076	0,205	10,000	10,760	2,050	172,860	40,790
E18	0,438	0,336	0,914	0,471	10,000	9,140	4,710	182,000	45,500
E19	0,732	0,080	1,170	0,416	10,000	11,700	4,160	193,700	49,660
E20	0,376	0,166	1,108	0,246	10,000	11,080	2,460	204,780	52,120
E21	0,536	0,070	0,912	0,236	10,000	9,120	2,360	213,900	54,480
E22	0,516	0,066	1,052	0,136	10,000	10,520	1,360	224,420	55,840
E23	0,480	0,104	0,996	0,170	10,000	9,960	1,700	234,380	57,540
E24	0,400	0,194	0,880	0,298	10,000	8,800	2,980	243,180	60,520
E25	0,578	0,100	0,978	0,294	10,000	9,780	2,940	252,960	63,460
E26	0,682	0,020	1,260	0,120	10,000	12,600	1,200	265,560	64,660

03.001.005	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	193,98	= 64,66 x 1,5 x 2 = 193,98
03.001.006	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.858,73	> 464,683 x 4,00 = 1.858,73m²
03.001.007	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	941,84	> 470,92 x 2 lados = 941,84m
03.002	DRENAGEM SUPERFICIAL			
03.002.001	Sarjeta de paralelepípedo rejuntados, exclusive frete	m2	282,55	> 470,92 x 0,60 = 282,55m²
05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
05.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	65,00	> 130 x 50% = 65h
05.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	130,00	> 260 x 50% = 130h

Engº Civil Paulo César Lima Júnior
CREA RN 2719934232

Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.
Data: ___/___/_____

Aprovado para pagamento
Data: ___/___/_____

Documento assinado digitalmente
gov.br
PAULO CESAR LIMA JUNIOR
Data: 20/02/2026 11:12:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente
gov.br
DIEGO OLIVEIRA BARROS
Data: 20/02/2026 11:32:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

André Ágassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DO REPASSE Nº 945052/2023/OP 1.088.278-94/MIDR (POVOADO LAGOA DO FORNO) **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA** **CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS LTDA**	**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 02** **PERIODO: 01/12/2025 A 31/01/2026**	**CONTRATO Nº 157/2024** **ORDEM DE SERVIÇO INICIO - 05/07/2024**

PLACA DA OBRA E TERRAPLANAGEM

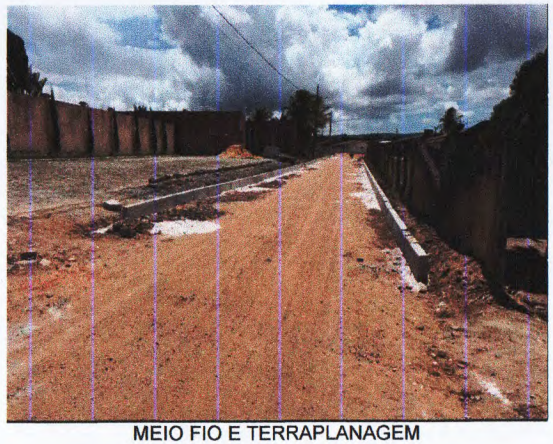
MEIO FIO E TERRAPLANAGEM

COLCHÃO DE AREIA E MEIO FIO

COLCHÃO DE AREIA E MEIO FIO

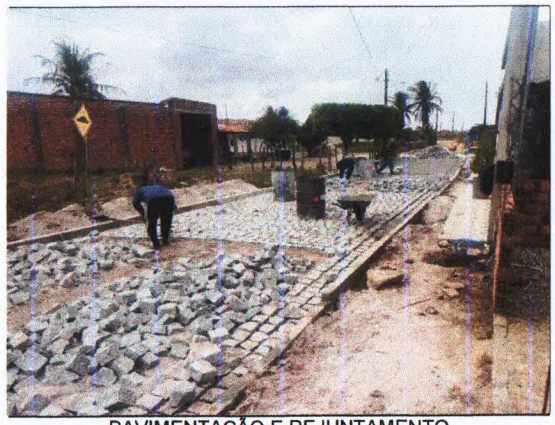
PAVIMENTAÇÃO E REJUNTAMENTO

PAVIMENTAÇÃO E REJUNTAMENTO

André Agassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ELABORADO POR:

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DO REPASSE Nº 945052/2023/OP 1.088.278-94/MIDR (POVOADO LAGOA DO FORNO) CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS LTDA	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 02 PERIODO: 01/12/2025 A 31/01/2026	CONTRATO Nº 157/2024 ORDEM DE SERVIÇO INICIO - 05/07/2024

COLCHÃO DE AREIA E MEIO FIO

PAVIMENTAÇÃO E REJUNTAMENTO

PAVIMENTAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO

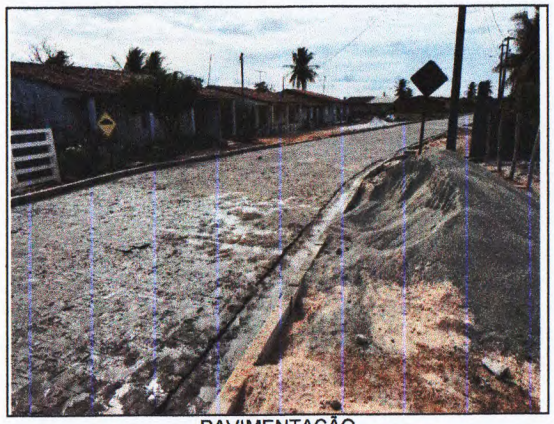

PAVIMENTAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO

gov.br Documento assinado digitalmente
PAULO CESAR LIMA JUNIOR
Data: 20/02/2026 11:12:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
DIEGO OLIVEIRA BARROS
Data: 20/02/2026 11:32:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

André Agassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ELABORADO POR:
