OBA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO (REVITALIZAÇÃO PRAÇA JUBAL CARVALHO)	BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO Nº 171/2026/PMI	CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE
	B.M.Nº. 02	ORDEM DE SERVIÇO: 08/06/2026	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA -SE	PERIODO: 01/07/2026 a 31/08/2026	DATA: 10/09/2026	

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R$	VALORES R$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							**6.423,16**	**6.423,16**	**0,00**	**6.423,16**	**0,00**	**100,00**
1.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	6,00	0,00	6,00	355,94	2.135,64	2.135,64	0,00	2.135,64	0,00	100,00
1.002	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	156,08	156,08	0,00	156,08	27,47	4.287,52	4.287,52	0,00	4.287,52	0,00	100,00
2	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**							**4.433,90**	**755,08**	**3.678,83**	**4.433,90**	**0,00**	**100,00**
02.001	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	33,16		33,16	33,16	10,16	336,91	0,00	336,91	336,91	0,00	100,00
02.002	Demolição de concreto manualmente	m3	4,16		4,16	4,16	266,29	1.107,77	0,00	1.107,77	1.107,77	0,00	100,00
02.003	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	78,54		78,54	78,54	26,47	2.078,95	0,00	2.078,95	2.078,95	0,00	100,00
02.004	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	8,00		8,00	8,00	19,40	155,20	0,00	155,20	155,20	0,00	100,00
02.005	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	1,91	1,91	0,00	1,91	54,72	104,52	104,52	0,00	104,52	0,00	100,00
02.006	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	18,42	18,42	0,00	18,42	10,81	199,12	199,12	0,00	199,12	0,00	100,00
02.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	376,20	376,20	0,00	376,20	1,20	451,44	451,44	0,00	451,44	0,00	100,00
3	**PAVIMENTAÇÃO**							**17.872,78**	**12.524,41**	**5.348,36**	**17.872,78**	**0,00**	**100,00**
03.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	33,16	33,16	0,00	33,16	44,38	1.471,64	1.471,64	0,00	1.471,64	0,00	100,00
03.002	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022	m3	1,28	1,28	0,00	1,28	774,92	991,90	991,90	0,00	991,90	0,00	100,00
03.003	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 16 faces, 11x22cm, e=8cm, 39un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	124,54	80,00	44,54	124,54	120,08	14.954,76	9.606,40	5.348,36	14.954,76	0,00	100,00
03.004	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	13,20	13,20	0,00	13,20	34,43	454,48	454,48	0,00	454,48	0,00	100,00
4	**PINTURA**							**4.778,80**	**0,00**	**4.778,80**	**4.778,80**	**0,00**	**100,00**
04.001	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	234,02		234,02	234,02	20,22	4.731,88	0,00	4.731,88	4.731,88	0,00	100,00
04.002	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.)	m2	4,00		4,00	4,00	11,73	46,92	0,00	46,92	46,92	0,00	100,00
5	**EQUIPAMENTOS DIVERSOS**							**19.378,83**	**0,00**	**17.177,35**	**17.177,35**	**2.201,48**	**88,64**
05.001	Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref, NK1606, da Nilko ou similar	un	4,00		0,00	0,00	550,37	2.201,48	0,00	0,00	0,00	2.201,48	0,00
05.002	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	2,00		2,00	2,00	333,63	667,26	0,00	667,26	667,26	0,00	100,00
05.003	Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro galv.4"	un	1,00		1,00	1,00	3.706,09	3.706,09	0,00	3.706,09	3.706,09	0,00	100,00
05.004	Brinquedo - Escorregadeira, com pilar de madeira, escda em tubo de ferro galv. de 2" e rampa em chapa de aço galvanizado	un	1,00		1,00	1,00	8.944,94	8.944,94	0,00	8.944,94	8.944,94	0,00	100,00
05.005	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1,00		1,00	1,00	3.859,06	3.859,06	0,00	3.859,06	3.859,06	0,00	100,00
6	**PAISAGISMO**							**7.704,10**	**0,00**	**7.704,10**	**7.704,10**	**0,00**	**100,00**
06.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	230,00		230,00	230,00	25,37	5.835,10	0,00	5.835,10	5.835,10	0,00	100,00
06.002	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	50,00		50,00	50,00	37,38	1.869,00	0,00	1.869,00	1.869,00	0,00	100,00
7	**DIVERSOS**							**4.078,51**	**0,00**	**1.990,26**	**1.990,26**	**2.088,25**	**48,80**
07.001	Limpeza geral	m2	822,42		822,42	822,42	2,42	1.990,26	0,00	1.990,26	1.990,26	0,00	100,00
07.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00		0,00	0,00	2.088,25	2.088,25	0,00	0,00	0,00	2.088,25	0,00
8	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**							**3.542,80**	**885,70**	**2.657,10**	**3.542,80**	**0,00**	**100,00**
8.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	10,00	2,50	7,50	10,00	154,93	1.549,30	387,33	1.161,98	1.549,30	0,00	100,00

CONSTRUTORA ROCHA LTDA
MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 270439694-9

Jose Arnaldo do N Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENENTES AO MUNICÍPIO (REVITALIZAÇÃO PRAÇA JUBAL CARVALHO) CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA -SE	BOLETIM DE MEDIÇÃO B.M.Nº. 02 PERIODO: 01/07/2026 a 31/08/2026	CONTRATO Nº 171/2026/PMI ORDEM DE SERVIÇO: 08/06/2026 DATA: 10/09/2026	CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R$	VALORES R$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		
8.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	25,00	6,25	18,75	25,00	79,74	1.993,50	498,38	1.495,13	1.993,50	0,00	100,00
TOTAL GERAL								**68.212,88**	**20.588,35**	**43.334,80**	**63.923,15**	**4.289,73**	**93,71**

CONSTRUTORA ROCHA LTDA

CONSTRUTORA ROCHA LTDA

MARIA GARDÊNIA ARAÚJO SILVA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 270439694-9

Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.
Data: ___/___/_____

Aprovado para pagamento
Data: ___/___/_____

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rízia Mïene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MEMÓRIA DE CÁLCULO

BM 02 10/09/2026

CONSTRUTORA ROCHA
SOLIDEZ E QUALIDADE

CONTRATO Nº	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO:
171/2026/PMI	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (REVITALIZAÇÃO PRAÇA JUBAL CARVALHO)
02	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**
02.001	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado= 8,16m+15,00m+10,00m: 33,16m
02.002	Demolição de concreto manualmente= 41,6*1,00*0,10: 4,16m³
02.003	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01= 8,54m²+40,00m²+30m²: 78,54 m²
02.004	Remoção de banco de concreto pré-moldado: 2un+2un+2un+2un: 8un
03	**PAVIMENTAÇÃO**
03.003	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 16 faces, 11x22cm, e=8cm, 39un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina= 20m²+9,54m²:44,54m²
04	**PINTURA**
04.001	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021=100M²+50M²+50M²+34,02M²:234,02M²
04.002	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.)= 2,00M²+2,00M²:4,00M²
05	**EQUIPAMENTOS DIVERSOS**
05.002	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar= 1UN+1UN:2UND
05.003	Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro galv.4"= 1UN
05.004	Brinquedo - Escorregadeira, com pilar de madeira, escda em tubo de ferro galv. de 2" e rampa em chapa de aço galvanizado= 1UN
05.005	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar= 1UN
06	**PAISAGISMO**
05.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio=50M²+100M²+50M²+30M²:230M²
05.002	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais=20M+15M+15M:50M
07	**DIVERSOS**
07.001	Limpeza geral= 200M²+200M²+300M²+122,42M²:822,42M²
08	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**
08.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares =7,50 h
08.002	Mestre de obras com encargos complementares = 18,75h

Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Engª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA
Data: 22/10/2026 10:10:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Isaac Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (REVITALIZAÇÃO PRAÇA JUBAL CARVALHO)	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 02	CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE
CONTRATADA: **CONSTRUTORA ROCHA LTDA**		**CONTRATO Nº: 171/2026**
CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE**		DATA: **10/09/2026**



DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO



DEMOLIÇÃO /REMOCÃO BANCOS



PAVIMENTAÇÃO BLOCO CONCRETO

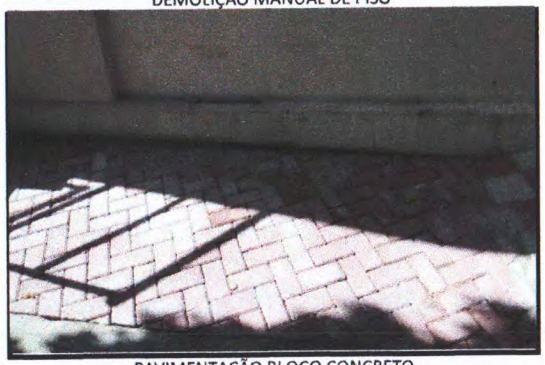

PAVIMENTAÇÃO BLOCO CONCRETO



PAVIMENTAÇÃO BLOCO CONCRETO



BRINQUEDOS

ELABORADO POR:	FISCALIZAÇÃO:	Observações:
CONSTRUTORA ROCHA LTDA MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA ENGENHEIRA CIVIL CREA Nº 270439694-9		

Jose Arnaldo do N. Pereira Junio
Eng. Civil CREA - 272103189
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itab

Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (REVITALIZAÇÃO PRAÇA JUBAL CARVALHO)	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 02	CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE
CONTRATADA: **CONSTRUTORA ROCHA LTDA**		**CONTRATO Nº: 171/2026**
CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE**		DATA: **10/09/2026**



PAISAGISMO



PAISAGISMO



PAISAGISMO



PINTURA



PINTURA



LIMPEZA

ELABORADO POR: CONSTRUTORA ROCHA LTDA MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA ENGENHEIRA CIVIL CREA Nº 270439694-9	FISCALIZAÇÃO:	Observações:

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana
