EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)	DATA DE INICIO: 02/10/2025	BOLETIM DE MEDIÇÃO 02	NOVATEC
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DE TÉRMINO: 02/01/2026	PERÍODO: 01/11/2025 a 06/03/2026	CONTRATO 351/25
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA		DATA DE MEDIÇÃO: 01/06/2026	

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**								**R$ 199.093,70**	**R$ 183.166,18**	**R$ 15.927,52**	**R$ 199.093,70**		8,00%
01.01	Equipe Dirigente	UN	0,10	0,09	**0,008**	0,10	0,000	1.667.154,61	R$ 166.715,46	R$ 153.378,22	**R$ 13.337,24**	R$ 166.715,46	R$ -	100,00
01.02	Manutenção do Canteiro UNID	UN	0,15	0,138	**0,012**	0,15	0,000	128.490,70	R$ 19.273,61	R$ 17.731,71	**R$ 1.541,90**	R$ 19.273,61	R$ -	100,00
01.03	Equipamentos de Apoio à Produção	UN	0,15	0,14	**0,012**	0,15	0,00	87.364,20	R$ 13.104,63	R$ 12.056,25	**R$ 1.048,38**	R$ 13.104,63	R$ -	100,00
2	**RUA VESTA MARIA DE GÓIS**								**R$ 388.278,29**	**R$ 387.101,38**	**R$ 1.176,91**	**R$ 388.278,29**	**R$ 0,00**	0,30%
2.01	**Recapeamento asfáltico**								**R$ 387.101,38**	**R$ 387.101,38**	**R$ 0,00**	**R$ 387.101,38**	**R$ 0,00**	
02.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	3362,59	3.362,59		3362,59	0,00	1,40	R$ 4.707,63	R$ 4.707,63	**R$ -**	R$ 4.707,63	R$ -	100,00
02.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	3362,59	3.362,59		3362,59	0,00	2,42	R$ 8.137,47	R$ 8.137,47	**R$ -**	R$ 8.137,47	R$ -	100,00
02.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	3362,59	3.362,59		3362,59	0,00	1,93	R$ 6.489,80	R$ 6.489,80	**R$ -**	R$ 6.489,80	R$ -	100,00
02.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m³	184,94	184,94		184,94	0,00	1750,10	R$ 323.662,62	R$ 323.662,62	**R$ -**	R$ 323.662,62	R$ -	100,00
02.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	12105,36	12.105,36		12105,36	0,00	2,89	R$ 34.984,49	R$ 34.984,49	**R$ -**	R$ 34.984,49	R$ -	100,00
02.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	8070,24	8.070,24		8070,24	0,00	1,13	R$ 9.119,37	R$ 9.119,37	**R$ -**	R$ 9.119,37	R$ -	100,00
2.2	**Limpeza**								**R$ 1.176,91**	**R$ 0,00**	**R$ 1.176,91**	**R$ 1.176,91**	**R$ 0,00**	100,00
02.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	3362,59	-	**3.362,59**	3362,59	0,00	0,35	R$ 1.176,91	R$ -	**R$ 1.176,91**	R$ 1.176,91	R$ -	100,00
3	**RUA LOURENÇO ALVES DOS SANTOS**								**R$ 286.321,31**	**R$ 284.089,44**	**R$ 867,91**	**R$ 284.957,35**	**R$ 1.363,96**	0,30%
3.01	**Recapeamento asfáltico**								**R$ 285.453,40**	**R$ 284.089,44**	**R$ 0,00**	**R$ 284.089,44**	**R$ 1.363,96**	
03.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	2479,73	2.479,73		2479,73	0,00	1,40	R$ 3.471,62	R$ 3.471,62	**R$ -**	R$ 3.471,62	R$ -	100,00
03.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	2479,73	2.479,73		2479,73	0,00	2,42	R$ 6.000,95	R$ 6.000,95	**R$ -**	R$ 6.000,95	R$ -	100,00
03.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	2479,73	2.479,73		2479,73	0,00	1,93	R$ 4.785,88	R$ 4.785,88	**R$ -**	R$ 4.785,88	R$ -	100,00
03.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m³	136,38	136,38		136,38	0,00	1750,10	R$ 238.672,51	R$ 238.670,15	**R$ -**	R$ 238.670,15	R$ 2,36	100,00
03.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	8926,56	8.455,42		8455,42	471,14	2,89	R$ 25.797,76	R$ 24.436,17	**R$ -**	R$ 24.436,17	R$ 1.361,59	94,72
03.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	5951,04	5.951,04		5951,04	0,00	1,13	R$ 6.724,68	R$ 6.724,67	**R$ -**	R$ 6.724,67	R$ 0,01	100,00
3.2	**Limpeza**								**R$ 867,91**	**R$ 0,00**	**R$ 867,91**	**R$ 867,91**	**R$ 0,00**	100,00
03.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	2479,73	-	**2.479,73**	2479,73	0,00	0,35	R$ 867,91	R$ -	**R$ 867,91**	R$ 867,91	R$ -	100,00
4	**RUA JOSEFA CIPRIANO DE CARVALHO**								**R$ 105.182,03**	**R$ 104.863,19**	**R$ 318,84**	**R$ 105.182,03**	**R$ 0,01**	0,30%
4.01	**Recapeamento asfáltico**								**R$ 104.863,19**	**R$ 104.863,19**	**R$ 0,00**	**R$ 104.863,19**	**R$ 0,01**	
04.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	910,96	910,96		910,96	0,00	1,40	R$ 1.275,34	R$ 1.275,34	**R$ -**	R$ 1.275,34	R$ -	100,00
04.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	910,96	910,96		910,96	0,00	2,42	R$ 2.204,52	R$ 2.204,52	**R$ -**	R$ 2.204,52	R$ -	100,00
04.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	910,96	910,96		910,96	0,00	1,93	R$ 1.758,15	R$ 1.758,15	**R$ -**	R$ 1.758,15	R$ -	100,00
04.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m³	50,10	50,10		50,10	0,00	1750,10	R$ 87.676,51	R$ 87.676,51	**R$ -**	R$ 87.676,51	R$ -	100,00
04.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	3279,60	3.279,60		3279,60	0,00	2,89	R$ 9.478,04	R$ 9.478,05	**R$ -**	R$ 9.478,05	R$ -	100,00
04.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	2186,40	2.186,40		2186,40	0,00	1,13	R$ 2.470,63	R$ 2.470,62	**R$ -**	R$ 2.470,62	R$ 0,01	100,00
4.2	**Limpeza**								**R$ 318,84**	**R$ 0,00**	**R$ 318,84**	**R$ 318,84**	**R$ 0,00**	100,00
04.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	910,96	-	**910,96**	910,96	0,00	0,35	R$ 318,84	R$ -	**R$ 318,84**	R$ 318,84	R$ -	100,00
5	**RUA AMAZILDE MENEZES SAMPAIO**								**R$ 140.813,17**	**R$ 140.273,36**	**R$ 426,85**	**R$ 140.700,21**	**R$ 112,96**	0,30%
5.01	**Recapeamento asfáltico**								**R$ 140.386,32**	**R$ 140.273,36**	**R$ 0,00**	**R$ 140.273,36**	**R$ 112,96**	
05.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	1219,58	1.219,58		1219,58	0,00	1,40	R$ 1.707,41	R$ 1.707,41	**R$ -**	R$ 1.707,41	R$ -	100,00
05.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	1219,58	1.219,58		1219,58	0,00	2,42	R$ 2.951,38	R$ 2.951,38	**R$ -**	R$ 2.951,38	R$ -	100,00
05.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	1219,58	1.219,58		1219,58	0,00	1,93	R$ 2.353,79	R$ 2.353,79	**R$ -**	R$ 2.353,79	R$ -	100,00

Jose Arnaldo de N Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)	DATA DE INICIO: 02/10/2025	BOLETIM DE MEDIÇÃO 02	NOVATEC
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DE TÉRMINO: 02/01/2026	PERÍODO: 01/11/2025 a 06/03/2026	CONTRATO 351/25
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA		DATA DE MEDIÇÃO: 01/06/2026	

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
05.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m³	67,07	67,07		67,07	0,00	1750,10	R$ 117.377,46	R$ 117.373,78	R$ -	R$ 117.373,78	R$ 3,68	100,00
05.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	4390,56	4.352,75		4352,75	37,81	2,89	R$ 12.688,72	R$ 12.579,44	R$ -	R$ 12.579,44	R$ 109,28	99,14
05.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	2927,04	2.927,04		2927,04	0,00	1,13	R$ 3.307,56	R$ 3.307,56	R$ -	R$ 3.307,56	R$ -	100,00
5.2	**Limpeza**								**R$ 426,85**	**R$ 0,00**	**R$ 426,85**	**R$ 426,85**		100,00
05.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	1219,58	-	**1.219,58**	1219,58	0,00	0,35	R$ 426,85	R$ -	**R$ 426,85**	R$ 426,85	R$ -	100,00
6	**RUA MIGUEL ALVES DOS SANTOS**								**R$ 173.432,36**	**R$ 170.545,67**	**R$ 519,95**	**R$ 171.065,62**	**R$ 2.366,74**	0,30%
6.01	**Recapeamento asfáltico**								**R$ 172.912,41**	**R$ 170.545,67**	**R$ 0,00**	**R$ 170.545,67**	**R$ 2.366,74**	
06.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	1485,56	1.485,56		1485,56	0,00	1,40	R$ 2.079,78	R$ 2.079,78	**R$ -**	R$ 2.079,78	R$ -	100,00
06.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	1485,56	1.485,56		1485,56	0,00	2,42	R$ 3.595,06	R$ 3.595,06	**R$ -**	R$ 3.595,06	R$ -	100,00
06.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	1485,56	1.485,56		1485,56	0,00	1,93	R$ 2.867,13	R$ 2.867,13	**R$ -**	R$ 2.867,13	R$ -	100,00
06.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m²	81,68	81,68		81,68	0,01	1750,10	R$ 142.944,67	R$ 142.940,81	**R$ -**	R$ 142.940,81	R$ 3,86	100,00
06.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	5880,82	5.063,22		5063,22	817,60	2,89	R$ 16.995,56	R$ 14.632,69	**R$ -**	R$ 14.632,69	R$ 2.362,87	86,10
06.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	3920,54	3.920,54		3920,54	0,00	1,13	R$ 4.430,21	R$ 4.430,20	**R$ -**	R$ 4.430,20	R$ 0,01	100,00
6.2	**Limpeza**								**R$ 519,95**	**R$ 0,00**	**R$ 519,95**	**R$ 519,95**	**R$ 0,00**	100,00
06.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	1485,56	-	**1.485,56**	1485,56	0,00	0,35	R$ 519,95	R$ -	**R$ 519,95**	R$ 519,95	R$ -	100,00
7	**RUA JOÃO ANDRADE**								**R$ 128.549,91**	**R$ 126.402,23**	**R$ 385,29**	**R$ 126.787,52**	**R$ 1.759,04**	0,30%
7.01	**Recapeamento asfáltico**								**R$ 128.163,62**	**R$ 126.402,23**	**R$ 0,00**	**R$ 126.402,23**	**R$ 1.759,04**	
07.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	1100,82	1.100,82		1100,82	0,00	1,40	R$ 1.541,15	R$ 1.541,15	**R$ -**	R$ 1.541,15	R$ -	100,00
07.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	1100,82	1.100,82		1100,82	0,00	2,42	R$ 2.663,98	R$ 2.663,98	**R$ -**	R$ 2.663,98	R$ -	100,00
07.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	1100,82	1.100,82		1100,82	0,00	1,93	R$ 2.124,58	R$ 2.124,58	**R$ -**	R$ 2.124,58	R$ -	100,00
07.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m²	60,54	60,54		60,54	0,00	1750,10	R$ 105.952,80	R$ 105.942,47	**R$ -**	R$ 105.942,47	R$ 10,33	99,99
07.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	4358,95	3.753,05		3753,05	605,90	2,89	R$ 12.597,37	R$ 10.846,31	**R$ -**	R$ 10.846,31	R$ 1.748,71	86,10
07.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	2905,97	2.905,97		2905,97	0,00	1,13	R$ 3.283,74	R$ 3.283,74	**R$ -**	R$ 3.283,74	R$ -	100,00
7.2	**Limpeza**								**R$ 385,29**	**R$ 0,00**	**R$ 385,29**	**R$ 385,29**	**R$ 0,00**	100,00
07.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	1100,82	-	**1.100,82**	1100,82	0,00	0,35	R$ 385,29	R$ -	**R$ 385,29**	R$ 385,29	R$ -	100,00
8	**RUA AGDO OLIVEIRA SANTOS**								**R$ 68.033,01**	**R$ 66.818,73**	**R$ 203,98**	**R$ 67.022,71**	**R$ 1.017,30**	0,30%
8.01	**Recapeamento asfáltico**								**R$ 67.829,03**	**R$ 66.818,73**	**R$ 0,00**	**R$ 66.818,73**	**R$ 1.017,30**	
08.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	582,80	582,80		582,80	0,00	1,40	R$ 815,92	R$ 815,92	**R$ -**	R$ 815,92	R$ -	100,00
08.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	582,80	582,80		582,80	0,00	2,42	R$ 1.410,38	R$ 1.410,38	**R$ -**	R$ 1.410,38	R$ -	100,00
08.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	582,80	582,80		582,80	0,00	1,93	R$ 1.124,80	R$ 1.124,80	**R$ -**	R$ 1.124,80	R$ -	100,00
08.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m²	32,04	32,04		32,04	0,00	1750,10	R$ 56.073,20	R$ 56.080,20	**R$ -**	R$ 56.080,20		100,01
08.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	2306,88	1.954,88		1954,88	352,00	2,89	R$ 6.666,88	R$ 5.649,59	**R$ -**	R$ 5.649,59	R$ 1.017,29	84,74
08.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	1537,92	1.537,92		1537,92	0,00	1,13	R$ 1.737,85	R$ 1.737,84	**R$ -**	R$ 1.737,84	R$ 0,01	100,00
8.2	**Limpeza**								**R$ 203,98**	**R$ 0,00**	**R$ 203,98**	**R$ 203,98**	**R$ 0,00**	100,00
08.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	582,80	-	**582,80**	582,80	0,00	0,35	R$ 203,98	R$ -	**R$ 203,98**	R$ 203,98	R$ -	100,00
9	**RUA ANTONIO SAMPAIO**								**R$ 248.118,67**	**R$ 243.998,36**	**R$ 747,73**	**R$ 244.746,09**	**R$ 3.376,73**	0,30%
9.01	**Recapeamento asfáltico**								**R$ 247.370,94**	**R$ 243.998,36**	**R$ 0,00**	**R$ 243.998,36**	**R$ 3.376,73**	
09.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	2136,36	2.136,36		2136,36	0,00	1,40	R$ 2.990,90	R$ 2.990,90	**R$ -**	R$ 2.990,90	R$ -	100,00
09.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	2136,36	2.136,36		2136,36	0,00	2,42	R$ 5.169,99	R$ 5.169,99	**R$ -**	R$ 5.169,99	R$ -	100,00

José Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)	DATA DE INICIO: 02/10/2025	BOLETIM DE MEDIÇÃO 02	NOVATEC
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DE TÉRMINO: 02/01/2026	PERÍODO: 01/11/2025 a 06/03/2026	CONTRATO 351/25
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA		DATA DE MEDIÇÃO: 01/06/2026	

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
09.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	2136,36	2.136,36		2136,36	0,00	1,93	R$ 4.123,17	R$ 4.123,17	R$ -	R$ 4.123,17	R$ -	100,00
09.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m²	116,82	116,82		116,82	0,00	1750,10	R$ 204.443,18	R$ 204.446,33	R$ -	R$ 204.446,33	R$ -	100,00
09.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	8410,90	7.242,83		7242,83	1168,07	2,89	R$ 24.307,49	R$ 20.931,77	R$ -	R$ 20.931,77	R$ 3.375,72	86,11
09.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	5607,26	5.607,26		5607,26	0,00	1,13	R$ 6.336,21	R$ 6.336,20	R$ -	R$ 6.336,20	R$ 0,01	100,00
9.2	**Limpeza**								**R$ 747,73**	**R$ 0,00**	**R$ 747,73**	**R$ 747,73**	**R$ 0,00**	**100,00**
09.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	2136,36	-	**2.136,36**	2136,36	0,00	0,35	R$ 747,73	R$ -	**R$ 747,73**	R$ 747,73	R$ -	100,00
10	**RUA ANTONIO T. LÔBO**								**R$ 97.302,13**	**R$ 95.689,96**	**R$ 292,05**	**R$ 95.982,01**	**R$ 1.323,87**	**98,64%**
10.01	**Recapeamento asfáltico**								**R$ 97.010,08**	**R$ 95.689,96**	**R$ 0,00**	**R$ 95.689,96**	**R$ 1.323,87**	
10.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	834,43	834,43		834,43	0,00	1,40	R$ 1.168,20	R$ 1.168,20	R$ -	R$ 1.168,20	R$ -	100,00
10.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	834,43	834,43		834,43	0,00	2,42	R$ 2.019,32	R$ 2.019,32	R$ -	R$ 2.019,32	R$ -	100,00
10.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	834,43	834,43		834,43	0,00	1,93	R$ 1.610,45	R$ 1.610,45	R$ -	R$ 1.610,45	R$ -	100,00
10.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m²	45,82	45,82		45,82	0,00	1750,10	R$ 80.192,21	R$ 80.195,96	R$ -	R$ 80.195,96	R$ -	100,00
10.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	3299,15	2.841,07		2841,07	458,08	2,89	R$ 9.534,54	R$ 8.210,68	R$ -	R$ 8.210,68	R$ 1.323,86	86,12
10.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	2199,43	2.199,43		2199,43	0,00	1,13	R$ 2.485,36	R$ 2.485,35	R$ -	R$ 2.485,35	R$ 0,01	100,00
10.2	**Limpeza**								**R$ 292,05**	**R$ 0,00**	**R$ 292,05**	**R$ 292,05**	**R$ 0,00**	**100,00**
10.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	834,43	-	**834,43**	834,43	0,00	0,35	R$ 292,05	R$ -	**R$ 292,05**	R$ 292,05	R$ -	100,00
11	**RUA ANTONIO LOURENÇO DOS SANTOS**								**R$ 85.015,51**	**R$ 83.604,58**	**R$ 255,06**	**R$ 83.859,64**	**R$ 1.155,87**	**0,30%**
11.01	**Recapeamento asfáltico**								**R$ 84.760,45**	**R$ 83.604,58**	**R$ 0,00**	**R$ 83.604,58**	**R$ 1.155,87**	
11.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	728,73	728,73		728,73	0,00	1,40	R$ 1.020,22	R$ 1.020,22	R$ -	R$ 1.020,22	R$ -	100,00
11.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	728,73	728,73		728,73	0,00	2,42	R$ 1.763,53	R$ 1.763,53	R$ -	R$ 1.763,53	R$ -	100,00
11.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	728,73	728,73		728,73	0,00	1,93	R$ 1.406,45	R$ 1.406,45	R$ -	R$ 1.406,45	R$ -	100,00
11.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m²	40,04	40,04		40,04	0,00	1750,10	R$ 70.067,88	R$ 70.067,88	R$ -	R$ 70.067,88	R$ -	100,00
11.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	2882,63	2.482,68		2482,68	399,96	2,89	R$ 8.330,79	R$ 7.174,93	R$ -	R$ 7.174,93	R$ 1.155,86	86,13
11.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	1921,75	1.921,75		1921,75	0,00	1,13	R$ 2.171,58	R$ 2.171,57	R$ -	R$ 2.171,57	R$ 0,01	100,00
11.2	**Limpeza**								**R$ 255,06**	**R$ 0,00**	**R$ 255,06**	**R$ 255,06**	**R$ 0,00**	**100,00**
11.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	728,73	-	**728,73**	728,73	0,00	0,35	R$ 255,06	R$ -	**R$ 255,06**	R$ 255,06	R$ -	100,00
12	**RUA ABDOM PINTO MONTEIRO**								**R$ 63.417,19**	**R$ 62.366,02**	**R$ 190,16**	**R$ 62.556,18**	**R$ 861,01**	**0,30%**
12.01	**Recapeamento asfáltico**								**R$ 63.227,03**	**R$ 62.366,02**	**R$ 0,00**	**R$ 62.366,02**	**R$ 861,01**	
12.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	543,32	543,32		543,32	0,00	1,40	R$ 760,65	R$ 760,65	R$ -	R$ 760,65	R$ -	100,00
12.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	543,32	543,32		543,32	0,00	2,42	R$ 1.314,83	R$ 1.314,83	R$ -	R$ 1.314,83	R$ -	100,00
12.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	543,32	543,32		543,32	0,00	1,93	R$ 1.048,61	R$ 1.048,61	R$ -	R$ 1.048,61	R$ -	100,00
12.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m²	29,87	29,87		29,87	0,00	1750,10	R$ 52.268,49	R$ 52.268,49		R$ 52.268,49	R$ -	100,00
12.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	2150,35	1.852,43		1852,43	297,92	2,89	R$ 6.214,52	R$ 5.353,51	R$ -	R$ 5.353,51	R$ 861,01	86,15
12.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	1433,57	1.433,57		1433,57	0,00	1,13	R$ 1.619,93	R$ 1.619,93	R$ -	R$ 1.619,93	R$ -	100,00
12.2	**Limpeza**								**R$ 190,16**	**R$ 0,00**	**R$ 190,16**	**R$ 190,16**	**R$ 0,00**	**100,00**
12.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	543,32	-	**543,32**	543,32	0,00	0,35	R$ 190,16	R$ -	**R$ 190,16**	R$ 190,16	R$ -	100,00
13	**RUA PEDRO PEREIRA DE ANDRADE**								**R$ 61.848,84**	**R$ 60.822,24**	**R$ 185,68**	**R$ 61.007,92**	**R$ 840,92**	**0,30%**
13.01	**Recapeamento asfáltico**								**R$ 61.663,16**	**R$ 60.822,24**	**R$ 0,00**	**R$ 60.822,24**	**R$ 840,92**	
13.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	530,51	530,51		530,51	0,00	1,40	R$ 742,71	R$ 742,71	R$ -	R$ 742,71	R$ -	100,00

José Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nuclec
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)	DATA DE INICIO: 02/10/2025	BOLETIM DE MEDIÇÃO 02	NOVATEC
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DE TÉRMINO: 02/01/2026	PERÍODO: 01/11/2025 a 06/03/2026	CONTRATO 351/25
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA		DATA DE MEDIÇÃO: 01/06/2026	

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
13.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	530,51	530,51		530,51	0,00	2,42	R$ 1.283,83	R$ 1.283,83	R$ -	R$ 1.283,83	R$ -	100,00
13.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	530,51	530,51		530,51	0,00	1,93	R$ 1.023,88	R$ 1.023,88	R$ -	R$ 1.023,88	R$ -	100,00
13.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m²	29,13	29,13		29,13	0,00	1750,10	R$ 50.972,54	R$ 50.972,54		R$ 50.972,54	R$ -	100,00
13.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	2097,04	1.806,07		1806,07	290,98	2,89	R$ 6.060,43	R$ 5.219,52	R$ -	R$ 5.219,52	R$ 840,91	86,12
13.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	1398,02	1.398,02		1398,02	0,00	1,13	R$ 1.579,77	R$ 1.579,76	R$ -	R$ 1.579,76	R$ 0,01	100,00
13.2	**Limpeza**								**R$ 185,68**	**R$ 0,00**	**R$ 185,68**	**R$ 185,68**	**R$ 0,00**	**100,00**
13.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	530,51	-	**530,51**	530,51	0,00	0,35	R$ 185,68	R$ -	**R$ 185,68**	R$ 185,68	R$ -	100,00
14	**RUA JOSÉ FRANCISCO DE MENESES**								**R$ 175.776,57**	**R$ 172.854,48**	**R$ 526,97**	**R$ 173.381,45**	**R$ 2.395,12**	**0,30%**
14.01	**Recapeamento asfáltico**								**R$ 175.249,60**	**R$ 172.854,48**	**R$ 0,00**	**R$ 172.854,48**	**R$ 2.395,12**	
14.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	1505,64	1.505,64		1505,64	0,00	1,40	R$ 2.107,90	R$ 2.107,90	R$ -	R$ 2.107,90	R$ -	100,00
14.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	1505,64	1.505,64		1505,64	0,00	2,42	R$ 3.643,65	R$ 3.643,65	R$ -	R$ 3.643,65	R$ -	100,00
14.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	1505,64	1.505,64		1505,64	0,00	1,93	R$ 2.905,89	R$ 2.905,89	R$ -	R$ 2.905,89	R$ -	100,00
14.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m²	82,78	82,78		82,78	0,00	1750,10	R$ 144.876,78	R$ 144.876,78	R$ -	R$ 144.876,78	R$ -	100,00
14.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	5960,30	5.131,54		5131,54	828,76	2,89	R$ 17.225,28	R$ 14.830,16	R$ -	R$ 14.830,16	R$ 2.395,12	86,10
14.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	3973,54	3.973,54		3973,54	0,00	1,13	R$ 4.490,10	R$ 4.490,10	R$ -	R$ 4.490,10	R$ -	100,00
14.2	**Limpeza**								**R$ 526,97**	**R$ 0,00**	**R$ 526,97**	**R$ 526,97**	**R$ 0,00**	**100,00**
14.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	1505,64	-	**1.505,64**	1505,64	0,00	0,35	R$ 526,97	R$ -	**R$ 526,97**	R$ 526,97	R$ -	100,00
15	**RUA JOÃO MELO RESENDE**								**R$ 149.692,61**	**R$ 147.206,25**	**R$ 448,69**	**R$ 147.654,94**	**R$ 2.037,67**	**0,30%**
15.01	**Recapeamento asfáltico**								**R$ 149.243,92**	**R$ 147.206,25**	**R$ 0,00**	**R$ 147.206,25**	**R$ 2.037,67**	
15.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	1281,97	1.281,97		1281,97	0,00	1,40	R$ 1.794,76	R$ 1.794,76	R$ -	R$ 1.794,76	R$ -	100,00
15.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	1281,97	1.281,97		1281,97	0,00	2,42	R$ 3.102,37	R$ 3.102,37	R$ -	R$ 3.102,37	R$ -	100,00
15.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	1281,97	1.281,97		1281,97	0,00	1,93	R$ 2.474,20	R$ 2.474,20	R$ -	R$ 2.474,20	R$ -	100,00
15.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m²	70,50	70,50		70,50	0,00	1750,10	R$ 123.379,42	R$ 123.379,16	R$ -	R$ 123.379,16	R$ 0,26	100,00
15.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	5075,89	4.370,91		4370,91	704,98	2,89	R$ 14.669,33	R$ 12.631,92	R$ -	R$ 12.631,92	R$ 2.037,41	86,11
15.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	3383,93	3.383,93		3383,93	0,00	1,13	R$ 3.823,84	R$ 3.823,84	R$ -	R$ 3.823,84	R$ -	100,00
15.2	**Limpeza**								**R$ 448,69**	**R$ 0,00**	**R$ 448,69**	**R$ 448,69**	**R$ 0,00**	**100,00**
15.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	1281,97	-	**1.281,97**	1281,97	0,00	0,35	R$ 448,69	R$ -	**R$ 448,69**	R$ 448,69	R$ -	100,00
16	**RUA NELSON ALMEIDA DE OLIVEIRA**								**R$ 103.904,64**	**R$ 102.165,01**	**R$ 311,72**	**R$ 102.476,73**	**R$ 1.427,91**	**0,30%**
16.01	**Recapeamento asfáltico**								**R$ 103.592,92**	**R$ 102.165,01**	**R$ 0,00**	**R$ 102.165,01**	**R$ 1.427,91**	
16.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	890,64	890,64		890,64	0,00	1,40	R$ 1.246,90	R$ 1.246,90	R$ -	R$ 1.246,90	R$ -	100,00
16.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	890,64	890,64		890,64	0,00	2,42	R$ 2.155,35	R$ 2.155,35	R$ -	R$ 2.155,35	R$ -	100,00
16.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	890,64	890,64		890,64	0,00	1,93	R$ 1.718,94	R$ 1.718,94	R$ -	R$ 1.718,94	R$ -	100,00
16.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m²	48,93	48,93		48,93	0,00	1750,10	R$ 85.635,89	R$ 85.635,89		R$ 85.635,89	R$ -	100,00
16.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	3523,10	3.029,02		3029,02	494,08	2,89	R$ 10.181,77	R$ 8.753,86	R$ -	R$ 8.753,86	R$ 1.427,91	85,96
16.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	2348,74	2.352,74		2352,74	0,00	1,13	R$ 2.654,07	R$ 2.654,07		R$ 2.654,07	R$ -	100,00
16.2	**Limpeza**								**R$ 311,72**	**R$ 0,00**	**R$ 311,72**	**R$ 311,72**	**R$ 0,00**	**100,00**
16.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	890,64	-	**890,64**	890,64	0,00	0,35	R$ 311,72	R$ -	**R$ 311,72**	R$ 311,72	R$ -	100,00
17	**RUA JOÃO PAES DA COSTA**								**R$ 103.173,59**	**R$ 101.459,86**	**R$ 309,33**	**R$ 101.769,19**	**R$ 1.404,40**	**0,30%**
17.01	**Recapeamento asfáltico**								**R$ 102.864,26**	**R$ 101.459,86**	**R$ 0,00**	**R$ 101.459,86**	**R$ 1.404,40**	

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)	DATA DE INICIO: 02/10/2025	BOLETIM DE MEDIÇÃO 02	NOVATEC
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DE TÉRMINO: 02/01/2026	PERÍODO: 01/11/2025 a 06/03/2026	CONTRATO 351/25
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA		DATA DE MEDIÇÃO: 01/06/2026	

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
17.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	883,79	883,79		883,79	0,00	1,40	R$ 1.237,31	R$ 1.237,31	R$ -	R$ 1.237,31	R$ -	100,00
17.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	883,79	883,79		883,79	0,00	2,42	R$ 2.138,77	R$ 2.138,77	R$ -	R$ 2.138,77	R$ -	100,00
17.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	883,79	883,79		883,79	0,00	1,93	R$ 1.705,71	R$ 1.705,71	R$ -	R$ 1.705,71	R$ -	100,00
17.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m³	48,59	48,59		48,59	0,00	1750,10	R$ 85.036,48	R$ 85.036,48		R$ 85.036,48	R$ -	100,00
17.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	3498,44	3.012,49		3012,49	485,95	2,89	R$ 10.110,50	R$ 8.706,10	R$ -	R$ 8.706,10	R$ 1.404,40	86,11
17.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	2332,30	2.332,30		2332,30	0,01	1,13	R$ 2.635,49	R$ 2.635,49	R$ -	R$ 2.635,49	R$ -	100,00
17.2	**Limpeza**								**R$ 309,33**	**R$ 0,00**	**R$ 309,33**	**R$ 309,33**	**R$ 0,00**	**100,00**
17.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	883,79	-	**883,79**	883,79	0,00	0,35	R$ 309,33	R$ -	**R$ 309,33**	R$ 309,33	R$ -	100,00
18	**RUA JÚLIO RESENDE**								**R$ 115.931,92**	**R$ 114.006,17**	**R$ 347,87**	**R$ 114.354,04**	**R$ 1.577,88**	**0,30%**
18.01	**Recapeamento asfáltico**								**R$ 115.584,05**	**R$ 114.006,17**	**R$ 0,00**	**R$ 114.006,17**	**R$ 1.577,88**	
18.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	993,91	993,91		993,91	0,00	1,40	R$ 1.391,47	R$ 1.391,47	R$ -	R$ 1.391,47	R$ -	100,00
18.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	993,91	993,91		993,91	0,00	2,42	R$ 2.405,26	R$ 2.405,26	R$ -	R$ 2.405,26	R$ -	100,00
18.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	993,91	993,91		993,91	0,00	1,93	R$ 1.918,25	R$ 1.918,25	R$ -	R$ 1.918,25	R$ -	100,00
18.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m³	54,60	54,60		54,60	0,00	1750,10	R$ 95.547,58	R$ 95.547,58		R$ 95.547,58	R$ -	100,00
18.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	3930,88	3.384,90		3384,90	545,98	2,89	R$ 11.360,23	R$ 9.782,36	R$ -	R$ 9.782,36	R$ 1.577,87	86,11
18.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	2620,58	2.620,58		2620,58	0,00	1,13	R$ 2.961,26	R$ 2.961,25	R$ -	R$ 2.961,25	R$ 0,01	100,00
18.2	**Limpeza**								**R$ 347,87**	**R$ 0,00**	**R$ 347,87**	**R$ 347,87**	**R$ 0,00**	**100,00**
18.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	993,91	-	**993,91**	993,91	0,00	0,35	R$ 347,87	R$ -	**R$ 347,87**	R$ 347,87	R$ -	100,00
19	**RUA ANTÔNIO PEREIRA JÚNIOR**								**R$ 34.550,88**	**R$ 33.978,81**	**R$ 104,07**	**R$ 34.082,88**	**R$ 468,00**	**0,30%**
19.01	**Recapeamento asfáltico**								**R$ 34.446,81**	**R$ 33.978,81**	**R$ 0,00**	**R$ 33.978,81**	**R$ 468,00**	
19.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	297,35	297,35		297,35	0,00	1,40	R$ 416,29	R$ 416,29	R$ -	R$ 416,29	R$ -	100,00
19.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	297,35	297,35		297,35	0,00	2,42	R$ 719,59	R$ 719,59	R$ -	R$ 719,59	R$ -	100,00
19.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	297,35	297,35		297,35	0,00	1,93	R$ 573,89	R$ 573,89	R$ -	R$ 573,89	R$ -	100,00
19.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m²	16,27	16,27		16,27	0,00	1750,10	R$ 28.469,75	R$ 28.469,75		R$ 28.469,75	R$ -	100,00
19.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	1171,26	1.009,32		1009,32	161,94	2,89	R$ 3.384,94	R$ 2.916,94	R$ -	R$ 2.916,94	R$ 468,00	86,17
19.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	780,84	780,84		780,84	0,00	1,13	R$ 882,35	R$ 882,35	R$ -	R$ 882,35	R$ -	100,00
19.2	**Limpeza**								**R$ 104,07**	**R$ 0,00**	**R$ 104,07**	**R$ 104,07**	**R$ 0,00**	**100,00**
19.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	297,35	-	**297,35**	297,35	0,00	0,35	R$ 104,07	R$ -	**R$ 104,07**	R$ 104,07	R$ -	100,00
20	**RUA JOSÉ OSVALDO TAVARES**								**R$ 162.516,16**	**R$ 159.819,98**	**R$ 487,45**	**R$ 160.307,43**	**R$ 2.210,73**	**0,30%**
20.01	**Recapeamento asfáltico**								**R$ 162.030,71**	**R$ 159.819,98**	**R$ 0,00**	**R$ 159.819,98**	**R$ 2.210,73**	
20.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	1392,72	1.392,72		1392,72	0,00	1,40	R$ 1.949,81	R$ 1.949,81	R$ -	R$ 1.949,81	R$ -	100,00
20.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	1392,72	1.392,72		1392,72	0,00	2,42	R$ 3.370,38	R$ 3.370,38	R$ -	R$ 3.370,38	R$ -	100,00
20.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	1392,72	1.392,72		1392,72	0,00	1,93	R$ 2.687,95	R$ 2.687,95	R$ -	R$ 2.687,95	R$ -	100,00
20.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m³	76,54	76,54		76,54	0,00	1750,10	R$ 133.945,65	R$ 133.945,65		R$ 133.945,65	R$ -	100,00
20.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	5510,59	4.745,63		4745,63	764,96	2,89	R$ 15.925,61	R$ 13.714,88	R$ -	R$ 13.714,88	R$ 2.210,73	86,12
20.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	3673,73	3.673,73		3673,73	0,00	1,13	R$ 4.151,31	R$ 4.151,31	R$ -	R$ 4.151,31	R$ -	100,00
20.2	**Limpeza**								**R$ 487,45**	**R$ 0,00**	**R$ 487,45**	**R$ 487,45**	**R$ 0,00**	**100,00**
20.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	1392,72	-	**1.392,72**	1392,72	0,00	0,35	R$ 487,45	R$ -	**R$ 487,45**	R$ 487,45	R$ -	100,00
21	**RUA FILOMENA DE ANDRADE**								**R$ 39.228,59**	**R$ 38.575,77**	**R$ 118,09**	**R$ 38.693,86**	**R$ 534,65**	**0,30%**

Jose Arnaldo do N Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)	DATA DE INICIO: 02/10/2025	BOLETIM DE MEDIÇÃO 02	NOVATEC Construções e Empreendimentos Ltda.
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DE TÉRMINO: 02/01/2026	PERÍODO: 01/11/2025 a 06/03/2026	CONTRATO 351/25
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA		DATA DE MEDIÇÃO: 01/06/2026	

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
21.01	**Recapeamento asfáltico**								**R$ 39.110,50**	**R$ 38.575,77**	**R$ 0,00**	**R$ 38.575,77**	**R$ 534,65**	
21.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	337,41	337,41		337,41	0,00	1,40	R$ 472,37	R$ 472,37	**R$ -**	R$ 472,37	R$ -	100,00
21.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	337,41	337,41		337,41	0,00	2,42	R$ 816,53	R$ 816,53	**R$ -**	R$ 816,53	R$ -	100,00
21.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	337,41	337,41		337,41	0,00	1,93	R$ 651,20	R$ 651,20	**R$ -**	R$ 651,20	R$ -	100,00
21.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m³	18,47	18,47		18,47	0,00	1750,10	R$ 32.325,22	R$ 32.325,22		R$ 32.325,22	R$ -	100,00
21.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	1329,88	1.144,85		1144,85	185,03	2,89	R$ 3.843,34	R$ 3.308,61	**R$ -**	R$ 3.308,61	R$ 534,65	86,09
21.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	886,58	886,58		886,58	0,00	1,13	R$ 1.001,84	R$ 1.001,84	**R$ -**	R$ 1.001,84	R$ -	100,00
21.2	**Limpeza**								**R$ 118,09**	**R$ 0,00**	**R$ 118,09**	**R$ 118,09**	**R$ 0,00**	**100,00**
21.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	337,41	-	**337,41**	337,41	0,00	0,35	R$ 118,09	R$ -	**R$ 118,09**	R$ 118,09	R$ -	100,00
22	**AV. DR PEDRO GARCIA MORENO**								**R$ 1.079.129,06**	**R$ 1.061.208,77**	**R$ 3.235,49**	**R$ 1.064.444,26**	**R$ 14.676,03**	**0,30%**
22.01	**Recapeamento asfáltico**								**R$ 1.075.893,57**	**R$ 1.061.208,77**	**R$ 0,00**	**R$ 1.061.208,77**	**R$ 14.676,03**	
22.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	9244,27	9.244,27		9244,27	0,00	1,40	R$ 12.941,98	R$ 12.941,98	**R$ -**	R$ 12.941,98	R$ -	100,00
22.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	9244,27	9.244,27		9244,27	0,00	2,42	R$ 22.371,13	R$ 22.371,13	**R$ -**	R$ 22.371,13	R$ -	100,00
22.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	9244,27	9.244,27		9244,27	0,00	1,93	R$ 17.841,44	R$ 17.841,44	**R$ -**	R$ 17.841,44	R$ -	100,00
22.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m³	508,21	508,21		508,21	0,00	1750,10	R$ 889.426,45	R$ 889.426,80	**R$ -**	R$ 889.426,80		100,00
22.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	36591,37	31.509,32		31509,32	5082,05	2,89	R$ 105.749,07	R$ 91.061,93	**R$ -**	R$ 91.061,93	R$ 14.676,02	86,11
22.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	24394,25	24.394,25		24394,25	0,00	1,13	R$ 27.565,50	R$ 27.565,49	**R$ -**	R$ 27.565,49	R$ 0,01	100,00
22.2	**Limpeza**								**R$ 3.235,49**	**R$ 0,00**	**R$ 3.235,49**	**R$ 3.235,49**	**R$ 0,00**	**100,00**
22.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	9244,27	-	**9.244,27**	9244,27	0,00	0,35	R$ 3.235,49	R$ -	**R$ 3.235,49**	R$ 3.235,49	R$ -	100,00
23	**TRECHO PRIMITIVO- RUA PROJETADA**								**R$ 75.429,29**	**R$ 74.801,71**	**R$ 122,37**	**R$ 74.924,08**	**R$ 503,80**	**0,16%**
23.01	**Recapeamento asfáltico**								**R$ 75.306,92**	**R$ 74.801,71**	**R$ 0,00**	**R$ 74.801,71**	**R$ 503,80**	
23.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	349,63	349,63		349,63	0,00	1,40	R$ 489,48	R$ 489,48	**R$ -**	R$ 489,48	R$ -	100,00
23.01.002	Recomposição de base e ou sub-base para remendo profundo de solo brita (40/60) com cimento (teor de 6%) - incluso retirada e coloc ação do material af_12/2020	m³	104,89	104,89		104,89	0,00	325,34	R$ 34.124,59	R$ 34.124,58	**R$ -**	R$ 34.124,58	R$ 0,01	100,00
23.01.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km(unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	1674,03	1.674,03		1674,03	0,00	2,89	R$ 4.837,94	R$ 4.837,94	**R$ -**	R$ 4.837,94	R$ -	100,00
23.01.005	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	349,63	349,63		349,63	0,00	1,93	R$ 674,79	R$ 674,79	**R$ -**	R$ 674,79	R$ -	100,00
23.01.006	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m³	17,48	17,48		17,48	0,00	1750,10	R$ 30.594,37	R$ 30.594,37	**R$ -**	R$ 30.594,37	R$ -	100,00
23.01.007	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	1258,67	1.083,86		1083,86	174,81	2,89	R$ 3.637,55	R$ 3.132,36	**R$ -**	R$ 3.132,36	R$ 503,78	
23.01.008	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	839,11	839,11		839,11	0,00	1,13	R$ 948,20	R$ 948,19	**R$ -**	R$ 948,19	R$ 0,01	
23.2	**Limpeza**								**R$ 122,37**	**R$ 0,00**	**R$ 122,37**	**R$ 122,37**		**100,00**
23.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	349,63	-	**349,63**	349,63	0,00	0,35	R$ 122,37	R$ -	**R$ 122,37**	R$ 122,37	R$ -	100,00
24	**SINALIZAÇÃO**								**R$ 221.594,64**	**R$ 0,00**	**R$ 73.316,36**	**R$ 73.316,36**		**33,09**
24.07.001	Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo i por extrusão - relevo duplo com base	m²	900,00	0	**381,12**	381,12	518,88	124,91	R$ 112.419,00	R$ -	**R$ 47.605,69**	R$ 47.605,69	R$ 64.813,31	42,35
24.07.002	Pintura de faixa com plástico a frio tricomponente à base de resinas metacrílicas por aspersão - espessura de 0,6 mm	m²	1222,56	0	**201,00**	201,00	1021,56	78,99	R$ 96.570,01	R$ -	**R$ 15.876,99**	R$ 15.876,99	R$ 80.693,02	16,44
24.07.003	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	12,50	0	**10,50**	10,50	2,00	505,09	R$ 6.313,63	R$ -	**R$ 5.303,44**	R$ 5.303,44	R$ 1.008,89	84,00
24.07.004	Fornecimento e instalação de suporte de madeira para placas de si nalização, em solo, com h= de 2,0 m e seção de 7,5 x 7,5 cm. af_0 3/2022	UN	50,00	0	**36,00**	36,00	14,00	125,84	R$ 6.292,00	R$ -	**R$ 4.530,24**	R$ 4.530,24	R$ 1.761,76	72,00
25	**PROJETO**								**R$ 65.323,68**	**R$ 13.957,04**	**R$ 0,00**	**R$ 13.957,04**	**R$ 51.366,64**	**21,37**
25.01.001	Projeto Executivo	km	3,88	0,83		0,83	3,05	16.836,00	R$ 65.323,68	R$ 13.957,04	**R$ -**	R$ 13.957,04	R$ 51.366,64	21,37
TOTAL DO ORÇAMENTO									**R$ 4.371.658,75**	**R$ 4.029.775,19**	**R$ 100.826,34**	**R$ 4.130.601,53**	**R$ 241.057,22**	**94,47%**
										92,17%	**2,30%**	**94,47%**	**5,53%**	

Jose Arnaldo de N Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)	DATA DE INICIO: 02/10/2025	BOLETIM DE MEDIÇÃO 02	NOVATEC Construções e Empreendimentos Ltda.
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DE TÉRMINO: 02/01/2026	PERÍODO: 01/11/2025 a 06/03/2026	CONTRATO 351/25
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA		DATA DE MEDIÇÃO: 01/06/2026	

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido

ASSINATURA RESPONSÁVEL TÉCNICO	ASSINATURA FISCALIZAÇÃO	VALOR DA MEDIÇÃO: R$100.826,34 (cento e um mil quinhentos e oitenta e um reais e trinta e oito centavos).
		DATA LIBERAÇÃO : _____/_____/_____

gov.br Documento assinado digitalmente
RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJ
Data: 11/06/2026 11:56:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415

José Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 351/25
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 01/11/2025 a 06/03/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
01.01	Equipe Dirigente	QUANT CONTRATO	QUANT MEDIDA
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
		0,10	0,008
EXECUTADO NO PERÍODO:			0,00800
ACUMULADO ANTERIOR:			0,09
ACUMULADO ATUAL:			0,10
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
À MEDIR NO PERÍODO:			0,008

Jose Arnaldo da N Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 351/25
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 01/11/2025 a 06/03/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
01.02	Manutenção do Canteiro	QUANT CONTRATO	QUANT MEDIDA
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
		0,15	0,012
EXECUTADO NO PERÍODO:			0,01200
ACUMULADO ANTERIOR:			0,13800
ACUMULADO ATUAL:			0,15
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
À MEDIR NO PERÍODO:			0,012

José Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 351/25
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 01/11/2025 a 06/03/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
01.03	Equipamentos de Apoio à Produção	QUANT CONTRATO	QUANT MEDIDA
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
		0,15	0,012
EXECUTADO NO PERÍODO:			0,01200
ACUMULADO ANTERIOR:			0,13800
ACUMULADO ATUAL:			0,15
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
À MEDIR NO PERÍODO:			0,012

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 351/25
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 01/11/2025 a 06/03/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
2	RUA VESTA MARIA DE GÓIS		
02.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	ÁREA
	RUA VESTA MARIA DE GÓIS		3.362,59
De acordo com o projeto topográfico		3.362,59	3362,59
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	3.362,59
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			3.362,59
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			3.362,59
A MEDIR NO PERÍODO:			3.362,59

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 351/25
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 01/11/2025 a 06/03/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
3	RUA LOURENÇO ALVES DOS SANTOS		
10.01.006	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	ÁREA
	RUA LOURENÇO ALVES DOS SANTOS		2.479,73
De acordo com o projeto topográfico		2.479,73	2479,73
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	2.479,73
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			0,00
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			2.479,73
À MEDIR NO PERÍODO:			2.479,73

José Arnaldo da N. Pereira Júnior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 351/25
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 01/11/2025 a 06/03/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
4	RUA JOSEFA CIPRIANO DE CARVALHO		
04.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	ÁREA
	RUA JOSEFA CIPRIANO DE CARVALHO		910,96
De acordo com o projeto topográfico		910,96	910,96
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	910,96
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			910,96
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			910,96
À MEDIR NO PERÍODO:			910,96

José Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031599
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 351/25
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 01/11/2025 a 06/03/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
5	RUA AMAZILDE MENEZES SAMPAIO		
05.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	ÁREA
	RUA AMAZILDE MENEZES SAMPAIO		1.219,58
De acordo com o projeto topográfico		1.219,58	1219,58
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	1.219,58
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			0,00
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			1.219,58
A MEDIR NO PERÍODO:			1.219,58

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPI DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 351/25
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 01/11/2025 a 06/03/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
6	RUA MIGUEL ALVES DOS SANTOS		
06.21.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	ÁREA
	RUA MIGUEL ALVES DOS SANTOS		1.485,56
De acordo com o projeto topográfico		1.485,56	1485,56
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	1.485,56
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			0,00
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			1.485,56
A MEDIR NO PERÍODO:			1.485,56

José Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 351/25
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 01/11/2025 a 06/03/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
7	RUA JOÃO ANDRADE		
07.02.006	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	ÁREA
	RUA JOÃO ANDRADE		1.100,82
De acordo com o projeto topográfico		1.100,82	1100,82
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	1.100,82
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			1.100,82
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			1.100,82
A MEDIR NO PERÍODO:			1.100,82

José Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 351/25
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 01/11/2025 a 06/03/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
8	RUA AGDO OLIVEIRA SANTOS		
08.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	ÁREA
	RUA AGDO OLIVEIRA SANTOS		
De acordo com o projeto topográfico		582,80	582,80
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	582,80
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			582,80
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
À MEDIR NO PERÍODO:			582,80

José Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 351/25
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 01/11/2025 a 06/03/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
9	RUA ANTONIO SAMPAIO		
09.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	ÁREA
	RUA ANTONIO SAMPAIO		2.136,36
De acordo com o projeto topográfico		2.136,36	2136,36
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	2.136,36
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			2.136,36
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			2.136,36

João Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 351/25
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 01/11/2025 a 06/03/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
10	RUA ANTONIO T. LÔBO		
10.01.006	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	ÁREA
	RUA ANTONIO T. LÔBO		834,43
De acordo com o projeto topográfico		834,43	834,43
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	834,43
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			834,43
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			834,43

José Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 351/25
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 01/11/2025 a 06/03/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
11	RUA ANTONIO LOURENÇO DOS SANTOS		
11.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	ÁREA
	RUA ANTONIO LOURENÇO DOS SANTOS		728,73
De acordo com o projeto topográfico		728,73	728,73
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	728,73
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			728,73
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
À MEDIR NO PERÍODO:			728,73

José Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 351/25
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 01/11/2025 a 06/03/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
12	RUA ABDOM PINTO MONTEIRO		
12.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	ÁREA
	RUA ABDOM PINTO MONTEIRO		
	De acordo com o projeto topográfico	543,32	543,32
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	543,32
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			543,32
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
À MEDIR NO PERÍODO:			543,32

José Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 27/1031699
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 351/25
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 01/11/2025 a 06/03/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
13	RUA PEDRO PEREIRA DE ANDRADE		
13.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	ÁREA
	RUA PEDRO PEREIRA DE ANDRADE		
De acordo com o projeto topográfico		530,51	530,51
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	530,51
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			530,51
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
À MEDIR NO PERÍODO:			530,51

José Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil/CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 351/25
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 01/11/2025 a 06/03/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
14	RUA JOSÉ FRANCISCO DE MENESES		
14.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	ÁREA
	RUA JOSÉ FRANCISCO DE MENESES		1.505,64
De acordo com o projeto topográfico		1.505,64	1505,64
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	1.505,64
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			1.505,64
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			1.505,64

João Arnaldo de A. Pereira Junior
Eng. Civil CREA: 2121031699
Coordenador do Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 351/25
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 01/11/2025 a 06/03/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
15	RUA JOÃO MELO RESENDE		
15.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	ÁREA
	RUA JOÃO MELO RESENDE		1.281,97
De acordo com o projeto topográfico		1.281,97	1281,97
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	1.281,97
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			1.281,97
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
À MEDIR NO PERÍODO:			1.281,97

José Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 351/25
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 01/11/2025 a 06/03/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
16	RUA NELSON ALMEIDA DE OLIVEIRA		
16.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	ÁREA
	RUA NELSON ALMEIDA DE OLIVEIRA		890,64
De acordo com o projeto topográfico		890,64	890,64
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	890,64
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			890,64
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
À MEDIR NO PERÍODO:			890,64

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 351/25
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 01/11/2025 a 06/03/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
17	RUA JOÃO PAES DA COSTA		
17.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	ÁREA
	RUA JOÃO PAES DA COSTA		883,79
De acordo com o projeto topográfico		883,79	883,79
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	883,79
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			883,79
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			883,79

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 351/25
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 01/11/2025 a 06/03/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
18	RUA JÚLIO RESENDE		
02.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	ÁREA
	RUA JÚLIO RESENDE		993,91
De acordo com o projeto topográfico		993,91	993,91
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	993,91
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			993,91
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
À MEDIR NO PERÍODO:			993,91

José Arnaldo da N. Pereira Júnior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 351/25
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 01/11/2025 a 06/03/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
19	RUA ANTÔNIO PEREIRA JÚNIOR		
19.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	ÁREA
	RUA ANTÔNIO PEREIRA JÚNIOR		297,35
De acordo com o projeto topográfico		297,35	297,35
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	297,35
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			297,35
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			297,35

José Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 351/25
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 01/11/2025 a 06/03/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
20	RUA JOSÉ OSVALDO TAVARES		
20.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	ÁREA
	RUA JOSÉ OSVALDO TAVARES		1.392,72
De acordo com o projeto topográfico		1.392,72	1392,72
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	1.392,72
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			1.392,72
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			1.392,72

José Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 351/25
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 01/11/2025 a 06/03/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
21	RUA FILOMENA DE ANDRADE		
21.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	ÁREA
	RUA FILOMENA DE ANDRADE		337,41
De acordo com o projeto topográfico		337,41	337,41
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	337,41
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			337,41
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
À MEDIR NO PERÍODO:			337,41

Jose Arnaldo do N Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 351/25
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 01/11/2025 a 06/03/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
14	RUA JOSÉ FRANCISCO DE MENESES		
22.01.007	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	ÁREA
	RUA JOSÉ FRANCISCO DE MENESES		9.244,27
De acordo com o projeto topográfico		9.244,27	9244,27
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	9.244,27
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			9.244,27
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
À MEDIR NO PERÍODO:			9.244,27

José Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 351/25
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 01/11/2025 a 06/03/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
23	TRECHO PRIMITIVO- RUA PROJETADA		
23.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	ÁREA
	TRECHO PRIMITIVO- RUA PROJETADA		349,63
De acordo com o projeto topográfico		349,63	349,63
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	349,63
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			349,63
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
À MEDIR NO PERÍODO:			349,63

José Arnaldo de [illegible] Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031699
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 351/25
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 01/11/2025 a 06/03/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
24	SINALIZAÇÃO			
24.07.001	Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo i por extrusão - relevo duplo com base	EXTENSÃOA VIA	LARGURA DA SINALIZAÇÃO	QUANTIDADE TOTAL
	SINALIZAÇÃO	m	m	m²
	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EIXO E BORDO			
EIXO		3811,20	0,1	381,12
EXECUTADO NO PERÍODO:				381,12
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				381,12
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)				0,00
A MEDIR NO PERÍODO:				381,12

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721039899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 351/25
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 01/11/2025 a 06/03/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND			
24	SINALIZAÇÃO				
24.07.002	Pintura de faixa com plástico a frio tricomponente à base de resinas metacrílicas por aspersão - espessura de 0,6 mm	LARGURA DA VIA	LARGURA DA SINALIZAÇÃO	QUANTIDADE DE FAIXAS	QUANTIDADE TOTAL
	SINALIZAÇÃO	m	m	UN	m²
	FAIXA DE PEDESTRE				
FAIXA DE PEDESTRE		6,70	3,00	10,00	201,00
EXECUTADO NO PERÍODO:					201,00
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					201,00
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)					0,00
À MEDIR NO PERÍODO:					201,00

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 351/25
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 01/11/2025 a 06/03/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
24	SINALIZAÇÃO			
24.07.003	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	QUANTIDADE	ÁREA DA PLACA	QUANTIDADE TOTAL
	SINALIZAÇÃO	m²		m²
		42,00	0,25	10,50
EXECUTADO NO PERÍODO:				10,50
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				10,50
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)				0,00
À MEDIR NO PERÍODO:				10,50

José Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 351/25
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 01/11/2025 a 06/03/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
24	SINALIZAÇÃO		
24.07.004	Fornecimento e instalação de suporte de madeira para placas de si nalização, em solo, com h= de 2,0 m e seção de 7,5 x 7,5 cm. af_03/2022	QUANTIDADE	QUANTIDADE TOTAL
	SINALIZAÇÃO	UN	UN
		36,00	36,00
EXECUTADO NO PERÍODO:			36,00
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			36,00
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
À MEDIR NO PERÍODO:			36,00

gov.br Documento assinado digitalmente
RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJ
Data: 11/06/2026 11:56:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415

José Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 351/25
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 01/11/2025 a 06/03/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
3	RUA LOURENÇO ALVES DOS SANTOS		
03.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	ÁREA
	RUA LOURENÇO ALVES DOS SANTOS		2.479,73
		2.479,73	2479,73
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	2.479,73
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			2.479,73
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			2.479,73

José Arnaldo de N. Pereira Junior
CREA - 2721031699
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)

LOCAL DA OBRA: RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE

CONTRATO: 351/2025

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

MEDIÇÃO 01

Período: 01/11/2025 a 06/03/2026

Data da medição:01/06/2026

ITEM	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

FOTO 01 - RUA NELSON A. OLIVEIRA

FOTO 02 - RUA JOÃO MELO RESENDE

FOTO 03 - RUA VESTA MARIA DE GÓIS

FOTO 04 - RUA LOURENÇO ALVES DOS SANTOS

FOTO 05 - RUA ANTONIO T. LOBO

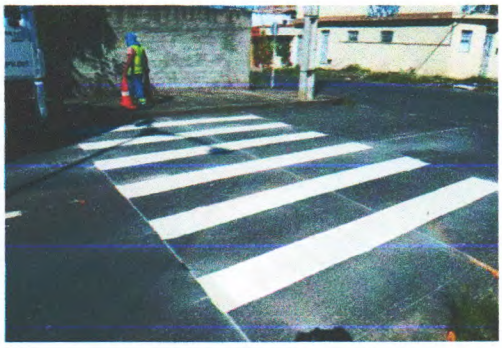

FOTO 06 - RUA VESTA MARIA DE GÓIS

FOTO 07 - RUA AGDO DE OLIVEIRA SANTOS

Jose Arnaldo do N Pereira Júnior
Eng. Civil CREA - 2721031894
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

FOTO 08 - RUA ANTONIO SAMPAIO

OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)

LOCAL DA OBRA: RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE

CONTRATO: 351/2025

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

MEDIÇÃO 02

Período: 01/11/2025 a 06/03/2026

Data da medição: 01/06/2026

ITEM	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

FOTO 09 - RUA JOSEFA CIPRIANO DE CARVALHO

FOTO 10 - RUA AMAZILDE MENEZES SAMPAIO

FOTO 11 - RUA MIGUEL ALVES DOS SANTOS

FOTO 12 - AV. DR. PEDRO GARCIA MORENO

FOTO 13 - AV. DR. PEDRO GARCIA MORENO

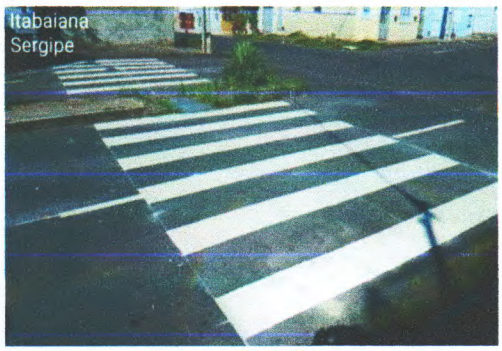

FOTO 14 - RUA JÚLIO REZENDE

FOTO 15 - RUA ANTONIO P. JÚNIOR

Jose Arnaldo N Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031839
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

FOTO 16 - FILOMENA ANDRADE

OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)

LOCAL DA OBRA: RUAS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-SE

CONTRATO: 351/2025

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

MEDIÇÃO 02

Período: 01/11/2025 a 06/03/2026

Data da medição: 01/06/2026

ITEM	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

FOTO 17 - TRAVESSA JOÃO PAES DA COSTA

FOTO 18 - RUA JOSÉ OLIVEIRA TAVARES

FOTO 19 - RUA ABDON PINTO

FOTO 20 - RUA JOÃO ANDRADE

FOTO 21 - RUA ANTÔNIO LOURENÇO

FOTO 22 - RUA JOSÉ FRANCISCO DE MENEZES

FOTO 23 - RUA PEDRO P. ANDRADE

FOTO 24 - TRECHO PRIMITIVO

João Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Documento assinado digitalmente
RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJO
Data: 11/06/2026 11:56:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
