Obra:	REFORMA E CONSTRUÇÃO NO CIE (CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE)		BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO Nº: 194/2026
Contratada:	SALVATORE EMPREENDIMENTOS LTDA	Salvatore	B.M.Nº: 03	Data da medição: 23/09/2026
CNPJ:	14.490.446/0001-56		Período: 22/08/2026 à 23/09/2026	

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R$)	Valores (R$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
00.001□	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**								**31.471,20**	**10.700,21**	**4.720,68**	**15.420,89**	**16.050,31**	**49,00%**
00.001.001□	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	120,00	40,80	18,00	58,80	61,20	134,90	16.188,00	5.503,92	2.428,20	7.932,12	8.255,88	49,00%
00.001.002□	Mestre de obras com encargos complementares	h	240,00	81,60	36,00	117,60	122,40	63,68	15.283,20	5.196,29	2.292,48	7.488,77	7.794,43	49,00%
00.002□	**SEVIÇOS PRELIMINARES**								**43.288,53**	**43.288,53**	**0,00**	**43.288,53**	**0,00**	**100,00%**
00.002.001□	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	10,00	10,00		10,00	0,00	413,23	4.132,30	4.132,30	0,00	4.132,30	0,00	100,00%
00.002.002□	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	206,27	206,27		206,27	0,00	189,83	39.156,23	39.156,23	0,00	39.156,23	0,00	100,00%
00.003□	**ESTACIONAMENTO**								**16.235,06**	**16.235,06**	**0,00**	**16.235,06**	**0,00**	**100,00%**
00.003.001□	Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia	m2	226,62	226,62		226,62	0,00	71,64	16.235,06	16.235,06	0,00	16.235,06	0,00	100,00%
00.004□	**PASSEIO (CALÇADA)**								**11.839,70**	**8.000,81**	**0,00**	**8.000,81**	**3.838,89**	**67,58%**
00.004.001□	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	130,61	130,61		130,61	0,00	31,87	4.162,54	4.162,54	0,00	4.162,54	0,00	100,00%
00.004.002□	Lona plástica preta	m2	130,61	130,61		130,61	0,00	6,33	826,76	826,76	0,00	826,76	0,00	100,00%
00.004.003□	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	130,31	130,31		130,31	0,00	52,57	6.850,40	6.850,40	0,00	6.850,40	0,00	100,00%
00.005□	**MURO**								**130.048,60**	**20.799,39**	**14.157,05**	**34.956,44**	**95.092,16**	**26,88%**
00.005.001□	Demolição de reboco	m2	380,08	114,02	266,06	380,08	0,00	10,88	4.135,27	1.240,54	2.894,73	4.135,27	0,00	100,00%
00.005.002□	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	380,08	114,02	266,06	380,08	0,00	42,33	16.088,79	4.826,47	11.262,32	16.088,79	0,00	100,00%
00.005.003□	Remoção e reassentamento de esquadria de ferro	m2	36,72	36,72		36,72	0,00	66,65	2.447,39	2.447,39	0,00	2.447,39	0,00	100,00%
00.005.004□	Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces, inclusive portão	m2	36,72	36,72		36,72	0,00	224,39	8.239,60	8.239,60	0,00	8.239,60	0,00	100,00%
00.005.005□	Portão em ferro, com barra quadrada de 5/8" na vertical, duas barras de quadrada de 1" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1"	m2	19,60	19,60		19,60	0,00	689,22	13.508,71	13.508,71	0,00	13.508,71	0,00	100,00%
00.005.006□	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	1.549,06	542,17		542,17	1.006,89	51,25	79.389,32	27.786,21	0,00	27.786,21	51.603,11	35,00%
00.005.007□	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	208,54	208,54		208,54	0,00	9,15	1.908,14	1.908,14	0,00	1.908,14	0,00	100,00%
00.005.008□	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	208,54	208,54		208,54	0,00	20,77	4.331,38	4.331,38	0,00	4.331,38	0,00	100,00%
00.006□	**ÁREA PISCINA**								**29.916,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.916,00**	**0,00%**
00.006.001□	Gradil em alumínio anodizado branco, com barras de apoio em alumínio anodizado branco de 2"x2" e barras intermediárias e verticais em alumínio anodizado branco de 1" x 1/2"	m2	74,34			0,00	74,34	399,05	29.665,38	0,00	0,00	0,00	29.665,38	0,00%
00.006.002□	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	un	3,00			0,00	3,00	83,54	250,62	0,00	0,00	0,00	250,62	0,00%
00.007□	**CONSTRUÇÃO DE QUADRA VOLEI DE AREIA**								**80.173,72**	**11.153,77**	**40.917,93**	**52.071,70**	**28.102,02**	**64,95%**
00.007.001□	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	16,40	16,40		16,40	0,00	65,37	1.072,07	1.072,07	0,00	1.072,07	0,00	100,00%
00.007.002□	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021	m3	2,05	2,05		2,05	0,00	511,14	1.047,84	1.047,84	0,00	1.047,84	0,00	100,00%
00.007.003□	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	13,20	13,20		13,20	0,00	577,69	7.625,51	7.625,51	0,00	7.625,51	0,00	100,00%
00.007.004□	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	31,60	22,12	9,48	31,60	0,00	63,67	2.011,97	1.408,38	603,59	2.011,97	0,00	100,00%
00.007.005□	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	63,20		31,60	31,60	31,60	42,33	2.675,26	0,00	1.337,63	1.337,63	1.337,63	50,00%

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA-272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rykelme Mendonça de Jesus
Eng. Civil CREA-272345146-1
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra:	REFORMA E CONSTRUÇÃO NO CIE (CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE)		BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO Nº: 194/2026
Contratada:	SALVATORE EMPREENDIMENTOS LTDA		B.M.Nº: 03	
CNPJ:	14.490.446/0001-56		Período: 22/08/2026 à 23/09/2026	Data da medição: 23/09/2026

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R$)	Valores (R$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
00.007.006	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	63,20			0,00	63,20	51,25	3.239,00	0,00	0,00	0,00	3.239,00	0,00%
00.007.007	Peça de eucalipto tratado, d= 19 a 22cm, L = 6,00m - Fornecimento	un	42,00		30,00	30,00	12,00	762,17	32.011,14	0,00	22.865,10	22.865,10	9.146,04	71,43%
00.007.008	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	0,30		0,30	0,30	0,00	610,72	183,22	0,00	183,22	183,22	0,00	100,00%
00.007.009	Tela fortinet, revestida em pvc, fio 2.5mm, malha 5x10cm com altura = 1,22 m, da Belgo Cercas ou similar, inclusive arame 14 verde de amarração e instalação	m	213,77			0,00	213,77	60,49	12.930,95	0,00	0,00	0,00	12.930,95	0,00%
00.007.010	Dreno espinha de peixe (seção (0,40 x 0,40 m), com tubo de pead corrugado perfurado, dn 100 mm, enchimento com brita, envolvido com manta geotêxtil, inclusive conexões. af_07/2021	m	65,30		65,30	65,30	0,00	86,82	5.669,35	0,00	5.669,35	5.669,35	0,00	100,00%
00.007.011	Colchão de areia	m3	74,90		74,90	74,90	0,00	136,97	10.259,05	0,00	10.259,05	10.259,05	0,00	100,00%
00.007.012	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1,00			0,00	1,00	1.149,31	1.149,31	0,00	0,00	0,00	1.149,31	0,00%
00.007.013	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00			0,00	1,00	299,05	299,05	0,00	0,00	0,00	299,05	0,00%
00.008	**CIRCULAÇÃO ÁREA EXTERNA (FUNDO DO GINÁSIO)**								**99.910,24**	**0,00**	**10.931,79**	**10.931,79**	**88.978,45**	**10,94%**
00.008.001	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	2.002,16		2.002,16	2.002,16	0,00	5,46	10.931,79	0,00	10.931,79	10.931,79	0,00	100,00%
00.008.002	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=10cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	741,24			0,00	741,24	120,04	88.978,45	0,00	0,00	0,00	88.978,45	0,00%
00.009	**CANTEIRO (PRAÇA)**								**20.625,07**	**0,00**	**9.537,42**	**9.537,42**	**11.087,66**	**46,24%**
00.009.001	Lona plástica preta	m2	141,07		141,07	141,07	0,00	6,33	892,97	0,00	892,97	892,97	0,00	100,00%
00.009.002	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	141,07		141,07	141,07	0,00	52,57	7.416,05	0,00	7.416,05	7.416,05	0,00	100,00%
00.009.003	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	2,00			0,00	2,00	1.147,77	2.295,54	0,00	0,00	0,00	2.295,54	0,00%
00.009.004	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	28,20		28,20	28,20	0,00	43,56	1.228,39	0,00	1.228,39	1.228,39	0,00	100,00%
00.009.005	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar.	Un	3,00			0,00	3,00	826,78	2.480,34	0,00	0,00	0,00	2.480,34	0,00%
00.009.006	Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Sergipark ou similar	Un	1,00			0,00	1,00	1.227,10	1.227,10	0,00	0,00	0,00	1.227,10	0,00%
00.009.007	Equipamento de ginástica - jogo de barras - galvanizado - Rev 01	un	1,00			0,00	1,00	5.084,68	5.084,68	0,00	0,00	0,00	5.084,68	0,00%
00.010	**CANTEIRO LATERAL (LESTE)**								**6.609,41**	**0,00**	**2.362,69**	**2.362,69**	**4.246,72**	**35,75%**
00.010.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	54,24		54,24	54,24	0,00	43,56	2.362,69	0,00	2.362,69	2.362,69	0,00	100,00%
00.010.002	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	51,20			0,00	51,20	37,35	1.912,32	0,00	0,00	0,00	1.912,32	0,00%
00.010.003	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	10,00			0,00	10,00	233,44	2.334,40	0,00	0,00	0,00	2.334,40	0,00%
00.011	**PAVIMENTAÇÃO LATERAL (LESTE)**								**34.081,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.081,76**	**0,00%**

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA-272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rykelme Mendonça de Jesus
Eng. Civil CREA-272345146-1
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra:	REFORMA E CONSTRUÇÃO NO CIE (CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE)		BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO Nº: 194/2026
Contratada:	SALVATORE EMPREENDIMENTOS LTDA	Salvatore	B.M.Nº: 03	Data da medição: 23/09/2026
CNPJ:	14.490.446/0001-56		Período: 22/08/2026 à 23/09/2026	

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R$)	Valores (R$)					
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
00.011.001□	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=10cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	283,92			0,00	283,92	120,04	34.081,76	0,00	0,00	0,00	34.081,76	0,00%
00.012□	**IRRIGAÇÃO CANTEIROS**								**9.231,74**	**0,00**	**9.119,64**	**9.119,64**	**112,10**	**98,79%**
00.012.001□	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	12,50		12,50	12,50	0,00	65,37	817,13	0,00	817,13	817,13	0,00	100,00%
00.012.002□	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	208,38		208,38	208,38	0,00	16,14	3.363,25	0,00	3.363,25	3.363,25	0,00	100,00%
00.012.003□	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m3	12,50		12,50	12,50	0,00	21,80	272,50	0,00	272,50	272,50	0,00	100,00%
00.012.004□	Conector, cpvc, soldável, dn22mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	25,00		25,00	25,00	0,00	36,50	912,50	0,00	912,50	912,50	0,00	100,00%
00.012.005□	Aspersor tipo spray, ref. 1804 SAM, marca Rain Bird ou similar	un	25,00		25,00	25,00	0,00	128,58	3.214,50	0,00	3.214,50	3.214,50	0,00	100,00%
00.012.006□	Tê 90° pvc rígido soldável, LLR, c/bucha de latão na bolsa central, d= 25 x 3/4"	un	15,00		15,00	15,00	0,00	24,24	363,60	0,00	363,60	363,60	0,00	100,00%
00.012.007□	Curva de 90° de pvc rígido roscável, diâm = 3/4"	un	8,00		8,00	8,00	0,00	18,36	146,88	0,00	146,88	146,88	0,00	100,00%
00.012.008□	Junção 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	2,00		2,00	2,00	0,00	14,64	29,28	0,00	29,28	29,28	0,00	100,00%
00.012.009□	Fornecimento de mangueira em polietileno linear de baixa densidade, perfurada a raio laser, para irrigação, com ø=28mm, ref. I100/15, da Santeno ou similar	m	71,40			0,00	71,40	1,57	112,10	0,00	0,00	0,00	112,10	0,00%
00.013□	**ÁREA VERDE**								**33.006,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.006,24**	**0,00%**
00.013.001□	Planta - Jabuticabeira enxertada (myrciaria cauliflora), h=3,00m, fornecimento e plantio	un	7,00			0,00	7,00	806,40	5.644,80	0,00	0,00	0,00	5.644,80	0,00%
00.013.002□	Planta - Cajueiro (anacardium occidentale), fornecimento e plantio	un	4,00			0,00	4,00	116,82	467,28	0,00	0,00	0,00	467,28	0,00%
00.013.003□	Planta - Carambola (averrhoa carambola), fornecimento e plantio	un	8,00			0,00	8,00	116,82	934,56	0,00	0,00	0,00	934,56	0,00%
00.013.004□	Planta - Manjelão (syzygium cuminil), fornecimento e plantio	un	1,00			0,00	1,00	116,82	116,82	0,00	0,00	0,00	116,82	0,00%
00.013.005□	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	30,00			0,00	30,00	42,44	1.273,20	0,00	0,00	0,00	1.273,20	0,00%
00.013.006□	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	657,82			0,00	657,82	37,35	24.569,58	0,00	0,00	0,00	24.569,58	0,00%
00.014□	**DRENAGEM**								**8.825,88**	**8.825,88**	**0,00**	**8.825,88**	**0,00**	**100,00%**
00.014.001□	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	36,63	36,63		36,63	0,00	20,77	760,81	760,81	0,00	760,81	0,00	100,00%
00.014.002□	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	36,63	36,63		36,63	0,00	9,15	335,16	335,16	0,00	335,16	0,00	100,00%
00.014.003□	Grelha de ferro, Larg=32cm, em vergalhões 5/8", espaçamento=4cm, com requadro em barra chata ferro 2"x5/16"	m	24,42	24,42		24,42	0,00	316,54	7.729,91	7.729,91	0,00	7.729,91	0,00	100,00%
00.015□	**PISTA ATLETISMO / SALTO A DISTÂNCIA**								**22.131,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.131,30**	
00.015.001□	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	967,70			0,00	967,70	22,87	22.131,30	0,00	0,00	0,00	22.131,30	0,00%
01□	**GINÁSIO**								**899.399,32**	**288.457,53**	**166.628,13**	**455.085,66**	**444.313,66**	**50,60%**
01.001□	**PISO**								**323.377,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**323.377,10**	**0,00%**
01.001.001□	Demolição de piso asfáltico (capa) em quadras de tênis de forma manual	m2	1.370,30			0,00	1.370,30	8,69	11.907,91	0,00	0,00	0,00	11.907,91	0,00%
01.001.002□	Piso flexível de poliuretano sobre camada de borracha granulada, sem juntas, esp=7mm, marca LISONDA ref. Lisonit ou similar	m2	1.370,30			0,00	1.370,30	227,30	311.469,19	0,00	0,00	0,00	311.469,19	0,00%
01.002□	**COBERTURA**								**214.251,95**	**54.355,13**	**159.896,81**	**214.251,94**	**0,01**	**100,00%**
01.002.001□	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	1.752,04	1.752,04		1.752,04	0,00	20,77	36.389,87	36.389,87	0,00	36.389,87	0,00	100,00%
01.002.002□	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	1.752,04	1.752,04		1.752,04	0,00	9,15	16.031,17	16.031,17	0,00	16.031,17	0,00	100,00%

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA-272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rykelme Mendonça de Jesus
Eng. Civil CREA-272345146-1
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra:	REFORMA E CONSTRUÇÃO NO CIE (CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE)		BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO Nº: 194/2026
Contratada:	SALVATORE EMPREENDIMENTOS LTDA	Salvatore	B.M.Nº: 03	Data da medição: 23/09/2026
CNPJ:	14.490.446/0001-56		Período: 22/08/2026 à 23/09/2026	

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R$)	Valores (R$)					
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
01.002.003□	Remoção de telhas de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma mecanizada, com uso de guindaste, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	700,81		700,81	700,81	0,00	4,77	3.342,86	0,00	3.342,86	3.342,86	0,00	100,00%
01.002.004□	Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019	m2	700,81		700,81	700,81	0,00	223,39	156.553,95	0,00	156.553,95	156.553,95	0,00	100,00%
01.002.005□	Limpeza de calha de zinco	m	88,72	88,72		88,72	0,00	21,80	1.934,10	1.934,10	0,00	1.934,10	0,00	100,00%
01.003□	**VEDAÇÃO**								**53.041,83**	**53.041,83**	**0,00**	**53.041,83**	**0,00**	**100,00%**
01.003.001□	Remoção de brises	m2	79,20	79,20		79,20	0,00	4,33	342,94	342,94	0,00	342,94	0,00	100,00%
01.003.002□	Brise em perfil "C" de alumínio dobrado anodizado branco	m2	79,20	79,20		79,20	0,00	665,39	52.698,89	52.698,89	0,00	52.698,89	0,00	100,00%
01.004□	**PAREDE INTERNA**								**30.919,37**	**18.795,99**	**0,00**	**18.795,99**	**12.123,38**	**60,79%**
01.004.001□	Demolição de reboco	m2	136,80	136,80		136,80	0,00	10,88	1.488,38	1.488,38	0,00	1.488,38	0,00	100,00%
01.004.002□	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	136,80	136,80		136,80	0,00	37,90	5.184,72	5.184,72	0,00	5.184,72	0,00	100,00%
01.004.003□	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	492,51	246,25		246,25	246,26	49,23	24.246,27	12.122,89	0,00	12.122,89	12.123,38	50,00%
01.005□	**PAREDE EXTERNA**								**37.276,47**	**8.912,68**	**0,00**	**8.912,68**	**28.363,80**	**23,91%**
01.005.001□	Demolição de reboco	m2	167,50	167,50		167,50	0,00	10,88	1.822,40	1.822,40	0,00	1.822,40	0,00	100,00%
01.005.002□	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	167,50	167,50		167,50	0,00	42,33	7.090,27	7.090,28	0,00	7.090,28	0,00	100,00%
01.005.003□	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	553,44			0,00	553,44	51,25	28.363,80	0,00	0,00	0,00	28.363,80	0,00%
01.006□	**ESQUADRIAS / PORTÕES GINÁSIO**								**5.292,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.292,72**	**0,00%**
01.006.001□	Revisão de esquadria de ferro	m2	24,00			0,00	24,00	160,69	3.856,56	0,00	0,00	0,00	3.856,56	0,00%
01.006.002□	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	48,00			0,00	48,00	20,77	996,96	0,00	0,00	0,00	996,96	0,00%
01.006.003□	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	48,00			0,00	48,00	9,15	439,20	0,00	0,00	0,00	439,20	0,00%
01.007□	**BANHEIROS QUADRA**								**6.180,26**	**3.021,25**	**0,00**	**3.021,25**	**3.159,01**	**48,89%**
01.007.001□	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	61,37	61,37		61,37	0,00	49,23	3.021,25	3.021,25	0,00	3.021,25	0,00	100,00%
01.007.002□	Revisão de esquadria de madeira	m2	7,56			0,00	7,56	118,03	892,31	0,00	0,00	0,00	892,31	0,00%
01.007.003□	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	9,54			0,00	9,54	142,22	1.356,78	0,00	0,00	0,00	1.356,78	0,00%
01.007.004□	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	15,12			0,00	15,12	60,18	909,92	0,00	0,00	0,00	909,92	0,00%
01.008□	**ARQUIBANCADA QUADRA**								**2.975,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.975,34**	**0,00%**
01.008.001□	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	21,00			0,00	21,00	9,15	192,15	0,00	0,00	0,00	192,15	0,00%
01.008.002□	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	21,00			0,00	21,00	20,77	436,17	0,00	0,00	0,00	436,17	0,00%
01.008.003□	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	39,00			0,00	39,00	60,18	2.347,02	0,00	0,00	0,00	2.347,02	0,00%
01.009□	**TELA NYLON**								**22.739,86**	**971,48**	**0,00**	**971,48**	**21.768,38**	**4,27%**
01.009.001□	Remoção de Tela de nylon para proteção de fachada/alambrado/quadra de esportes	m²	899,52	899,52		899,52	0,00	1,08	971,48	971,48	0,00	971,48	0,00	100,00%
01.009.002□	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²	899,52			0,00	899,52	24,20	21.768,38	0,00	0,00	0,00	21.768,38	0,00%
01.010□	**GUARDA CORPO QUADRA**								**1.315,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.315,28**	**0,00%**

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rykelme Mendonça de Jesus
Eng. Civil CREA-272345146-1
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra:	REFORMA E CONSTRUÇÃO NO CIE (CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE)							BOLETIM DE MEDIÇÃO						CONTRATO Nº: 194/2026	
Contratada:	SALVATORE EMPREENDIMENTOS LTDA							B.M.Nº: 03						Data da medição: 23/09/2026	
CNPJ:	14.490.446/0001-56							Período: 22/08/2026 à 23/09/2026							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R$)	Valores (R$)					% Medido	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir		
01.010.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	43,96			0,00	43,96	20,77	913,05	0,00	0,00	0,00	913,05	0,00%	
01.010.002	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	43,96			0,00	43,96	9,15	402,23	0,00	0,00	0,00	402,23	0,00%	
01.011	**ADMINISTRAÇÃO**								**4.631,01**	**3.656,80**	**0,00**	**3.656,80**	**974,21**	**78,96%**	
01.011.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	74,28	74,28		74,28	0,00	49,23	3.656,80	3.656,80	0,00	3.656,80	0,00	100,00%	
01.011.002	Revisão de esquadria de madeira	m2	2,10			0,00	2,10	118,03	247,86	0,00	0,00	0,00	247,86	0,00%	
01.011.003	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	4,20			0,00	4,20	60,18	252,76	0,00	0,00	0,00	252,76	0,00%	
01.011.004	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	3,33			0,00	3,33	142,22	473,59	0,00	0,00	0,00	473,59	0,00%	
01.012	**SALA PROFESSORES**								**4.272,62**	**3.362,41**	**0,00**	**7.609,97**	**1.723,71**	**178,11%**	
01.012.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	68,30	68,30		68,30	0,00	49,23	3.362,41	3.362,41	0,00	3.362,41	0,00	100,00%	
01.012.002	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	4,20			0,00	4,20	60,18	252,76	0,00	0,00	0,00	252,76	0,00%	
01.012.003	Revisão de esquadria de madeira	m2	2,10			0,00	2,10	118,03	247,86	0,00	0,00	0,00	247,86	0,00%	
01.012.004	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	2,88			0,00	2,88	142,22	409,59	0,00	0,00	0,00	409,59	0,00%	
01.013	**SALA DOS PRIMEIROS SOCORROS**								**2.937,28**	**2.123,78**	**0,00**	**2.123,78**	**813,50**	**72,30%**	
01.013.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	43,14	43,14		43,14	0,00	49,23	2.123,78	2.123,78	0,00	2.123,78	0,00	100,00%	
01.013.002	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	4,20			0,00	4,20	60,18	252,76	0,00	0,00	0,00	252,76	0,00%	
01.013.003	Revisão de esquadria de madeira	m2	2,10			0,00	2,10	118,03	247,86	0,00	0,00	0,00	247,86	0,00%	
01.013.004	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	2,20			0,00	2,20	142,22	312,88	0,00	0,00	0,00	312,88	0,00%	
01.014	**VESTIÁRIO FEMININO**								**9.303,48**	**5.366,94**	**0,00**	**5.366,94**	**198,29**	**57,69%**	
01.014.001	Chuveiro plástico sem registro	un	4,00	4,00		4,00	0,00	38,74	154,96	154,96	0,00	154,96	0,00	100,00%	
01.014.002	Revisão de esquadria de madeira	m2	1,68			0,00	1,68	118,03	198,29	0,00	0,00	0,00	198,29	0,00%	
01.014.003	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	5,22			0,00	5,22	142,22	742,39	0,00	0,00	0,00	742,39	0,00%	
01.014.004	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	m2	3,24			0,00	3,24	862,24	2.793,66	0,00	0,00	0,00	2.793,66	0,00%	
01.014.005	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	3,36			0,00	3,36	60,18	202,20	0,00	0,00	0,00	202,20	0,00%	
01.014.006	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	105,87	105,87		105,87	0,00	49,23	5.211,98	5.211,98	0,00	5.211,98	0,00	100,00%	
01.015	**VESTIÁRIO ACESSIVEL FEMININO**								**2.686,44**	**1.878,62**	**0,00**	**1.878,62**	**807,82**	**69,93%**	
01.015.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	38,16	38,16		38,16	0,00	49,23	1.878,62	1.878,62	0,00	1.878,62	0,00	100,00%	
01.015.002	Revisão de esquadria de madeira	m2	2,10			0,00	2,10	118,03	247,86	0,00	0,00	0,00	247,86	0,00%	
01.015.003	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	2,16			0,00	2,16	142,22	307,20	0,00	0,00	0,00	307,20	0,00%	

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA- 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rykelme Mendonça de Jesus
Eng. Civil CREA-272345146-1
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra:	REFORMA E CONSTRUÇÃO NO CIE (CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE)	Salvatore	BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO Nº: 194/2026
Contratada:	SALVATORE EMPREENDIMENTOS LTDA		B.M.Nº: 03	
CNPJ:	14.490.446/0001-56		Período: 22/08/2026 à 23/09/2026	Data da medição: 23/09/2026

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R$)	Valores (R$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
01.015.004	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	4,20			0,00	4,20	60,18	252,76	0,00	0,00	0,00	252,76	0,00%
01.016	**VESTIÁRIO ACESSIVEL MASCULINO**								**2.686,44**	**1.878,62**	**0,00**	**1.878,62**	**807,82**	**69,93%**
01.016.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	38,16	38,16		38,16	0,00	49,23	1.878,62	1.878,62	0,00	1.878,62	0,00	100,00%
01.016.002	Revisão de esquadria de madeira	m2	2,10			0,00	2,10	118,03	247,86	0,00	0,00	0,00	247,86	0,00%
01.016.003	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	2,16			0,00	2,16	142,22	307,20	0,00	0,00	0,00	307,20	0,00%
01.016.004	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	4,20			0,00	4,20	60,18	252,76	0,00	0,00	0,00	252,76	0,00%
01.017	**VESTIARIO MASCULINO**								**8.372,26**	**5.211,98**	**0,00**	**5.211,98**	**3.160,28**	**62,25%**
01.017.001	Chuveiro plástico sem registro	un	4,00			0,00	4,00	38,74	154,96	0,00	0,00	0,00	154,96	0,00%
01.017.002	Revisão de esquadria de madeira	m2	1,68			0,00	1,68	118,03	198,29	0,00	0,00	0,00	198,29	0,00%
01.017.003	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	5,22			0,00	5,22	142,22	742,39	0,00	0,00	0,00	742,39	0,00%
01.017.004	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	m2	2,16			0,00	2,16	862,24	1.862,44	0,00	0,00	0,00	1.862,44	0,00%
01.017.005	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	3,36			0,00	3,36	60,18	202,20	0,00	0,00	0,00	202,20	0,00%
01.017.006	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	105,87	105,87		105,87	0,00	49,23	5.211,98	5.211,98	0,00	5.211,98	0,00	100,00%
01.018	**COPA**								**2.496,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.496,90**	**0,00%**
01.018.001	Revisão de esquadria de madeira	m2	2,10			0,00	2,10	118,03	247,86	0,00	0,00	0,00	247,86	0,00%
01.018.002	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	1,35			0,00	1,35	142,22	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00%
01.018.003	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	4,20			0,00	4,20	60,18	252,76	0,00	0,00	0,00	252,76	0,00%
01.018.004	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	36,65			0,00	36,65	49,23	1.804,28	0,00	0,00	0,00	1.804,28	0,00%
01.019	**DEPOSITO**								**4.773,24**	**3.362,41**	**0,00**	**3.362,41**	**1.410,83**	**70,44%**
01.019.001	Revisão de esquadria de madeira	m2	4,20			0,00	4,20	118,03	495,73	0,00	0,00	0,00	495,73	0,00%
01.019.002	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	2,88			0,00	2,88	142,22	409,59	0,00	0,00	0,00	409,59	0,00%
01.019.003	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	8,40			0,00	8,40	60,18	505,51	0,00	0,00	0,00	505,51	0,00%
01.019.004	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	68,30	68,30		68,30	0,00	49,23	3.362,41	3.362,41	0,00	3.362,41	0,00	100,00%
01.020	**ACESSO MEZANINO**								**3.034,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.034,98**	**0,00%**
01.020.001	Revisão de esquadria de madeira	m2	2,10			0,00	2,10	118,03	247,86	0,00	0,00	0,00	247,86	0,00%
01.020.002	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	0,72			0,00	0,72	142,22	102,40	0,00	0,00	0,00	102,40	0,00%
01.020.003	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	4,20			0,00	4,20	60,18	252,76	0,00	0,00	0,00	252,76	0,00%
01.020.004	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	49,40			0,00	49,40	49,23	2.431,96	0,00	0,00	0,00	2.431,96	0,00%

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA-272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rykelme Mendonça de Jesus
Eng. Civil CREA-272345146-1
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra:	REFORMA E CONSTRUÇÃO NO CIE (CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE)		BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO Nº: 194/2026
Contratada:	SALVATORE EMPREENDIMENTOS LTDA	Salvatore	B.M.Nº: 03	
CNPJ:	14.490.446/0001-56		Período: 22/08/2026 a 23/09/2026	Data da medição: 23/09/2026

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R$)	Valores (R$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
01.021□	**ESCADAS**								**4.559,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.559,75**	**0,00%**
01.021.001□	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de liquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	85,76			0,00	85,76	49,23	4.221,96	0,00	0,00	0,00	4.221,96	0,00%
01.021.002□	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	11,29			0,00	11,29	9,15	103,30	0,00	0,00	0,00	103,30	0,00%
01.021.003□	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	11,29			0,00	11,29	20,77	234,49	0,00	0,00	0,00	234,49	0,00%
01.022□	**MEZANINO**								**5.178,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.295,40**	**0,00%**
01.022.001□	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de liquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	84,82			0,00	84,82	49,23	4.175,69	0,00	0,00	0,00	4.175,69	0,00%
01.022.002□	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	33,50			0,00	33,50	9,15	306,52	0,00	0,00	0,00	306,52	0,00%
01.022.003□	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	33,50			0,00	33,50	20,77	695,79	0,00	0,00	0,00	695,79	0,00%
01.023□	**APARELHOS ESPORTIVOS**								**2.344,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.344,27**	**0,00%**
01.023.001□	Revisão de esquadria de ferro	m2	10,44			0,00	10,44	160,69	1.677,60	0,00	0,00	0,00	1.677,60	0,00%
01.023.002□	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	10,44			0,00	10,44	9,15	95,53	0,00	0,00	0,00	95,53	0,00%
01.023.003□	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	10,44			0,00	10,44	20,77	216,84	0,00	0,00	0,00	216,84	0,00%
01.023.004□	Rede para trave de futebol de salão (Futsal)	par	1,00			0,00	1,00	354,30	354,30	0,00	0,00	0,00	354,30	0,00%
01.024□	**SERVIÇOS FINAIS**								**8.118,23**	**0,00**	**0,00**	**6.723,78**	**5.786,24**	**82,82%**
01.024.001□	Limpeza geral	m2	2.002,16			0,00	2.002,16	2,89	5.786,24	0,00	0,00	0,00	5.786,24	0,00%
01.024.002□	Placa de inauguração de obra em aluminio 0,50 x 0,70 m	un	1,00			0,00	1,00	2.331,99	2.331,99	0,00	0,00	0,00	2.331,99	0,00%
01.025□	**REFORMA DA ILUMINAÇÃO EXTERNA**								**136.634,24**	**122.517,62**	**6.731,32**	**129.248,94**	**7.385,30**	**94,59%**
01.025.001□	Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto	un	31,00	31,00		31,00	0,00	2.119,81	65.714,11	65.714,11	0,00	65.714,11	0,00	100,00%
01.025.002□	Lâmpada led 80w, luz branca 6500k, TLN170 - E40, 120° de ângulo de abertura, marca Glight ou similar	un	24,00	24,00		24,00	0,00	202,13	4.851,12	4.851,12	0,00	4.851,12	0,00	100,00%
01.025.003□	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	21,00	21,00		21,00	0,00	155,18	3.258,78	3.258,78	0,00	3.258,78	0,00	100,00%
01.025.004□	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	2,00	2,00		2,00	0,00	360,75	721,50	721,50	0,00	721,50	0,00	100,00%
01.025.005□	Poste de aço cônico contínuo reto, engastamento simples com 1 m de solo, h=9m - fornecimento e instalação. af_04/2025	un	7,00	7,00		7,00	0,00	2.636,01	18.452,07	18.452,07	0,00	18.452,07	0,00	100,00%
01.025.006□	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	12,00	12,00		12,00	0,00	257,92	3.095,04	3.095,04	0,00	3.095,04	0,00	100,00%
01.025.007□	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c	m	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	11,48	22.960,00	22.960,00	0,00	22.960,00	0,00	100,00%
01.025.008□	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	38,00		38,00	38,00	0,00	22,18	842,84	0,00	842,84	842,84	0,00	100,00%
01.025.009□	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	38,00		38,00	38,00	0,00	154,96	5.888,48	0,00	5.888,48	5.888,48	0,00	100,00%
01.025.010□	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	210,00	210,00		210,00	0,00	16,50	3.465,00	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00	100,00%
01.025.011□	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	70,00			0,00	70,00	7,84	548,80	0,00	0,00	0,00	548,80	0,00%
01.025.012□	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	20,00			0,00	20,00	2,75	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00%
01.025.013□	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	210,00			0,00	210,00	21,27	4.466,70	0,00	0,00	0,00	4.466,70	0,00%
01.025.014□	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	20,00			0,00	20,00	10,85	217,00	0,00	0,00	0,00	217,00	0,00%

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rykelme Mendonça de Jesus
Eng. Civil CREA-272345146-1
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra:	REFORMA E CONSTRUÇÃO NO CIE (CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE)		BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO Nº: 194/2026
Contratada:	SALVATORE EMPREENDIMENTOS LTDA		B.M.Nº: 03	
CNPJ:	14.490.446/0001-56		Período: 22/08/2026 à 23/09/2026	Data da medição: 23/09/2026

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R$)	Valores (R$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
01.025.015	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	70,00			0,00	70,00	4,23	296,10	0,00	0,00	0,00	296,10	0,00%
01.025.016	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	60,00			0,00	60,00	26,72	1.603,20	0,00	0,00	0,00	1.603,20	0,00%
01.025.017	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	5,00			0,00	5,00	14,86	74,30	0,00	0,00	0,00	74,30	0,00%
01.025.018	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	20,00			0,00	20,00	6,21	124,20	0,00	0,00	0,00	124,20	0,00%
									1.476.793,77	**454.789,05**	**258.375,34**	**713.164,39**	**763.629,38**	**48,29%**
PERCENTUAL									**100,00%**	**30,80%**	**17,50%**	**48,29%**	**51,71%**	

Documento assinado digitalmente
gov.br
LEANDRO DE ASSIS FERREIRA
Data: 24/09/2026 11:14:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA
DATA: ____ / ____ / ____

VALOR DA MEDIÇÃO:

R$ 258.375,34

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA-272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rykelme Mendonça de Jesus
Eng. Civil CREA-272345146-1
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

SALVATORE EMPREENDIMENTOS LTDA **CNPJ sob nº 14.490.446/0001-56**	**Objeto:**	REFORMA E CONSTRUÇÃO NO CIE (CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE)
	Contratada:	SALVATORE EMPREENDIMENTOS LTDA
	Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
	MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONTRATO Nº 194/2026	
	B.M.Nº: 03	Período: 22/08/2026 a 23/09/2026 — Data da medição: 23/09/2026

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTD	COMP.	ALTURA	LARGURA	PERÍMETRO	ÁREA	UNIDADE	TOTAL
00.001	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									
00.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	18,00						18,00	**18,00**
00.001.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	36,00						36,00	**36,00**
00.005	**MURO**									
00.005.001	Demolição de reboco	m2	266,06	177,37	1,50					**266,06**
00.005.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	266,06	177,37	1,50					**266,06**
00.007	**CONSTRUÇÃO DE QUADRA VOLEI DE AREIA**									
00.007.004	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	9,48	9,48	1,00					**9,48**
00.007.005	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	31,60	31,60	1,00					**31,60**
00.007.007	Peça de eucalipto tratado, d= 19 a 22cm, L = 6,00m - Fornecimento	un	30,00						**30,00**	**30,00**
00.007.008	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	0,30	14,28	0,07	0,30				**0,30**
00.007.010	Dreno espinha de peixe (seção (0,40 x 0,40 m), com tubo de pead corrugado perfurado, dn 100 mm, enchimento com brita, envolvido com manta geotêxtil, inclusive conexões. af_07/2021	m	65,30	65,30						**65,30**
00.007.011	Colchão de areia	m3	74,90	68,09	0,10	11,00				**74,90**
00.008	**CIRCULAÇÃO ÁREA EXTERNA (FUNDO DO GINÁSIO)**									
00.008.001	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	2.002,16	50,05		40,00				**2.002,16**
00.009	**CANTEIRO (PRAÇA)**									
00.009.001	Lona plástica preta	m2	141,07	30,00		4,70				**141,07**
00.009.002	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	141,07	30,00		4,70				**141,07**
00.009.004	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	28,20	28,20						**28,20**
00.010	**CANTEIRO LATERAL (LESTE)**									
00.010.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	54,24	54,24						**54,24**
00.012	**IRRIGAÇÃO CANTEIROS**									

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rykelme Mendonça de Jesus
Eng. Civil CREA-272345146-1
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

00.012.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	12,50	27,78	1,50	0,30				**12,50**
00.012.002	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	208,38	208,38						**208,38**
00.012.003	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m3	12,50	27,78	1,50	0,30				**12,50**
00.012.004	Conector, cpvc, soldável, dn22mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	25,00						25,00	**25,00**
00.012.005	Aspersor tipo spray, ref. 1804 SAM, marca Rain Bird ou similar	un	25,00						25,00	**25,00**
00.012.006	Tê 90° pvc rígido soldável, LLR, c/bucha de latão na bolsa central, d= 25 x 3/4"	un	15,00						15,00	**15,00**
00.012.007	Curva de 90° de pvc rígido roscável, diâm = 3/4"	un	8,00						8,00	**8,00**
00.012.008	Junção 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	2,00						2,00	**2,00**
01.002	**COBERTURA**									
01.002.003	Remoção de telhas de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma mecanizada, com uso de guindaste, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	700,81	637,10		1,10				**700,81**
01.002.004	Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019	m2	700,81	637,10		1,10				**700,81**
01.025	**REFORMA DA ILUMINAÇÃO EXTERNA**									
01.025.008	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	38,00						38,00	**38,00**
01.025.009	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	38,00						38,00	**38,00**

gov.br Documento assinado digitalmente
LEANDRO DE ASSIS FERREIRA
Data: 24/09/2026 11:14:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE MEMORIAL DE CÁLCULO FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.

DATA:

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA-272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rykelme Mendonça de Jesus
Eng. Civil CREA-272345146-1
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Salvatore
Empreendimentos

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM Nº 03

Ref.: Contrato 194/2026

Objeto: **Boletim de Medição 03 referente aos Serviços de Engenharia para REFORMA E CONSTRUÇÃO NO CIE (CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE) em Itabaiana/SE.**

A Empresa SALVATORE EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ sob nº 14.490.446/0001-56, localizada a Rua José Freire, n° 588 – Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, CEP 49.020-410, representada pelo Sócio Alisson Figueiredo Santos Pinheiro, com o R.G. n°: 32509707 – SSP/SE e CPF nº: 019.082.885-40, vem por intermédio deste apresentar o relatório fotográfico do Boletim de medição n° 03 da obra mencionada acima, onde o mesmo apresenta serviços referente ao período de **Período: 22/08/2026 até 23/09/2026**, conforme **Boletim de Medição nº 03.**

1- **Muro (demolição do reboco; reboco externo);**





João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA-272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rykelme Mendonça de Jesus
Eng. Civil CREA-272345146-1
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

79 9 9913-5920
salvatoreempreendimentosltda@hotmail.com
@salvatoreempreendimentos

Salvatore
Empreendimentos

2- CONSTRUÇÃO DE QUADRA VOLEI DE AREIA (Alvenaria de bloco cerâmico; Reboco; Peça de eucalipto tratado; Concreto simples; Dreno espinha de peixe; Colchão de Areia);


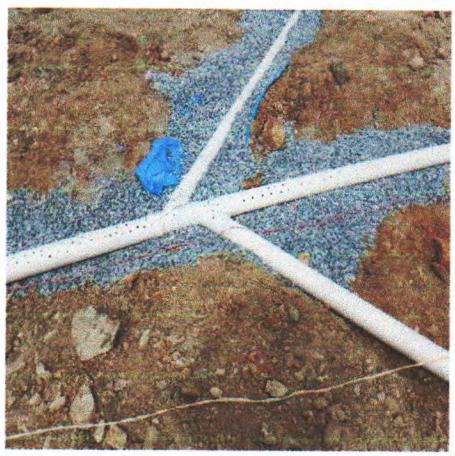



Rykelme Mendonça de Jesus
Eng. Civil CREA-272345146-1
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

79 9 9913-5920
salvatoreempreendimentosltda@hotmail.com
@salvatoreempreendimentos

Salvatore
Empreendimentos



3- CIRCULAÇÃO ÁREA EXTERNA (FUNDO DO GINÁSIO) (Limpeza manual de terreno);





Rykelme Mendonça de Jesus
Eng. Civil CREA-272345146-1
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA-272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

79 9 9913-5920
salvatoreempreendimentosltda@hotmail.com
@salvatoreempreendimentos

Salvatore
Empreendimentos

4- CANTEIRO (PRAÇA) (Piso em Concreto; Meio-fio pré moldado);




5 – CANTEIRO LATERAL (LESTE) (Meio-fio Pré moldado);




Rykelme Mendonça de Jesus
Eng. Civil CREA-272345146-1
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA-272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

79 9 9913-5920
salvatoreempreendimentosltda@hotmail.com
@salvatoreempreendimentos

Salvatore
Empreendimentos

6 – IRRIGAÇÃO CANTEIROS (Escavação manual de vala; Tubo de pvc Rígido; Reaterro manual; Conector cpvc; Aspersor tipo Spray; Tê 90° pvc Rígido; Curva de 90; Junção de 45°);






Rykelme Mendonça de Jesus
Eng. Civil CREA-272345146-1
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA-272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

79 9 9913-5920
salvatoreempreendimentosltda@hotmail.com
@salvatoreempreendimentos

Salvatore
Empreendimentos

6 – COBERTURA (Remoção de telhas metálicas; Telhamento com telha metálica);

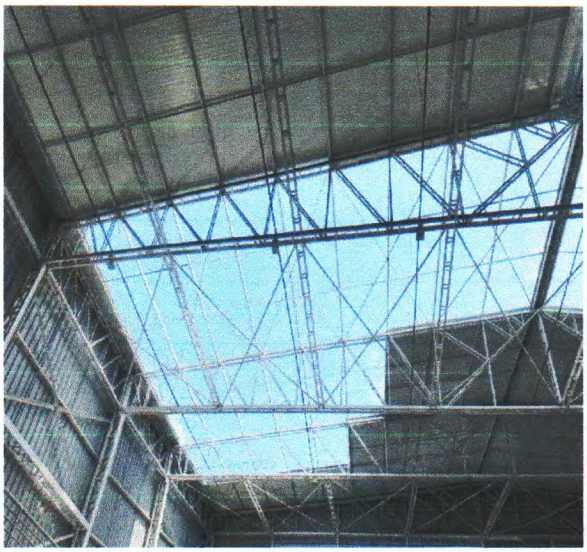



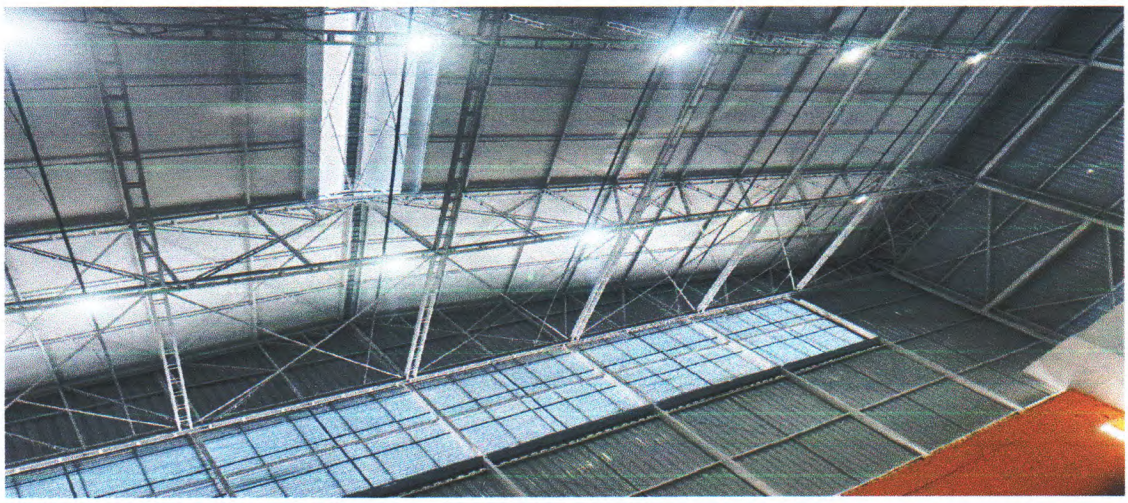

Rykelme Mendonça de Jesus
Eng. Civil CREA-272345146-1
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA-272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

79 9 9913-5920
salvatoreempreendimentosltda@hotmail.com
@salvatoreempreendimentos

Salvatore
Empreendimentos

7 – REFORMA ILUMINAÇÃO EXTERNA (Caixa pré moldada em concreto c/tampa; Fornecimento e instalação de haste de aterramento);





Rykelme Mendonça de Jesus
Eng. Civil CREA-272345146-1
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA-272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

79 9 9913-5920
salvatoreempreendimentosltda@hotmail.com
@salvatoreempreendimentos

Salvatore
Empreendimentos

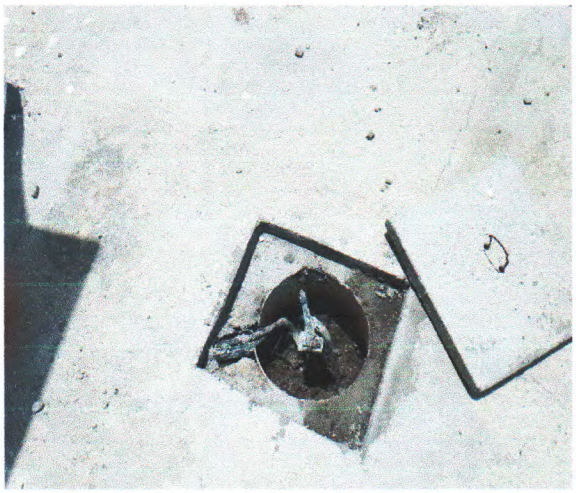



Itabaiana/SE, em 23 de Setembro de 2026.

Atenciosamente,

gov.br
Documento assinado digitalmente
LEANDRO DE ASSIS FERREIRA
Data: 24/09/2026 11:50:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA-3723359222-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

LEANDRO DE ASSIS FERREIRA

ENGENHEIRO CIVIL CREA/SE n° 270963955-6

Rykelme Mendonça de Jesus
Eng. Civil CREA-272345146-1
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

79 9 9913-5920
salvatoreempreendimentosltda@hotmail.com
@salvatoreempreendimentos
