CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.				DATA DE INICIO:05/09/2025		BOLETIM DE MEDIÇÃO 03									AGC	
CONTRATADA: AGC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA				DATA DE TÉRMINO: 04/08/2026		Período: 16/01/2026 A 30/01/2026									CONTRATO 227/2025	
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana						Data de medição: 18/03/2026										
				QUANTIDADES						VALORES (R$)						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CODIGO	UNID	CONTRATADA	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido	
1	Pavimentação de estradas vicinais, no município de									R$ 19.365,74	R$ 1.076,96	R$ 823,50	R$ 1.900,46	R$ 17.465,28	9,81%	
1.01	CANTEIRO DE OBRAS															
01.01.001	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	04657/ORSE	mês	3,00	-		-	3,00	585,60	R$ 1.756,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.756,80	0,00%	
01.01.002	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	04654/ORSE	mês	3,00	-		-	3,00	292,80	R$ 878,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 878,40	0,00%	
01.01.003	Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02 _02/2022	04659/ORSE	mês	3,00	-		-	3,00	658,80	R$ 1.976,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.976,40	0,00%	
01.01.004	Aluguel de betoneira 400 l com motor à diesel (com carre gador)	06792/ORSE	mês	5,00		5,00			164,70	R$ 823,50	R$ -	R$ 823,50	R$ 823,50	R$ -	100,00%	
01.01.005	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	04656/ORSE	mês	3,00	-		-	3,00	346,48	R$ 1.039,44	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.039,44	0,00%	
01.01.006	Container de lixo em plástico, 1000l, com rodas	09374/ORSE	un	2,00	-		-	2,00	514,84	R$ 1.029,68	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.029,68	0,00%	
01.01.007	Aluguel de banheiro químico, com limpezas diárias	10390/ORSE	mês	9,00	-		-	9,00	244,00	R$ 2.196,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.196,00	0,00%	
01.01.008	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, e xclusive pintura	07179/ORSE	m	60,00	-		-	60,00	65,07	R$ 3.904,20	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.904,20	0,00%	
01.01.009	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	00051/ORSE	m2	36,00	8,00		8,00	28,00	134,62	R$ 4.846,32	R$ 1.076,96	R$ -	R$ 1.076,96	R$ 3.769,36	22,22%	
01.01.010	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m , inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento , instalada - Rev 02 - 09/2021	11397/ORSE	un	1,00	-		-	1,00	915,00	R$ 915,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 915,00	0,00%	
1.02	LIGAÇÃO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO									R$ 2.449,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.449,40	0,00%	
01.02.001	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisóri a ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	06096/ORSE	un	1,00	-		0,00	1,00	677,35	R$ 677,35	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 677,35	0,00%	
01.02.002	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 100 pess oas (v=5290 litros)	01714/ORSE	un	1,00	-		0,00	1,00	885,43	R$ 885,43	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 885,43	0,00%	
01.02.003	Sumidouro pre-moldado de concreto - 02 aneis h=0,50m cad a padrão cehop	01748/ORSE	un	3,00	-		0,00	3,00	295,54	R$ 886,62	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 886,62	0,00%	
1.03	LIGAÇÃO PROVISORIA DE ENERGIA									R$ 2.667,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.667,64	0,00%	
01.03.001	Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo	03249/ORSE	un	1,00	-		0,00	1,00	242,79	R$ 242,79	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 242,79	0,00%	
01.03.002	Cabeçote de alumínio de 1 1/2"	09043/ORSE	un	1,00	-		0,00	1,00	20,23	R$ 20,23	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 20,23	0,00%	
01.03.003	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	00339/ORSE	un	1,00	-		0,00	1,00	596,66	R$ 596,66	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 596,66	0,00%	
01.03.004	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - for necimento e instalação. af_12/2021	93008/ORSE	m	12,00	-		0,00	12,00	19,09	R$ 229,08	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 229,08	0,00%	
01.03.005	Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interl igada com cabo de cobre tipo cordoalha	03290/ORSE	un	1,00	-		0,00	1,00	115,15	R$ 115,15	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 115,15	0,00%	
01.03.006	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,50m	04404/ORSE	un	1,00	-		0,00	1,00	219,49	R$ 219,49	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 219,49	0,00%	
01.03.007	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50m m (1 1/2")	00365/ORSE	un	2,00	-		0,00	2,00	15,15	R$ 30,30	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 30,30	0,00%	

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.																	DATA DE INICIO:05/09/2025	BOLETIM DE MEDIÇÃO 03	AGC
CONTRATADA: AGC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA																	DATA DE TÉRMINO: 04/08/2026	Período: 16/01/2026 A 30/01/2026	CONTRATO 227/2025
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana																		Data de medição: 18/03/2026	
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CODIGO	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)										
				CONTRATADA	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido				
01.03.008	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	00374/ORSE	un	4,00	-		0,00	4,00	7,72	R$ 30,88	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 30,88	0,00%				
01.03.009	Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	00452/ORSE	un	1,00	-		0,00	1,00	136,06	R$ 136,06	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 136,06	0,00%				
01.03.010	Cabo de cobre isolado pvc rigido unipolar seção 16mm², 0,6/ 1kv/ 70° - fornecimento	04182/ORSE	m	60,00	-		0,00	60,00	17,45	R$ 1.047,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.047,00	0,00%				
1.04	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO									R$ 2.912,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.912,24	0,00%				
01.04.001	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada	13169/ORSE	km	60,00	60,00		60,00	-	14,64	R$ 878,40	R$ 878,40	R$ -	R$ 878,40	R$ -	100,00%				
01.04.002	Caminhão toco, pbt 16.000 kg, carga útil máx. 10.685 kg, dist. entre eixos 4,8 m, potência 189 cv, inclusive carr oceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de car ga seca, dimen. aprox. 2,5 x 7,00 x 0,50 m - chp diurno. af_06/2014	5824/SINAPI	chp	8,00	8		8,00	-	254,23	R$ 2.033,84	R$ 2.033,84	R$ -	R$ 2.033,84	R$ -	100,00%				
1.05	SINALIZAÇÃO PROVISORIA									R$ 3.140,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%				
01.05.001	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retira da diária (5213835 - SICRO)	0001/PMI	un.dia	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	-	0,39	R$ 468,00	R$ -	R$ 468,00	R$ 468,00	R$ -	100,00%				
01.05.002	Placa de regulamentação para sinalização de obras montad as em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização d e 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirad a diária (5212557 - SICRO)	0002 / PMI	un.dia	510,00	-	510,00	510,00	-	1,65	R$ 841,50	R$ -	R$ 841,50	R$ 841,50	R$ -	100,00%				
01.05.003	Placa de regulamentação para sinalização de obras montad a em suporte metálico móvel, R1 lado 0,414 m - utilizaçã o de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 reti rada diária (5212558 - SICRO)	0003 / PMI	un.dia	180,00	-	180,00	180,00	-	1,69	R$ 304,20	R$ -	R$ 304,20	R$ 304,20	R$ -	100,00%				
01.05.004	Placa de regulamentação para sinalização de obras montad a em suporte metálico móvel, R2 lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retira da diária (5212559 - SICRO)	0004 / PMI	un	60,00	-	60,00	60,00	-	1,45	R$ 87,00	R$ -	R$ 87,00	R$ 87,00	R$ -	100,00%				
01.05.005	Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plás tica com suporte móvel afixado em bloco de concreto - ut ilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária (SICRO - 5213348)	0005 / PMI	un.dia	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-	0,48	R$ 1.440,00	R$ -	R$ 1.440,00	R$ 1.440,00	R$ -	100,00%				
1.06	ENSAIOS									R$ 25.943,76	R$ 25.943,76	R$ 0,00	R$ 25.943,76	R$ 0,00	100,00%				
01.06.001	Ensaio - Granulometria por peneiramento	04682/ORSE	un	24,00	24,00		24,00	-	201,30	R$ 4.831,20	R$ 4.831,20	R$ -	R$ 4.831,20	R$ -	100,00%				
01.06.002	Ensaio - Limite de liquidez	04683/ORSE	un	24,00	24,00		24,00	-	201,30	R$ 4.831,20	R$ 4.831,20	R$ -	R$ 4.831,20	R$ -	100,00%				
01.06.003	Ensaio - Limite de plasticidade	04684/ORSE	un	24,00	24,00		24,00	-	201,30	R$ 4.831,20	R$ 4.831,20	R$ -	R$ 4.831,20	R$ -	100,00%				
01.06.004	Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de materia l (6 pontos)	04685/ORSE	un	24,00	24,00		24,00	-	268,40	R$ 6.441,60	R$ 6.441,60	R$ -	R$ 6.441,60	R$ -	100,00%				
01.06.005	I. S. C - Índice de Suporte Californiano na energia norm al (1 ponto)	04686/ORSE	un	24,00	24,00		24,00	-	65,34	R$ 1.568,16	R$ 1.568,16	R$ -	R$ 1.568,16	R$ -	100,00%				

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.																
						DATA DE INICIO:05/09/2025		BOLETIM DE MEDIÇÃO 03								
CONTRATADA: AGC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA						DATA DE TÉRMINO: 04/08/2026		Período: 16/01/2026 A 30/01/2026								
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana								Data de medição: 18/03/2026								CONTRATO 227/2025
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CODIGO	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)							
				CONTRATADA	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido	
01.06.006	Ensaio - Marshall	0006 / PMI	un	12,00	12,00		12,00	-	286,70	R$ 3.440,40	R$ 3.440,40	R$ -	R$ 3.440,40	R$ -	100,00%	
1.07	MUROS E CERCAS									R$ 2.449,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.449,62	0,00%	
01.07.001	Remoção de cercas e mourões, de forma manual, sem reapro veitamento. af_09/2023	04800 / SINAPI	m	175,54	-		0,00	175,54	10,88	R$ 1.909,87	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.909,87	0,00%	
01.07.002	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m3 / 111 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020	0039 / PMI	t	11,85	-		0,00	11,85	7,01	R$ 83,06	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 83,06	0,00%	
01.07.003	Transporte com caminhão basculante de 10m³ - rodovia pav imentada (SICRO - 5914389)	0007 / PMI	tkm	23,70	-		0,00	23,70	0,97	R$ 22,98	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 22,98	0,00%	
01.07.004	Descarte de resíduos da construção civil em área licenci ada	10039/ORSE	t	11,85	-		0,00	11,85	36,60	R$ 433,71	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 433,71	0,00%	
1.08	PAVIMENTOS E CALÇADAS									R$ 1.986,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.986,51	0,00%	
01.08.001	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecaniza da com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023	04790 / SINAPI	m3	5,62	-		0,00	5,62	129,02	R$ 725,09	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 725,09	0,00%	
01.08.002	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão bascula nte 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba d e 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: t). af_07/2020	0039 / PMI	t	16,70	-		0,00	16,70	7,01	R$ 117,06	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 117,06	0,00%	
01.08.003	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	0021/ORSE	m	40,13	-		0,00	40,13	11,98	R$ 480,75	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 480,75	0,00%	
01.08.004	Transporte com caminhão basculante de 10m³ - rodovia pavimentada (SICRO - 5914389)	0007 / PMI	tkm	33,40	-		0,00	33,40	0,97	R$ 32,39	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 32,39	0,00%	
01.08.005	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	10039/ORSE	t	16,70	-		0,00	16,70	36,60	R$ 611,22	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 611,22	0,00%	
1.09	TERRAPLANAGEM									R$ 43.374,40	R$ 43.374,44	R$ 0,00	R$ 43.374,44	R$ 0,00	100,00%	
01.09.001	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	2548/ORSE	m2	11.854,24	11.854,24		11.854,24	-	0,54	R$ 6.401,28	R$ 6.401,28	R$ -	R$ 6.401,28	R$ -	100,00%	
01.09.002	Escavação horizontal em solo de 1a categoria com trator de esteiras (100hp/lâmina: 2,19m3). af_07/2020	01114 / SINAPI	m3	2.289,59	2.289,59		2.289,59	-	5,36	R$ 12.272,20	R$ 12.272,20	R$ -	R$ 12.272,20	R$ -	100,00%	
01.09.003	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10m³ - carga com carregadeira de 3,40m³ e descarga livre (SICRO - 5915407)	0008 / PMI	t	789,91	789,91		789,91	0,00	3,31	R$ 2.614,60	R$ 2.614,60	R$ -	R$ 2.614,60	R$ -	100,00%	
01.09.004	Transporte com caminhão basculante de 10m³ - rodovia pav imentada (SICRO - 5914389)	0007 / PMI	tkm	1.579,82	1.579,82		1.579,82	0,00	0,97	R$ 1.532,42	R$ 1.532,42	R$ -	R$ 1.532,42	R$ -	100,00%	
01.09.005	Regularização do subleito (SICRO - 4011209)	0009 / PMI	m³	9.952,85	9.952,85		9.952,85	-	1,36	R$ 13.535,87	R$ 13.535,87	R$ -	R$ 13.535,87	R$ -	100,00%	
01.09.006	Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator estei ra Cat - D-6 ou similar	02533/ORSE	m³	526,61	526,61		526,61	0,00	0,57	R$ 300,16	R$ 300,16	R$ -	R$ 300,16	R$ -	100,00%	
01.09.007	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (SICRO - 5502978)	0010 / PMI	m³	1.127,16	1.127,16		1.127,16	-	5,96	R$ 6.717,87	R$ 6.717,87	R$ -	R$ 6.717,87	R$ -	100,00%	
1.10	PAVIMENTAÇÃO									R$ 1.609.836,57	R$ 1.545.377,52	R$ 38.023,53	R$ 1.583.401,05	R$ 26.235,16	98,37%	
01.10.001	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com co ncreto moldado in loco, feito em obra, acabamento conven cional, não armado. af_08/2022	94990 / SINAPI	m3	139,88	96,12	28,72	124,84	15,04	285,54	39941,33	R$ 27.446,10	R$ 8.200,71	R$ 35.646,81	R$ 4.294,52	89,25%	
01.10.002	Materia de Sub-base - (Jazida FFM - Santo Amaro das Brot as)	0011 / PMI	m³	2.044,86	2.044,86		2.044,86	0,00	20,33	41572,00	R$ 41.572,00	R$ -	R$ 41.572,00	R$ -	100,00%	
01.10.003	Transporte com caminhão basculante de 10m³ - rodovia pav imentada (SICRO - 5914389)	0007 / PMI	tkm	92.018,54	92.018,54		92.018,54	0,00	0,97	89257,98	R$ 89.257,98	R$ -	R$ 89.257,98	R$ -	100,00%	

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.																	
						DATA DE INICIO:05/09/2025			BOLETIM DE MEDIÇÃO 03								
CONTRATADA: AGC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA						DATA DE TÉRMINO: 04/08/2026			Período: 16/01/2026 A 30/01/2026							CONTRATO 227/2025	
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana									Data de medição: 18/03/2026								
				QUANTIDADES						VALORES (R$)							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CODIGO	UNID	CONTRATADA	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido		
01.10.004	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida (SICRO - 4011227)	0012 / PMI	m²	1.778,14	1.778,14		1.778,14	0,00	13,87	24662,80	R$ 24.662,80	R$ -	R$ 24.662,80	R$ -	100,00%		
01.10.005	Base ou sub-base de brita graduada com brita produzida (SICRO - 4011275)	0013 / PMI	m³	1.778,14	1.778,14		1.778,14	0,00	119,79	213003,39	R$ 213.003,39	R$ -	R$ 213.003,39	R$ -	100,00%		
01.10.006	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em camin hão basculante de 10m³ - carga com carregadeira de 3,40m³ e descarga livre (SICRO - 5915407)	0008 / PMI	t	3.929,68	3.929,68		3.929,68	-	3,31	13007,24	R$ 13.007,24	R$ -	R$ 13.007,24	R$ -	100,00%		
01.10.007	Transporte com caminhão basculante de 10m³ - rodovia pavimentada (SICRO - 5914389)	0007 / PMI	tkm	117.890,42	117.890,42		117.890,42	- 0,00	0,97	114353,70	R$ 114.353,70	R$ -	R$ 114.353,70	R$ -	100,00%		
01.10.008	Locação de serviços de pavimentação	02605/ORSE	m2	11.854,24	11.854,24		11.854,24	-	1,75	20744,92	R$ 20.744,92	R$ -	R$ 20.744,92	R$ -	100,00%		
01.10.009	Imprimação com asfalto diluido - somente aplicação (SICR O - 4011351)	0014 / PMI	m²	11.854,24	11.854,24		11.854,24	-	0,43	5097,32	R$ 5.097,32	R$ -	R$ 5.097,32	R$ -	100,00%		
01.10.010	Asfalto diluido de petróleo CM-30 - (ANP NE + ICMS)	0015 / PMI	kg	14.225,09	14.225,09		14.225,09	0,00	7,06	100429,13	R$ 100.429,13	R$ -	R$ 100.429,13	R$ -	100,00%		
01.10.011	Transporte de asfalto diluído de petróleo CM-30	0016 / PMI	t	14,23	14,23		14,23	-	345,39	4914,89	R$ 4.914,89	R$ -	R$ 4.914,89	R$ -	100,00%		
01.10.012	Concreto asfáltico reciclado em usina com adição de asfalto - brita comercial (4011478)	0017 / PMI	t	1.422,51	1.422,51		1.422,51	0,00	217,08	308798,47	R$ 308.798,47	R$ -	R$ 308.798,47	R$ -	100,00%		
01.10.013	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10m³ - carga com carregadeira de 3,40m³ e descarga livre (SICRO - 5915407)	0008 / PMI	t	1.450,97	1.450,97		1.450,97	0,00	3,31	4802,71	R$ 4.802,71	R$ -	R$ 4.802,71	R$ -	100,00%		
01.10.014	Transporte com caminhão basculante de 10m³ - rodovia pavimentada (SICRO - 5914389)	0007 / PMI	tkm	67.893,35	67.893,35		67.893,35	-	0,97	65856,54	R$ 65.856,55	R$ -	R$ 65.856,55	R$ -	100,00%		
01.10.015	Cimento asfáltico CAP-50/70 - (ANP BA + ICMS)	0019 / PMI	kg	78.238,05	78.238,05		78.238,05	- 0,00	5,89	460822,11	R$ 460.821,70	R$ -	R$ 460.821,70	R$ -	100,00%		
01.10.016	Transporte de CAP 50/70	0020 / PMI	t	78,24	78,24		78,24	0,00	345,39	27023,31	R$ 27.023,31	R$ -	R$ 27.023,31	R$ -	100,00%		
01.10.017	Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com estru sora e concreto usinado - areia extraída e brita produzi da (SICRO - 2003948)	0021 / PMI	m	898,00	-		0,00	898,00	14,03	12598,94	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 12.598,94	0,00%		
01.10.018	Caiação mecanizada com fixador de cal (SICRO - 4915724)	0022 / PMI	m²	359,20		**359,20**	359,20	-	2,22	797,42	R$ -	**R$ 797,42**	R$ 797,42	R$ -	100,00%		
01.10.019	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4mm (SICRO - 5213402)	0023 / PMI	m²	567,51	-	**567,51**	567,51	-	8,16	4630,88	R$ -	**R$ 4.630,88**	R$ 4.630,88	R$ -	100,00%		
01.10.020	Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica emulsiona da em água - espessura de 0,4mm (SICRO - 5213406)	0024 / PMI	m²	555,80	-	**555,80**	555,80	-	15,77	8764,96	R$ -	**R$ 8.764,97**	R$ 8.764,96	R$ -	100,00%		
01.10.021	Placa de advertência em fibra, lado de 0,60m - película retrorreflexiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (SICRO - 5213468)	0025 / PMI	un	12,00	-	**12,00**	12,00	-	308,83	3705,96	R$ -	**R$ 3.705,96**	R$ 3.705,96	R$ -	100,00%		
01.10.022	Placa de regulamentação em fibra, D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (SICRO - 5213452)	0026 / PMI	un	7,00	-	**7,00**	7,00	-	308,79	2161,53	R$ -	**R$ 2.161,53**	R$ 2.161,53	R$ -	100,00%		
01.10.023	Placa de regulamentação em fibra, R2 lado 0,60 m - pelí cula retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implant ação (SICRO - 5213460)	0027 / PMI	un	2,00	-	**2,00**	2,00	-	211,87	423,74	R$ -	**R$ 423,74**	R$ 423,74	R$ -	100,00%		
01.10.024	Placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,331 m - pelí cula retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implan tação (SICRO - 5213457)	0028 / PMI	un	2,00	-	**2,00**	2,00	-	531,49	1062,98	R$ -	**R$ 1.062,98**	R$ 1.062,98	R$ -	100,00%		

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.			DATA DE INICIO:05/09/2025	BOLETIM DE MEDIÇÃO 03	AGC
CONTRATADA: AGC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA			DATA DE TÉRMINO: 04/09/2026	Período: 16/01/2026 A 30/01/2026	CONTRATO 227/2025
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana				Data de medição: 18/03/2026	

				QUANTIDADES						VALORES (R$)					
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CODIGO	UNID	CONTRATADA	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
01.10.025	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio públic o, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada e m novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	12436/ORSE	un	8,00	3,00	3,00	6,00	2,00	584,12	4672,96	R$ 1.752,36	**R$ 1.752,36**	R$ 3.504,72	R$ 1.168,24	75,00%
01.10.026	Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação (SICRO - 5219643)	0029 / PMI	un	125,00	-		0,00	125,00	38,05	4756,25	R$ -	**R$ -**	R$ -	R$ 4.756,25	0,00%
01.10.027	Regularização manual e compactação com placa vibratória	11472/ORSE	m2	1.998,31	1.373,14	410,25	1.783,39	214,92	8,58	17145,49	R$ 11.781,54	**R$ 3.519,95**	R$ 15.301,49	R$ 1.844,00	89,24%
01.10.028	Lona plástica preta	03642/ORSE	m2	1.998,31	1.373,14	410,25	1.783,39	214,92	7,32	R$ 14.627,62	R$ 10.051,38	**R$ 3.003,03**	R$ 13.054,41	R$ 1.573,21	89,24%
1.11	REDE COLETORA - DRENAGEM									**R$ 21.440,62**	**R$ 17.993,82**	**R$ -**	**R$ 17.993,82**	**R$ 3.446,80**	**83,92%**
01.11.001	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria (SICRO - 4805757)	0030 / PMI	m³	90,00	90,00		90,00	-	7,77	699,30	R$ 699,30	**R$ -**	R$ 699,30	R$ -	100,00%
01.11.002	Apiloamento manual de fundo de vala	02660/ORSE	m2	60,00	60,00		60,00	-	31,93	1.915,80	R$ 1.915,80	**R$ -**	R$ 1.915,80	R$ -	100,00%
01.11.003	Reaterro e compactação com soquete vibratório (SICRO - 4 815871)	0031 / PMI	m³	78,22	78,22		78,22	-	19,97	1.562,05	R$ 1.562,05	**R$ -**	R$ 1.562,05	R$ -	100,00%
01.11.004	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado c a2 d=0,40 m	02675/ORSE	m	60,00	60,00		60,00	-	106,76	6.405,60	R$ 6.405,60	**R$ -**	R$ 6.405,60	R$ -	100,00%
01.11.005	Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 m (SICRO - 4915633)	0032 / PMI	m	35,00	35,00		35,00	-	12,56	439,60	R$ 439,60	**R$ -**	R$ 439,60	R$ -	100,00%
01.11.006	Entrada para descida d'agua - EDA 01 A - areia extraida e brita produzida (SICRO - 2003104)	0033 / PMI	un	2,00	2,00		2,00	-	126,81	253,62	R$ 253,62	**R$ -**	R$ 253,62	R$ -	100,00%
01.11.007	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 40-20 - arei a extraida e brita produzida (SICRO - 2003388)	0034 / PMI	m	6,00	6,00		6,00	-	192,00	1.152,00	R$ 1.152,00	**R$ -**	R$ 1.152,00	R$ -	100,00%
01.11.008	Caixa de ligação e passagem - CLP 01 - areia extraida e brita produzida (SICRO - 2003641)	0035 / PMI	un	1,00	1,00		1,00	-	1044,52	1.044,52	R$ 1.044,52	**R$ -**	R$ 1.044,52	R$ -	100,00%
01.11.009	Boca de lobo simples - BLS 02 - areia extraida e brita p roduzida (SICRO - 2003619)	0036 / PMI	un	4,00	4,00		4,00	-	952,89	3.811,56	R$ 3.811,56	**R$ -**	R$ 3.811,56	R$ -	100,00%
01.11.010	Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 02 - arei a extraida e brita produzida (SICRO - 2003635)	0037 / PMI	un	2,00	-		0,00		1723,40	3.446,80	R$ -	**R$ -**	R$ -	R$ 3.446,80	0,00%
01.11.011	Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia extraida e brita produzida - alas retas (SICRO - 0804060)	0038 / PMI	un	3,00	3,00		3,00	-	236,59	709,77	R$ 709,77	**R$ -**	R$ 709,77	R$ -	100,00%
1.12	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA									**99.324,50**	**R$ 74.493,38**	**R$ 24.831,13**	**R$ 99.324,51**	**R$ -**	**100,00%**
01.12.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementa res	90777 / SINAPI	h	300,00	225,00	75,00	300,00	-	146,43	43.929,00	R$ 32.946,75	**R$ 10.982,25**	R$ 43.929,00	R$ -	100,00%
01.12.002	Encarregado geral com encargos complementares	90776 / SINAPI	h	600,00	450,00	150,00	600,00	-	40,47	24.282,00	R$ 18.211,50	**R$ 6.070,50**	R$ 24.282,00	R$ -	100,00%
01.12.003	Auxiliar de escritorio com encargos complementares	90772 / SINAPI	h	300,00	225,00	75,00	300,00	-	19,42	5.826,00	R$ 4.369,50	**R$ 1.456,50**	R$ 5.826,00	R$ -	100,00%
01.12.004	Almoxarife com encargos complementares	90766 / SINAPI	h	300,00	225,00	75,00	300,00	-	26,18	7.854,00	R$ 5.890,50	**R$ 1.963,50**	R$ 7.854,00	R$ -	100,00%
01.12.005	Vigia diurno com encargos complementares	00289 / SINAPI	h	400,00	300,00	100,00	400,00	-	24,59	9.836,00	R$ 7.377,00	**R$ 2.459,00**	R$ 9.836,00	R$ -	100,00%
01.12.006	Motorista de veiculo leve com encargos complementares	88284 / SINAPI	h	250,00	187,50	62,50	250,00	-	30,39	7.597,50	R$ 5.698,13	**R$ 1.899,38**	R$ 7.597,50	R$ -	100,00%
TOTAL DO ORÇAMENTO										**R$ 1.534.671,75**	**R$ 1.711.172,12** 93,25%	**R$ 66.818,86** 3,64%	**R$ 1.777.990,98** 96,91%	**R$ 56.680,72** 3,09%	**96,91%**

ASSINATURA RESPONSÁVEL TÉCNICO	ASSINATURA FISCALIZAÇÃO	VALOR DA MEDIÇÃO: R$ 66.818,86 (Sessenta e seis mil, oitocentos e dezoito reais e oitenta e seis centavos.).
ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415 Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415		DATA LIBERAÇÃO : _____/_____/_____

gov.br Documento assinado digitalmente
JHON LENNON GOMES SANTOS
Data: 24/03/2026 15:59:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
DIEGO OLIVEIRA BARROS
Data: 24/03/2026 16:07:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

CONTRATADA: AGC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATO 227/2025

Período: 16/01/2026 A 30/01/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
1.01	CANTEIRO DE OBRAS		
01.01.004	Aluguel de betoneira 400 l com motor à diesel (com carre gador)	QUANTIDADE DE MESES UTILIZADOS	TOTAL
	POVOADO PÉ DE VIADO	MêS	
		5,00	5,00
EXECUTADO NO PERÍODO:			5,00
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			5,00
SALDO A MEDIR:			0,00
CONTRATO:			5,00
A MEDIR NO PERÍODO:			5,00
		MEMORIA DE CÁLCULO	

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

CONTRATADA: AGC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATO 227/2025

Período: 16/01/2026 A 30/01/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO		UND	
1.05	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA			
01.05.001	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retira da diária (5213835 - SICRO)	QUANTIDADE DE CONES	QUANTIDADE DE DIAS UTILIZADOS	TOTAL
	POVOADO PÉ DE VIADO	un	dia	un*dia
		8,00	150,00	1.200,00
EXECUTADO NO PERÍODO:				1.200,00
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				1.200,00
SALDO A MEDIR:				0,00
CONTRATO:				1.200,00
A MEDIR NO PERÍODO:				1.200,00
			MEMORIA DE CÁLCULO	

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

CONTRATADA: AGC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATO 227/2025

Periodo: 16/01/2026 A 30/01/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO		UND	
1.05	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA			
01.05.002	Placa de regulamentação para sinalização de obras montad as em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização d e 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirad a diária (5212557 - SICRO)	QUANTIDADE	QUANTIDADE DE DIAS UTILIZADOS	TOTAL
	POVOADO PÉ DE VIADO	un	dia	un*dia
		3,40	150,00	510,00
EXECUTADO NO PERÍODO:				510,00
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				510,00
SALDO A MEDIR:				0,00
CONTRATO:				510,00
A MEDIR NO PERIODO:				510,00
			MEMORIA DE CÁLCULO	

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

CONTRATADA: AGC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATO 227/2025

Periodo: 16/01/2026 A 30/01/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO		UND	
1.05	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA			
01.05.003	Placa de regulamentação para sinalização de obras montad as em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização d e 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirad a diária (5212557 - SICRO)	QUANTIDADE	QUANTIDADE DE DIAS UTILIZADOS	TOTAL
	POVOADO PÉ DE VIADO	un	dia	un*dia
		1,00	180,00	180,00
EXECUTADO NO PERÍODO:				180,00
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				180,00
SALDO A MEDIR:				0,00
CONTRATO:				180,00
A MEDIR NO PERIODO:				180,00
			MEMORIA DE CÁLCULO	

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

CONTRATADA: AGC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATO 227/2025

Periodo: 16/01/2026 A 30/01/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO		
1.05	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA		
01.05.004	Placa de regulamentação para sinalização de obras montad a em suporte metálico móvel, R2 lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retira da diária (5212559 - SICRO)	QUANTIDADE	TOTAL
	POVOADO PÉ DE VIADO	un	un
		60,00	60,00
EXECUTADO NO PERÍODO:			60,00
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			60,00
SALDO A MEDIR:			0,00
CONTRATO:			60,00
À MEDIR NO PERÍODO:			60,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

CONTRATADA: AGC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATO 227/2025

Periodo: 16/01/2026 A 30/01/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO		UND	
1.05	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA			
01.05.005	Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plás tica com suporte móvel afixado em bloco de concreto - ut ilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária (SICRO - 5213348)	QUANTIDADE	QUANTIDADE DE DIAS UTILIZADOS	TOTAL
	POVOADO PÉ DE VIADO	un	dia	un*dia
		20,00	150,00	3.000,00
EXECUTADO NO PERÍODO:				3.000,00
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				3.000,00
SALDO A MEDIR:				0,00
CONTRATO:				180,00
À MEDIR NO PERÍODO:				3.000,00

MEMORIA DE CÁLCULO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

CONTRATADA: AGC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATO 227/2025

Periodo: 16/01/2026 A 30/01/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
1.10	PAVIMENTAÇÃO			
01.10.001	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com co ncreto moldado in loco, feito em obra, acabamento conven cional, não armado. af_08/2022	ÁREA TOTAL EXECUTADA	ESPESSURA	VOLUME TOTAL
	POVOADO PÉ DE VIADO	m²	m	m³
		410,25	0,07	28,72
EXECUTADO NO PERÍODO:				28,72
ACUMULADO ANTERIOR:				96,12
ACUMULADO ATUAL:				124,84
SALDO A MEDIR:				15,04
CONTRATO:				139,88
A MEDIR NO PERÍODO:				28,72

MEMORIA DE CÁLCULO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

CONTRATADA: AGC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATO 227/2025

Periodo: 16/01/2026 A 30/01/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
1.10	PAVIMENTAÇÃO			
01.10.018	Caiação mecanizada com fixador de cal (SICRO - 4915724)	QUANTIDADE DE MEIO-FIO	Perímetro (m)	TOTAL
	POVOADO PÉ DE VIADO	m	m	m³
		898,00	0,40	359,20
EXECUTADO NO PERÍODO:				359,20
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				359,20
SALDO A MEDIR:				0,00
CONTRATO:				359,20
A MEDIR NO PERÍODO:				359,20

MEMORIA DE CÁLCULO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

CONTRATADA: AGC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATO 227/2025

Período: 16/01/2026 A 30/01/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
1.10	PAVIMENTAÇÃO		
01.10.019	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4mm (SICRO - 5213402)	QUANTIDADE	TOTAL
	POVOADO PÉ DE VIADO	m²	m²
	De acordo com o projeto de sinalização	567,51	567,51
	EXECUTADO NO PERÍODO:		567,51
	ACUMULADO ANTERIOR:		0,00
	ACUMULADO ATUAL:		567,51
	SALDO A MEDIR:		0,00
	CONTRATO:		567,51
	A MEDIR NO PERÍODO:		567,51
			MEMORIA DE CÁLCULO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

CONTRATADA: AGC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATO 227/2025

Período: 16/01/2026 A 30/01/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
1.10	PAVIMENTAÇÃO		
01.10.020	Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica emulsiona da em água - espessura de 0,4mm (SICRO - 5213406)	QUANTIDADE	TOTAL
	POVOADO PÉ DE VIADO	m²	
	De acordo com o projeto de sinalização	555,80	555,80
	EXECUTADO NO PERÍODO:		555,80
	ACUMULADO ANTERIOR:		0,00
	ACUMULADO ATUAL:		555,80
	SALDO A MEDIR:		0,00
	CONTRATO:		555,80
	A MEDIR NO PERÍODO:		555,80
			MEMORIA DE CÁLCULO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

CONTRATADA: AGC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATO 227/2025

Período: 16/01/2026 A 30/01/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
1.10	PAVIMENTAÇÃO		
01.10.021	Placa de advertência em fibra, lado de 0,60m - película retrorreflexiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (SICRO - 5213468)	QUANTIDADE	TOTAL
	POVOADO PÉ DE VIADO		
De acordo com o projeto de sinalização		12,00	12,00
EXECUTADO NO PERÍODO:			12,00
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			12,00
SALDO A MEDIR:			0,00
CONTRATO:			12,00
A MEDIR NO PERÍODO:			12,00
		MEMORIA DE CÁLCULO	

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

CONTRATADA: AGC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATO 227/2025

Período: 16/01/2026 A 30/01/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
1.10	PAVIMENTAÇÃO		
01.10.022	Placa de regulamentação em fibra, D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (SICRO - 5213452)	QUANTIDADE	TOTAL
	POVOADO PÉ DE VIADO		
De acordo com o projeto de sinalização		7,00	7,00
EXECUTADO NO PERÍODO:			7,00
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			7,00
SALDO A MEDIR:			0,00
CONTRATO:			7,00
A MEDIR NO PERÍODO:			7,00
		MEMORIA DE CÁLCULO	

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

CONTRATADA: AGC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATO 227/2025

Período: 16/01/2026 A 30/01/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
1.10	PAVIMENTAÇÃO		
01.10.023	Placa de regulamentação em fibra, R2 lado 0,60 m - pelíc ula retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implant ação (SICRO - 5213460)	QUANTIDADE	TOTAL
	POVOADO PÉ DE VIADO		
De acordo com o projeto de sinalização		2,00	2,00
EXECUTADO NO PERÍODO:			2,00
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			2,00
SALDO A MEDIR:			0,00
CONTRATO:			2,00
A MEDIR NO PERÍODO:			2,00
		MEMORIA DE CÁLCULO	

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

CONTRATADA: AGC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATO 227/2025

Período: 16/01/2026 A 30/01/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
1.10	PAVIMENTAÇÃO		
01.10.024	Placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,331 m - peli cula retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implan tação (SICRO - 5213457)	QUANTIDADE	TOTAL
	POVOADO PÉ DE VIADO		
De acordo com o projeto de sinalização		2,00	2,00
EXECUTADO NO PERÍODO:			2,00
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			2,00
SALDO A MEDIR:			0,00
CONTRATO:			2,00
A MEDIR NO PERÍODO:			2,00
		MEMORIA DE CÁLCULO	

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

CONTRATADA: AGC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATO 227/2025

Período: 16/01/2026 A 30/01/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
1.10	PAVIMENTAÇÃO		
01.10.025	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio públic o, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada e m novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	QUANTIDADE EXECUTADA	QUANTIDADE TOTAL
	POVOADO PÉ DE VIADO	UN	UN
		3,00	3,00
EXECUTADO NO PERÍODO:			3,00
ACUMULADO ANTERIOR:			3,00
ACUMULADO ATUAL:			6,00
SALDO A MEDIR:			2,00
CONTRATO:			8,00
A MEDIR NO PERÍODO:			3,00
		MEMORIA DE CÁLCULO	

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

CONTRATADA: AGC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATO 227/2025

Período: 16/01/2026 A 30/01/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
1.10	PAVIMENTAÇÃO		
01.10.027	Regularização manual e compactação com placa vibratória	QUANTIDADE EXECUTADA	ÁREA TOTAL
	POVOADO PÉ DE VIADO	m²	m²
De acordo com a área executada		410,25	410,25
EXECUTADO NO PERÍODO:			410,25
ACUMULADO ANTERIOR:			1.373,14
ACUMULADO ATUAL:			1.783,39
SALDO A MEDIR:			214,92
CONTRATO:			1.998,31
A MEDIR NO PERÍODO:			410,25
		MEMORIA DE CÁLCULO	

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

CONTRATADA: AGC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATO 227/2025

Período: 16/01/2026 A 30/01/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
1.10	PAVIMENTAÇÃO		
01.10.028	Lona plástica preta	QUANTIDADE EXECUTADA	ÁREA TOTAL
	POVOADO PÉ DE VIADO	m²	m²
De acordo com a área executada		410,25	410,25
EXECUTADO NO PERÍODO:			410,25
ACUMULADO ANTERIOR:			1.373,14
ACUMULADO ATUAL:			1.783,39
SALDO A MEDIR:			214,92
CONTRATO:			1.998,31
A MEDIR NO PERÍODO:			410,25
		MEMORIA DE CÁLCULO	

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

CONTRATADA: AGC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATO 227/2025

Período: 16/01/2026 A 30/01/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
1.12	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA			
01.12.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementa res	QUANTIDADE	TOTAL CONTRATO	TOTAL DE HORAS EXECUTADAS
	POVOADO PÉ DE VIADO	%	H	H
		25,00%	300,00	75,00
EXECUTADO NO PERÍODO:				75,00
ACUMULADO ANTERIOR:				225,00
ACUMULADO ATUAL:				300,00
SALDO A MEDIR:				0,00
CONTRATO:				300,00
A MEDIR NO PERÍODO:				75,00
		MEMORIA DE CÁLCULO		

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

CONTRATADA: AGC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATO 227/2025

Período: 16/01/2026 A 30/01/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
1.12	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA			
01.12.002	Encarregado geral com encargos complementares	QUANTIDADE	TOTAL CONTRATO	TOTAL DE HORAS EXECUTADAS
	POVOADO PÉ DE VIADO	%	H	H
		25,00%	600,00	150,00
EXECUTADO NO PERÍODO:				150,00
ACUMULADO ANTERIOR:				450,00
ACUMULADO ATUAL:				600,00
SALDO A MEDIR:				0,00
CONTRATO:				600,00
A MEDIR NO PERÍODO:				150,00
	MEMORIA DE CÁLCULO			

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

CONTRATADA: AGC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATO 227/2025

Período: 16/01/2026 A 30/01/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
1.12	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA			
01.12.003	Auxiliar de escritorio com encargos complementares	QUANTIDADE	TOTAL CONTRATO	TOTAL DE HORAS EXECUTADAS
	POVOADO PÉ DE VIADO	%	H	H
		25,00%	300,00	75,00
EXECUTADO NO PERÍODO:				75,00
ACUMULADO ANTERIOR:				225,00
ACUMULADO ATUAL:				300,00
SALDO A MEDIR:				0,00
CONTRATO:				300,00
A MEDIR NO PERÍODO:				75,00
	MEMORIA DE CÁLCULO			

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

CONTRATADA: AGC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATO 227/2025

Período: 16/01/2026 A 30/01/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
1.12	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA			
01.12.004	Almoxarife com encargos complementares	QUANTIDADE	TOTAL CONTRATO	TOTAL DE HORAS EXECUTADAS
	POVOADO PÉ DE VIADO	%	H	H
		25,00%	300,00	75,00
EXECUTADO NO PERÍODO:				75,00
ACUMULADO ANTERIOR:				225,00
ACUMULADO ATUAL:				300,00
SALDO A MEDIR:				0,00
CONTRATO:				300,00
A MEDIR NO PERÍODO:				75,00
		MEMORIA DE CÁLCULO		

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

CONTRATADA: AGC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATO 227/2025

Período: 16/01/2026 A 30/01/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
1.12	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA			
01.12.005	Vigia diurno com encargos complementares	QUANTIDADE	TOTAL CONTRATO	TOTAL DE HORAS EXECUTADAS
	POVOADO PÉ DE VIADO	%	H	H
		25,00%	400,00	100,00
EXECUTADO NO PERÍODO:				100,00
ACUMULADO ANTERIOR:				300,00
ACUMULADO ATUAL:				400,00
SALDO A MEDIR:				0,00
CONTRATO:				400,00
A MEDIR NO PERÍODO:				100,00
		MEMORIA DE CÁLCULO		

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

CONTRATADA: AGC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATO 227/2025

Período: 16/01/2026 A 30/01/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
1.12	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA			
01.12.006	Motorista de veículo leve com encargos complementares	QUANTIDADE	TOTAL CONTRATO	TOTAL DE HORAS EXECUTADAS
	POVOADO PÉ DE VIADO	%	H	H
		25,00%	250,00	62,50
EXECUTADO NO PERÍODO:				62,50
ACUMULADO ANTERIOR:				187,50
ACUMULADO ATUAL:				250,00
SALDO A MEDIR:				0,00
CONTRATO:				250,00
A MEDIR NO PERÍODO:				62,50

Documento assinado digitalmente
gov.br DIEGO OLIVEIRA BARROS
Data: 26/01/2026 16:07:04-03'00'
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MEMORIA DE CÁLCULO

Documento assinado digitalmente
gov.br JHON LENNON GOMES SANTOS
Data: 27/01/2026 [illegible]
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

3ª MEDIÇÃO

EMPRESA: **AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

SERVIÇO: **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.**

LOCAL: **POVOADO PÉ DO VEADO**

CONTRATO: **227/2025**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

LOCAL DA OBRA: POVOADO PÉ DO VEADO- ITABAIANA-SE

PROCESSO ADMINISTRATIVO: CONTRATO: 227/2025

MEDIÇÃO 03

Período: 16/01/2026 a 31/01/2026

ITEM	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	

FOTO 01- Sinaiização Horizontai



FOTO 02 - Sinalização Horizontai



FOTO 03 - Sinalização Horizontal/Rampa

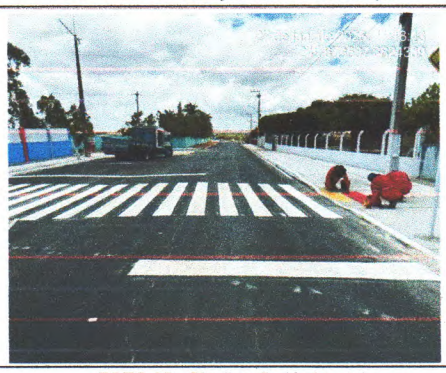

FOTO 04 - Sinalização Horizontal



FOTO 05 - Sinalização Horizontal



FOTO 06 - Sinalização Horizontal



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

LOCAL DA OBRA: POVOADO PÉ DO VEADO- ITABAIANA-SE

PROCESSO ADMINISTRATIVO: CONTRATO: 227/2025

MEDIÇÃO 03

Período: 16/01/2026 a 31/01/2026

ITEM	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	

FOTO 07 - Sinalização Horizontal/ verticai



FOTO 08 - Sinalização Verticai



FOTO 09 - Rampa



FOTO 10 - Sinalização Horizontal



FOTO 11 - Calçada

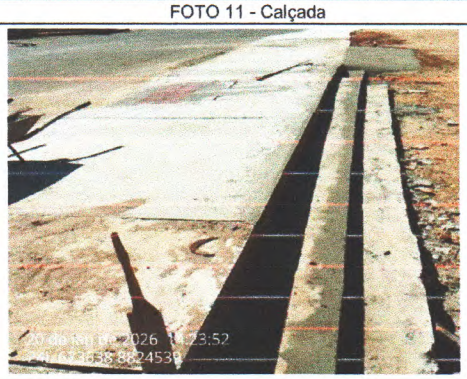

FOTO 12 - Calçada



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.	
LOCAL DA OBRA: POVOADO PÉ DO VEADO- ITABAIANA-SE	
PROCESSO ADMINISTRATIVO: CONTRATO: 227/2025	

MEDIÇÃO 03

Período: 16/01/2026 a 31/01/2026

ITEM	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	

FOTO 13 - Caiçada



FOTO 14 - Caiçada



FOTO 15 - Sinalização Vertical



FOTO 16 - Sinalização Vertical



ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415

gov.br Documento assinado digitalmente
JHON LENNON GOMES SANTOS
Data: 24/03/2026 15:59:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
DIEGO OLIVEIRA BARROS
Data: 24/03/2026 16:07:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
