OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE VIAS DO MUNICÍPIO (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO)	BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO Nº 251/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	B.M.Nº. 03/2026	ORDEM DE SERVIÇO = 13/07/2026
CONTRATADA: DINÂMICA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	PERIODO: 10/08/2026 A 08/09/2026	DATA: 08/09/2026

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R$	VALORES R$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							517.439,40	209.120,69	233.515,35	442.636,02	74.803,38	85,54
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	10000,00	4.041,50	4.582,45	8.623,95	50,11	R$ 501.100,00	202.519,57	229.626,57	432.146,13	68.953,87	86,24
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	0,00	0,00	0,00	0,00	37,36	R$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.003	Paralelepípedo granitico (com frete)	mil	10,00	4,04	2,38	6,42	1633,94	R$ 16.339,40	6.601,12	3.888,78	10.489,89	5.849,51	64,20
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R$ 28.009,98	11.026,70	12.313,70	23.340,40	4.669,58	83,33
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	101,52	40,08	44,76	84,84	155,26	R$ 15.762,00	6.222,82	6.949,44	13.172,26	2.589,74	83,57
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	203,05	79,64	88,93	168,57	60,32	R$ 12.247,98	4.803,88	5.364,26	10.168,14	2.079,84	83,02
Total geral								545.449,38	220.147,40	245.829,05	465.976,45	79.472,93	85,43

Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana
CREA RN 2717140603

Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.
Data: ___/___/_____

Aprovado para pagamento
Data: ___/___/_____

MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525
Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525
Dados: 2026.09.17 12:13:28 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
SHEISSICA BEZERRA DE MACEDO
Data: 17/09/2026 12:17:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJ
Data: 17/09/2026 12:24:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO)			MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 251/2026		DINÂMICA ENGENHARIA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 03/2026	ORDEM DE SERVIÇO = 13/07/2026		
CONTRATADA: DINÂMICA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA			PERIODO: 10/08/2026 A 08/09/2026	DATA: 08/09/2026		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	10/08/2026	ESTR. SECUNDÁRIA PARA O ZANGUE	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	33,00	5,50	**181,50**
2	11/08/2026	ESTR. SECUNDÁRIA PARA O ZANGUE	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	31,00	6,00	**186,00**
3	12/08/2026	ESTR. SECUNDÁRIA PARA O ZANGUE	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	36,00	6,20	**223,20**
4	13/08/2026	ESTR. SECUNDÁRIA PARA O ZANGUE	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	30,00	6,50	**195,00**
5	14/08/2026	ESTR. SECUNDÁRIA PARA O ZANGUE	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	34,00	6,80	**231,20**
6	17/08/2026	RUA MARIA DE LOURDES DE JESUS	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	29,00	7,00	**203,00**
7	18/08/2026	RUA MARIA DE LOURDES DE JESUS	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	32,00	7,20	**230,40**
8	19/08/2026	RUA MARIA DE LOURDES DE JESUS	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	28,00	7,40	**207,20**
9	20/08/2026	RUA MARIA DE LOURDES DE JESUS	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	31,00	7,60	**235,60**
10	21/08/2026	RUA MARIA DE LOURDES DE JESUS	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	27,00	7,80	**210,60**
11	24/08/2026	RUA NOEL JOSÉ DE SANTANA	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	30,00	8,00	**240,00**
12	25/08/2026	RUA NOEL JOSÉ DE SANTANA	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	35,00	5,80	**203,00**
13	26/08/2026	RUA NOEL JOSÉ DE SANTANA	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	33,00	6,10	**201,30**
14	27/08/2026	RUA NOEL JOSÉ DE SANTANA	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	37,00	6,40	**236,80**
15	28/08/2026	RUA NOEL JOSÉ DE SANTANA	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	31,00	6,70	**207,70**
16	31/08/2026	RUA NOEL JOSÉ DE SANTANA	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	32,00	7,10	**227,20**
17	01/09/2026	RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	29,00	7,30	**211,70**
18	02/09/2026	RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	34,00	7,50	**255,00**
19	03/09/2026	RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	28,00	7,70	**215,60**
20	04/09/2026	RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	31,00	7,90	**244,90**
21	08/09/2026	RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	35,69	6,60	**235,55**
TOTAL GERAL DE AREA RECUPERADA (m²)==>						**4.582,45**

gov.br
Documento assinado digitalmente
SHEISSICA BEZERRA DE MACEDO
Data: 09/09/2026 12:12:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525

Assinado digitalmente por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525
ND: C=BR, CN=MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525, L=CAMPO DO BRITO, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla, ST=SE
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.09 12:07:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DINÂMICA
ENGENHARIA

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO)

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03/2026

ESTR. SECUNDÁRIA PARÁ O ZANGUE



ESTR. SECUNDÁRIA PARÁ O ZANGUE



ESTR. SECUNDÁRIA PARÁ O ZANGUE



ESTR. SECUNDÁRIA PARÁ O ZANGUE



ESTR. SECUNDÁRIA PARÁ O ZANGUE



RUA MARIA DE LOURDES DE JESUS



Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Engª Civil CREA - 27158104-24
Coordenadora de Medição
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DINÂMICA
ENGENHARIA

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO)

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03/2026

RUA MARIA DE LOURDES DE JESUS



RUA MARIA DE LOURDES DE JESUS



RUA MARIA DE LOURDES DE JESUS

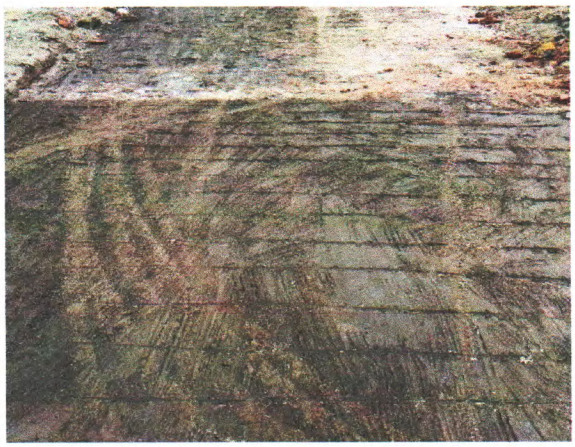

RUA MARIA DE LOURDES DE JESUS



RUA NOEL JOSÉ DE SANTANA



RUA NOEL JOSÉ DE SANTANA



Rúbia Milena Rodrigues Araújo
Engª Civil CREA - 2715819424
Coordenadora do Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DINÂMICA
ENGENHARIA

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO)

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03/2026

RUA NOEL JOSÉ DE SANTANA



RUA NOEL JOSÉ DE SANTANA



RUA NOEL JOSÉ DE SANTANA



RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS



RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS



RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS



Engª Civil CREA - 271818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DINÂMICA ENGENHARIA

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO)

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 03/2026

RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS



RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS



RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS



Núbia Viviane S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 271501842-4
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525

Assinado digitalmente por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525
ND: C=BR, CN=MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525, L=CAMPO DO BRITO, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla, ST=SE
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.09 12:07:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

gov.br
Documento assinado digitalmente
SHEISSICA BEZERRA DE MACEDO
Data: 09/09/2026 12:12:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
