GLOBAL
CONSTRUÇÕES

Obra
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA - ESCOLA MUNICIPAL DOM JOSÉ THOMAZ- POV. RIO DAS PEDRAS

Bancos
ORSE - 11/2025 - Sergipe

B.D.I.
23,54%

Encargos
Não Desonerado:

PERIODO: 04/07/2026 a 14/08/2026

BOLETIM DE MEDIÇÃO 04

Orçamento Sintético

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	QUANTIDADE			VALOR		
						ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO	ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO
1	**MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA - ESCOLA MUNICIPAL DOM JOSÉ THOMAZ- POV. RIO DAS PEDRAS**				**476.261,81**				**185.147,00**	**192.331,00**	**377.478,00**
01.01	**REFORMA QUADRA DOM JOSÉ THOMAZ - POV. RIO DAS PEDRAS**				**476.261,81**				**185.147,00**	**192.331,00**	**377.478,00**
01.01	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				**47.978,40**				**R$ 13.288,00**	**R$ 8.126,14**	**R$ 21.414,14**
01.01.001	**EQUIPE DIRIGENTE**				**47.978,40**				**R$ 13.288,00**	**R$ 8.126,14**	**R$ 21.414,14**
01.01.002	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	240,00	158,22	37.972,80	55,00	40,82	95,82	8.702,10	6.458,54	15.160,64
01.01.003	Mestre de obras com encargos complementares	h	120,00	83,38	10.005,60	55,00	20,00	75,00	4.585,90	1.667,60	6.253,50
01.02	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**										
01.02.001	**PLACA DE OBRA**				**4.669,30**				**R$ 2.801,58**	**R$ 0,00**	**R$ 2.801,58**
01.02.001.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	10,00	466,93	4.669,30	6,00		6,00	2.801,58	-	2.801,58
01.02.003	**CANTEIRO DE OBRAS**				**36.269,97**				**R$ 8.170,88**	**R$ 0,00**	**R$ 8.170,88**
01.02.003.001	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	10,00	310,88	3.108,80	10,00		10,00	3.108,80	-	3.108,80
01.02.003.002	Ligação predial de água em mureta de concreto, provisória ou definitiva, com fornecimento de material, inclusive mureta e hidrômetro, rede DN 50mm - ver 03 _10/2022	und	1,00	730,11	730,11	-		-	-	-	-
01.02.003.003	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	153,76	210,92	32.431,06	24,00		24,00	5.062,08	-	5.062,08
01.02.003	**COBERTURA**				**29.649,60**				**R$ 29.649,60**	**R$ 0,00**	**R$ 29.649,60**

André Agassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Mikaely da Silva Oliveira
Arq Urb CAU/SE A195461-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Arnaldo de M. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Camilla Ribeiro Cruz
Eng. Civil - CREA/BA 0516025570

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal

01.02.003.001	Recuperação de estrutura metálica de cobertura, com substituição de peças metálicas, solda e pintura em pilares, vigas e terças - obra reforma da quadra SEDUC	und	1,00	29.649,60	29.649,60	1,00		1,00	29.649,60	-	29.649,60
01.02.004	**ARQUIBANCADA**				**16.346,98**				**R$ 12.232,73**	**R$ 4.114,25**	**R$ 16.346,98**
01.02.004.001	Demolição de reboco	m²	43,41	11,43	496,18	43,41		43,41	496,18	-	496,18
01.02.004.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	43,41	8,33	361,61	43,41		43,41	361,61	-	361,61
01.02.004.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento /areia) com rebotec, espessura 2,0cm	m²	43,41	40,89	1.775,03	43,41		43,41	1.775,03	-	1.775,03
01.02.004.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de liquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exterioes - ver 03	m²	239,80	57,19	13.714,16	167,86	71,94	239,80	9.599,91	4.114,25	13.714,16

José Amaldo de M Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031699
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Mikaely da Silva Oliveira
Arq Urb CAU/SE A195461-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

André Ágassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Camilla Ribeiro Cruz
Eng. Civil - CREA/BA 0516025570

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal

01.02.005	**PALCO**				**5.277,34**				**R$ 3.954,53**	**R$ 1.140,37**	**R$ 5.094,90**
01.02.005.001	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento /areia) com rebotec, espessura 2,0cm	m²	17,60	40,89	719,66	17,60		17,60	719,66	-	719,66
01.02.005.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	17,60	8,33	146,61	17,60		17,60	146,61	-	146,61
01.02.005.003	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de liquido selador acrilico, 02 demãos de massa acrilica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exterioes - ver 03	m²	77,13	57,19	4.411,06	54,00	19,94	73,94	3.088,26	1.140,37	4.228,63
01.02.006	**QUADRA**				**5.237,50**				**R$ 3.508,14**	**R$ 1.729,35**	**R$ 5.237,50**
01.02.006.001	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, e = 5 cm, aplicação manual af_ 05/2021	m	143,04	12,09	1.729,35	-	143,04	143,04	-	1.729,35	1.729,35
01.02.006.002	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m	45,36	77,34	3.508,14	45,36		45,36	3.508,14	-	3.508,14
01.02.007	**ALAMBRADO**				**31.784,88**				**R$ 0,00**	**R$ 31.784,88**	**R$ 31.784,88**
01.02.007.001	Tela de aço galvanizado fio 12bwg, com revestimento, malha 2"	m²	153,68	183,63	28.220,26	-	153,68	153,68	-	28.220,26	28.220,26
01.02.007.002	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m²	105,12	9,93	1.043,84	-	105,12	105,12	-	1.043,84	1.043,84
01.02.007.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metalicas - R1	m²	105,12	23,98	2.520,78	-	105,12	105,12	-	2.520,78	2.520,78
01.02.008	**REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO/WC**				**2.618,50**				**R$ 0,00**	**R$ 2.618,50**	**R$ 2.618,50**
01.02.008.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	52,06	8,33	433,66	-	52,06	52,06	-	433,66	433,66
01.02.008.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento/cal/areia), espessura 1,5cm	m²	28,74	39,84	1.145,00	-	28,74	28,74	-	1.145,00	1.145,00
01.02.008.003	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento/cal/areia), espessura 2,0cm	m²	23,32	44,59	1.039,84	-	23,32	23,32	-	1.039,84	1.039,84
01.02.009	**PINTURA WC**				**4.052,69**				**R$ 0,00**	**R$ 4.052,69**	**R$ 4.052,69**
01.02.009.001	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques -R1	m²	20,00	13,96	279,20	-	20,00	20,00	-	279,20	279,20
01.02.009.002	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de liquido selador acrilico, 02 demãos de massa acrilica e 02 demãos de tinta latex convencional para exteriores - Rer 03	m²	39,38	57,19	2.252,14		39,38	39,38	-	2.252,14	2.252,14
01.02.009.003	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de liquido selador acrilico, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta latex convencional para interiores. Ver. 03_ 04/2022	m²	20,00	53,27	1.065,40		20,00	20,00	-	1.065,40	1.065,40

André Ágassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Mikaely da Silva Oliveira
Arq Urb CAU/SE A195451-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031693
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Camilla Ribeiro Cruz
Eng. Civil - CREA/BA 0516025570

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal

01.02.009.004	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m²	6,72	67,85	455,95	-	6,72	6,72	-	455,95	455,95
01.02.010	**DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO**				**66,16**				**R$ 0,00**	**R$ 66,16**	**R$ 66,16**
01.02.010.001	Remoção de lavatório	und	2,00	16,54	33,08	-	2,00	2,00	-	33,08	33,08
01.02.010.002	Remoção de vaso sanitário	und	2,00	16,54	33,08	-	2,00	2,00	-	33,08	33,08
01.02.011	**FORRO**				**562,80**				**R$ 0,00**	**R$ 562,80**	**R$ 562,80**
01.02.011.001	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_08/2023_ps	m²	5,00	59,29	296,45	-	5,00	5,00	-	296,45	296,45
01.02.011.002	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de liquido selador acrílico, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta latex convencional para interiores. Ver. 03_ 04/2022	m²	5,00	53,27	266,35	-	5,00	5,00	-	266,35	266,35

José Arnaldo de M Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

André Ágassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

Mikaely da Silva Oliveira
Arq Urb CAU/SE A195461-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

Camilla Ribeiro Cruz
Eng. Civil - CREA/BA 0516025570

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal

01.02.012	**PASSEIOS EXTERNOS**				**52.402,15**				**R$ 45.029,60**	**R$ 7.372,56**	**R$ 52.402,15**
01.02.012.001	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. Af_ 08/2022	m³	38,68	837,64	32.399,92	30,93	7,75	38,68	25.908,21	6.491,71	32.399,92
01.02.012.002	Lona plástica preta	m²	386,78	6,82	2.637,84	386,78		386,78	2.637,84	-	2.637,84
01.02.012.003	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	386,78	33,45	12.937,79	386,78		386,78	12.937,79	-	12.937,79
01.02.012.004	Regularização Manual	m²	386,78	6,89	2.664,91	386,78		386,78	2.664,91	-	2.664,91
01.02.012.005	Junta serrada, dimensões 6x60mm, com preenchimento de mastique de poliuretano MBT, basf ou similar, para pavimentos em concreto	m	64,46	27,33	1.761,69	32,23	32,23	64,46	880,85	880,85	1.761,69
01.02.013	**MURO**				**170.728,77**				**R$ 40.913,15**	**R$ 92.063,93**	**R$ 132.977,08**
01.02.013.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metalicas - R1	m²	80,60	23,98	1.932,79	-	80,60	80,60	-	1.932,79	1.932,79
01.02.013.002	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de anti-corrosiva zarcão - R2	m²	80,60	9,93	800,36	-	80,60	80,60	-	800,36	800,36
01.02.013.003	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de liquido selador acrilico, 02 demãos de massa acrilica e 02 demãos de tinta latex convencional para exteriores - Rer 03	m²	2.937,50	57,19	167.995,63	715,39	1.562,00	2.277,39	40.913,15	89.330,78	130.243,93
01.02.014	**DIVERSOS**				**9.994,77**				**R$ 0,00**	**R$ 5.952,47**	**R$ 5.952,47**
01.02.014.001	Par de tabelas de basquete de compensado naval, com aros e redes fornecimento e instalação. af_03/2022	und	2,00	4.042,30	8.084,60	-	1,00	1,00	-	4.042,30	4.042,30
01.02.014.002	Rede para trave de futebol de salão (Futsal)	par	1,00	361,80	361,80	-	1,00	1,00	-	361,80	361,80
01.02.014.003	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	und	1,00	305,38	305,38	-	1,00	1,00	-	305,38	305,38
01.02.014.004	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1,00	1.242,99	1.242,99	-	1,00	1,00	-	1.242,99	1.242,99
01.02.015	**INSTALAÇÕES HIDRAULICA**				**2.429,47**				**R$ 0,00**	**R$ 2.429,47**	**R$ 2.429,47**
01.02.015.001	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico com elevação do piso, linha popular, elizabeth ou similar, com assento plastico universal branco, cj fixação, tubo de ligação e engate plástico, excego cx descarga - ver 02	und	2,00	458,41	916,82	-	2,00	2,00	-	916,82	916,82
01.02.015.002	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos ode plasticos, conj. De fixação(deca ref sp7) ou similares	und	2,00	322,24	644,48	-	2,00	2,00	-	644,48	644,48
01.02.015.003	Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 500 litros	und	1,00	823,99	823,99	-	1,00	1,00	-	823,99	823,99
01.02.015.004	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitario af_ 08/2022	und	2,00	22,09	44,18	-	2,00	2,00	-	44,18	44,18
01.02.016	**INSTALAÇÕES ELETRICA**										
01.02.016.001	**PROJETO ELETRICO QUADRA DOM JOSE THOMAZ**				**3.278,50**				**R$ 3.135,32**	**R$ 0,00**	**R$ 3.135,32**

André Agassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Mikaely da Silva Oliveira
Arq Urb CAU/SE A195461-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Camilla Ribeiro Cruz
Eng. Civil - CREA/BA 0516025570

Jose Arnaldo da N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal

01.02.016.001	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03	und	1,00	586,86	586,86	1,00	1,00	586,86	-	586,86
01.02.016.001	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação af._ 07/2025	und	1,00	83,76	83,76	1,00	1,00	83,76	-	83,76
01.02.016.001	Armação secundária, com 3 estribos e 3 isoladores - fornecimento e instalação. Af 07/2020	und	1,00	143,18	143,18	-	-	-	-	-
01.02.016.001	cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 10mm², 1kv / 90° C	m	50,00	20,78	1.039,00	50,00	50,00	1.039,00	-	1.039,00
01.02.016.001	poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h= 6,00m ,completo	und	1,00	614,83	614,83	1,00	1,00	614,83	-	614,83
01.02.016.001	caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão energisa	und	1,00	22,94	22,94	1,00	1,00	22,94	-	22,94
01.02.016.001	forrnecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	und	1,00	163,99	163,99	1,00	1,00	163,99	-	163,99
01.02.016.001	eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	6,00	26,71	160,26	6,00	6,00	160,26	-	160,26
01.02.016.001	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	und	3,00	5,81	17,43	3,00	3,00	17,43	-	17,43
01.02.016.001	cabeçote de alumínio de 1 1/4"	und	1,00	17,63	17,63	1,00	1,00	17,63	-	17,63
01.02.016.001	eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	15,00	21,31	319,65	15,00	15,00	319,65	-	319,65
01.02.016.001	curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	und	2,00	10,24	20,48	2,00	2,00	20,48	-	20,48
01.02.016.001	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	und	8,00	3,99	31,92	8,00	8,00	31,92	-	31,92
01.02.016.001	curva de 90° de pvc rígido roscável diâm = 1 1/4"	und	1,00	56,57	56,57	1,00	1,00	56,57	-	56,57
01.02.016.002	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO**				**887,77**			**R$ 887,77**	**R$ 0,00**	**R$ 887,77**
01.02.016.002	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação af._ 07/2025	und	1,00	83,76	83,76	1,00	1,00	83,76	-	83,76
01.02.016.002	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação af. 07/2025	und	1,00	14,54	14,54	1,00	1,00	14,54	-	14,54
01.02.016.002	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação af 07/2025	und	1,00	69,47	69,47	1,00	1,00	69,47	-	69,47

André Ágassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Mikaely da Silva Oliveir
Arq Urb CAU/SE A195451-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Camilla Ribeiro Cruz
Eng. Civil - CREA/BA 0516025570

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal

01.02.016.002	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação af 07/2025	und	1,00	65,30	65,30	1,00		1,00	65,30	-	65,30
01.02.016.002	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação af. 07/2025	und	2,00	13,52	27,04	2,00		2,00	27,04	-	27,04
01.02.016.002	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	und	1,00	440,73	440,73	1,00		1,00	440,73	-	440,73
01.02.016.002	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	und	1,00	22,94	22,94	1,00		1,00	22,94	-	22,94
01.02.016.002	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	und	1,00	163,99	163,99	1,00		1,00	163,99	-	163,99
01.02.016.003	**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**				**52.026,27**				**R$ 21.575,70**	**R$ 30.317,43**	**R$ 51.893,13**
01.02.016.003	Luminária high bay led DC 100w, 150° (2 x50w) 5000k, 150 LM/W, em aluminio com alça, autovolt, branca , ref. HBMLED-DC-150-100-50-3C, da Glight ou similar	und	20,00	745,56	14.911,20	20,00		20,00	14.911,20	-	14.911,20
01.02.016.003	Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação af. 09/2024	und	14,00	128,06	1.792,84	-	14,00	14,00	-	1.792,84	1.792,84
01.02.016.003	Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13 w - fornecimento e instalação af. 09/2024	und	2,00	31,42	62,84	-	2,00	2,00	-	62,84	62,84
01.02.016.003	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	und	7,00	44,38	310,66	-	4,00	4,00	-	177,52	177,52
01.02.016.003	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação af. 03/2023	und	7,00	33,34	233,38	-	7,00	7,00	-	233,38	233,38
01.02.016.003	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado 3/4	pt	2,00	250,34	500,68	-	2,00	2,00	-	500,68	500,68
01.02.016.003	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c	m	450,00	11,77	5.296,50	450,00		450,00	5.296,50	-	5.296,50
01.02.016.003	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação af. 03/2023	m	120,00	11,40	1.368,00	120,00		120,00	1.368,00	-	1.368,00
01.02.016.003	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação af. 03/2023	m	120,00	20,04	2.404,80	-	120,00	120,00	-	2.404,80	2.404,80
01.02.016.003	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	15,00	21,31	319,65		15,00	15,00	-	319,65	319,65
01.02.016.003	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	und	2,00	10,24	20,48	-	2,00	2,00	-	20,48	20,48

André Agassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Mikaely da Silva Oliveira
Arq Urb CAU/SE A1954S1-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Camilla Ribeiro Cruz
Eng. Civil - CREA/BA 0516025570

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal

01.02.016.003	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	und	8,00	3,99	31,92	-	8,00	8,00	-	31,92	31,92
01.02.016.003	POnto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado aparente 3/4	und	43,00	295,24	12.695,32	-	43,00	43,00	-	12.695,32	12.695,32
01.02.016.003	Eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	33,00	16,67	550,11	-	33,00	33,00	-	550,11	550,11
01.02.016.003	Curva para eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 25mm (3/4")	und	2,00	7,46	14,92	-	2,00	2,00	-	14,92	14,92
01.02.016.003	Luva para eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 25mm (3/4")	und	12,00	2,57	30,84	-	12,00	12,00	-	30,84	30,84
01.02.016.003	Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior de 60mm, diâmetro da base 126mm, altura total 8m, conipost ref. Serie A0008/ classe 30 da conipost ou similar	und	2,00	2.876,04	5.752,08	-	2,00	2,00	-	5.752,08	5.752,08
01.02.016.003	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 petalas encaixe em poste com top de 0 de 48mm/60,3mm,encaixe da luminaria de 48mm/60,3mm	und	2,00	263,58	527,16	-	2,00	2,00	-	527,16	527,16
01.02.016.003	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K,IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,16.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3, PINOS, MODELO GL421 G-light ou similar	und	4,00	1.253,99	5.015,96	-	4,00	4,00	-	5.015,96	5.015,96
01.02.016.003	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	und	1,00	22,94	22,94	-	1,00	1,00	-	22,94	22,94
01.02.016.003	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	und	1,00	163,99	163,99	-	1,00	1,00	-	163,99	163,99

	VALOR TOTAL		476.261,81		Total Geral		R$ 185.147,00		R$ 192.331,00		R$ 377.478,00

Global Construções, Serviços e Manutenções LTDA
23.694.541/0001-62

André Agassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504

Assinado de forma digital por CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504

Mikaely da Silva Oliveira
Arq Urb CAU/SE A1054[illegible]-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2[illegible]1031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Camilla Ribeiro Cruz
Eng. Civil - CREA/BA 0516025570

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305, CENTRO,
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICÍPAL DE ITABAIANA — PERIODO: 04/07/2026 A 14/08/2026

ENCARGOS SOCIAIS - NÃO DESONERADO

OBJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA - ESCOLA MUNICIPAL DOM JOSÉ THOMAZ- POV. RIO DAS PEDRAS

CONTRATO: 048/2026 — BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 — ORSE - 11/2025 - Sergipe B.D.I. 23,54%

MEMÓRIA DE CÁCULO			
01.01.002	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares		
	40,82		
	40,82	H	
01.01.003	Mestre de obras com encargos complementares		
	20		
	20	H	
01.02.004.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de liquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrilica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exterioes - ver 03		
	11,99 X 6,00		
	71,94	m²	
01.02.005.003	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de liquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrilica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exterioes - ver 03		
	9,97 X 2,00		
	19,94	m²	
01.02.006.001	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, e = 5 cm, aplicação manual af_ 05/2021		
	143,04		
	143,04	m	
01.02.007.001	Tela de aço galvanizado fio 12bwg, com revestimento, malha 2"		
	19,21 X 8,00		
	153,68	m²	
01.02.007.002	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2		
	13,14 X 8,00		
	105,12	m²	
01.02.007.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metalicas - R1		
	13,14 X 8,00		
	105,12	m²	
01.02.008.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015		
	8,39 X 6,21		
	52,06	m²	
01.02.008.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento/cal/areia), espessura 1,5c		
	7,185 X 4,00		

Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Arnaldo de M. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Mikaely da Silva Oliveira
Arq Urb CAU/SE A195461-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

		28,74 m²
01.02.008.003	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento/cal/areia), espessura 2,0cm	
		5,83 X 4,00
		23,32 m²
01.02.009.001	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques -R1	
		5,00 X 4,00
		20 m²
01.02.009.002	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de liquido selador acrilico, 02 demãos de massa acrilica e 02 demãos de tinta latex convencional para exteriores - Rer 03	
		7,03 X 5,60
		39,38 m²
01.02.009.003	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de liquido selador acrilico, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta latex convencional para interiores. Ver. 03_ 04/2022	
		5,00 X 4,00
		20 m²
01.02.009.004	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	
		2,80 X 2,40
		6,72 m²
01.02.010.001	Remoção de lavatório	
		2
		2 UND
01.02.010.002	Remoção de vaso sanitário	
		2
		2 UND
01.02.011.001	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_08/2023_ps	
		2,50 X 2,00
		5 m²
01.02.011.002	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de liquido selador acrilico, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta latex convencional para interiores. Ver. 03_ 04/202	
		2,50 X 2,00
		5 m²
01.02.012.001	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. Af_ 08/2022	
		31,00 X 5,00 X 0,05
		7,75 M³
01.02.012.005	Junta serrada, dimensões 6x60mm, com preenchimento de mastique de poliuretano MBT, basf ou similar, para pavimentos em concreto	
		32,23
		32,23 M

André Agassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Mikaely da Silva Oliveira
Arq Urb CAU/SE A195461-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

01.02.013.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metalicas - R1

10,00 X 8,06		
80,6	m²	

01.02.013.002	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de anti-corrosiva zarcão - R2

10,00 X 8,06		
80,6	m²	

01.02.013.003	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de liquido selador acrilico, 02 demãos de massa acrilica e 02 demãos de tinta latex convencional para exteriores - Rer 03

62,48 X 25,00		
1.562,00	m²	

01.02.014.001	Par de tabelas de basquete de compensado naval, com aros e redes fornecimento e instalação. af_03/2022

1		
1,00	UND	

01.02.014.002	Rede para trave de futebol de salão (Futsal)

1		
1,00	PAR	

01.02.014.003	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura

1		
1,00	UND	

01.02.014.004	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca

1		
1,00	PAR	

01.02.015.001	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente fisico com elevação do piso, linha popular, elizabeth ou similar, com assento plastico universal branco, cj fixação, tubo de ligação e engate plástico, excego cx descarga - ver 02

2		
2,00	UND	

01.02.015.002	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos ode plasticos, conj. De fixação(deca ref sp7) ou similares

2		
2,00	UND	

01.02.015.003	Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 500 litros

1		
1,00	UND	

01.02.015.004	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitario af_ 08/2022

2		
2,00	UND	

01.02.016.003	Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação af. 09/2024

14		
14,00	UND	

André Ágassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Mikaely da Silva Oliveira
Arq Urb CAU/SE A195461-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

01.02.016.003	Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13 w - fornecimento e instalação af. 09/2024
2	
2,00	UND
01.02.016.003	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel
4	
4,00	UND
01.02.016.003	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação af. 03/2023
7	
7,00	UND
01.02.016.003	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado 3/4
2	
2,00	PT
01.02.016.003	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação af. 03/2023
120	
120,00	M
01.02.016.003	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")
15	
15,00	M
01.02.016.003	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")
2	
2,00	UND
01.02.016.003	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")
8	
8,00	UND
01.02.016.003	POnto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente 3/4
43	
43,00	UND
01.02.016.003	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")
33	
33,00	M
01.02.016.003	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")
2	
2,00	UND
01.02.016.003	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")
12	
12,00	UND

André Ágassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Arnaldo do N Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Mikaely da Silva Oliveira
Arq Urb CAU/SE A195451-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

01.02.016.003	Poste de aço galvanizado cônico contino reto, diâmetro superior de 60mm, diâmetro da base 126mm, altura total 8m, conipost ref. Serie A0008/ classe 30 da conipost ou similar

2	
2,00	UND

01.02.016.003	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 petalas encaixe em poste com top de 0 de 48mm/60,3mm,encaixe da luminaria de 48mm/60,3mm

2	
2,00	UND

01.02.016.003	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K,IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,16.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3, PINOS, MODELO GL421 G-light ou similar

4	
4,00	UND

01.02.016.003	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa

1	
1,00	UND

01.02.016.003	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector

1	
1,00	UND

Jose Arnaldo de N Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504

Assinado de forma digital por CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504

André Agassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

GLOBAL CONSTRUÇÕES		CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itabaiana - SE	OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO , REFORMA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA - ESCOLA MUNICIPAL DOM JOSÉ THOMAZ, POVOADO RIO DAS PEDRAS, NESTE MUNICÍPIO
CONTRATO: 048/2026	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 04/07/2026 À 14/08/2026	CONTRATADA: GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-04	DATA DA MEDIÇÃO: 14/08/2026		

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

1



DESCRIÇÃO
01.02.004.004 PINTURA ARQUIBANCADA

2



DESCRIÇÃO
01.02.005.003 PINTURA PALCO

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

3



DESCRIÇÃO
01.02.006.001 PINTURA DEMARCAÇÃO

4



DESCRIÇÃO
01.02.007.001 ALAMBRADO / 01.02.007.002 / 01.02.007.003

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

5



DESCRIÇÃO
01.02.008.001 / 01.02.008.002 REBOCO WC / 01.02.008.003

6



DESCRIÇÃO
01.02.009.001 / 01.02.009.002 PINTURA WC / 01.02.009.003 / 01.02.009.004

André Ágassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Arnaldo da N. Pereira Jr.
Eng. Civil CREA - 272103183
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Mikaely da Silva Oliveira
Arq Urb CAU/SE A195461-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

7

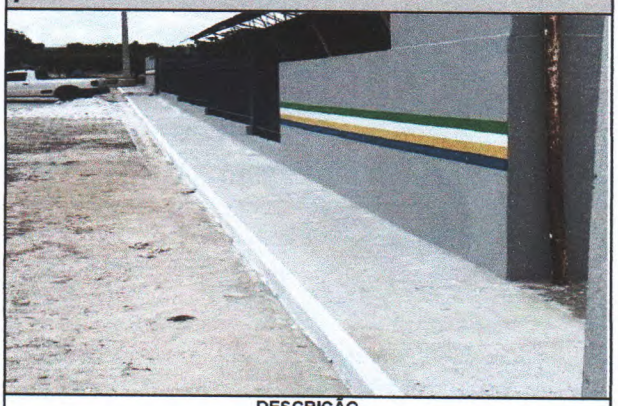

DESCRIÇÃO
01.02.012.001 PASSEIO / 01.02.012.005 JUNTA

8

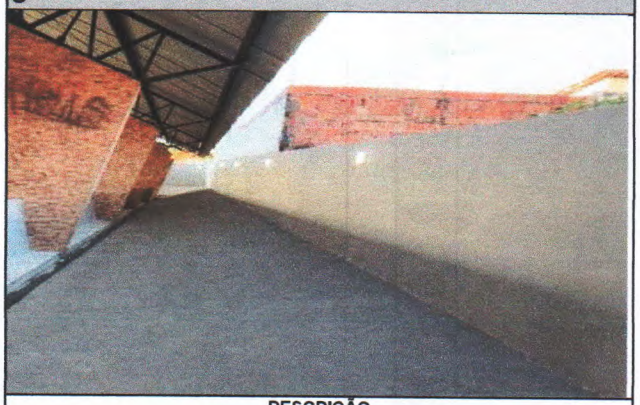

DESCRIÇÃO
01.02.013.001 PINTURA MURO / 01.02.013.002

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

9



DESCRIÇÃO
01.02.013.003 PINTURA EXTERIORES

10

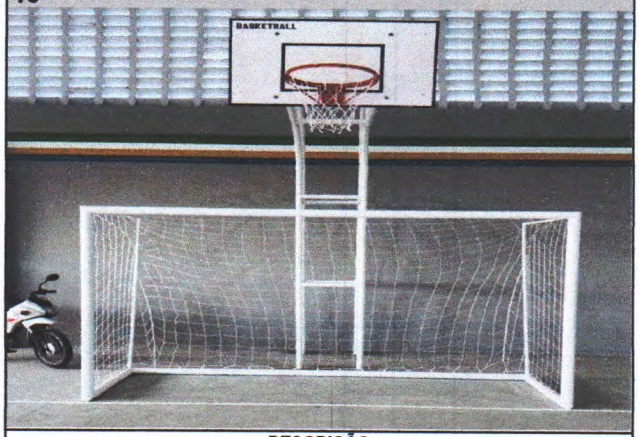

DESCRIÇÃO
01.02.014.001 TABELA DE BASQUETE / 01.02.014.002

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

11



DESCRIÇÃO
01.02.014.003 REDE / 01.02.014.003 POSTE VOLEI

12



DESCRIÇÃO
01.02.015.001 VASO SANITARIO / 01.02.015.004

André Agassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Mikaely da Silva Oliveira
Arq Urb CAU/SE A195461-6
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

13



DESCRIÇÃO
01.02.015.002 LAVATORIO LOUÇA

14

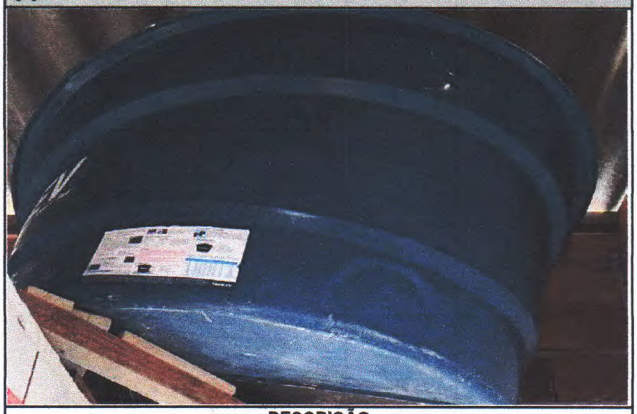

DESCRIÇÃO
01.02.015.003 CAIXA D'AGUA

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

15



DESCRIÇÃO
01.02.016.003 ARANDELA / 01.02.016.003

16

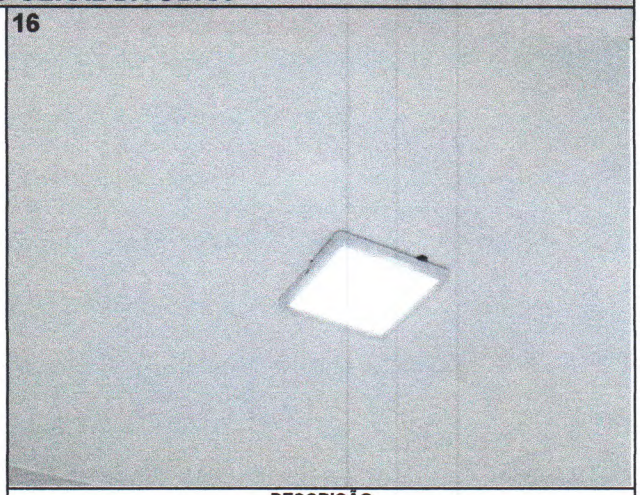

DESCRIÇÃO
01.02.016.003 PAFLON

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

17

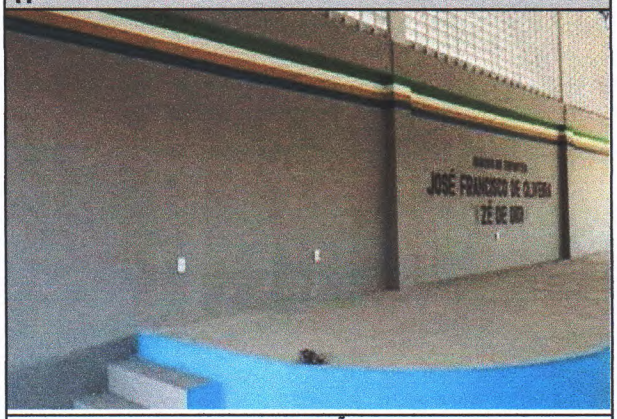

DESCRIÇÃO
01.02.016.003 TOMADA

18



DESCRIÇÃO
01.02.016.003 INTERRUPTOR

André Agassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior

Mikaely da Silva Oliveira
Arq Urb CAU/SE A195461-0
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

19	20
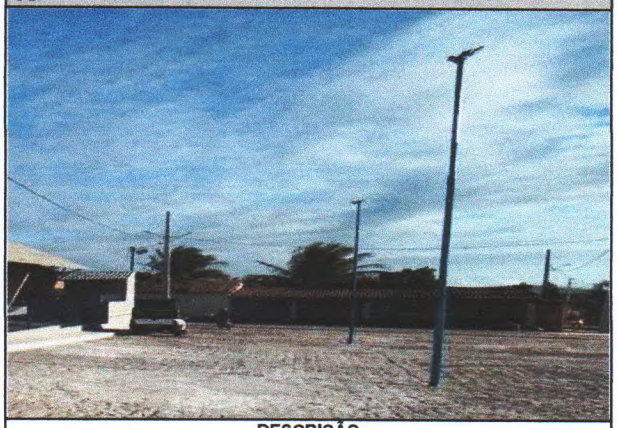	
DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
01.02.016.003 POSTE / SUPORTE / LUMINARIA /	.02.016.003 CAIXA DE ATERRAMENTO / HASTE ATERRAMENT

Jose Jose Arnaldo da N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504

Assinado de forma digital por CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504

André Agassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Mikaely da Silva Oliveira
Arq Urb CAU/SE A195461-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana
