Obra:	REFORMA E CONSTRUÇÃO NO CIE (CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE)		BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO Nº: 194/2026
Contratada:	SALVATORE EMPREENDIMENTOS LTDA		B.M.Nº: 04	
CNPJ:	14.490.446/0001-56		Período: 24/09/2026 à 22/10/2026	Data da medição: 22/10/2026

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R$)	Valores (R$)					
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
00.001◆	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**								**31.471,20**	**15.420,89**	**4.720,68**	**20.141,57**	**11.329,63**	**64,00%**
00.001.001◆	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	120,00	58,80	18,00		120,00	134,90	16.188,00	7.932,12	2.428,20	10.360,32	5.827,68	64,00%
00.001.002◆	Mestre de obras com encargos complementares	h	240,00	117,60	36,00		240,00	63,68	15.283,20	7.488,77	2.292,48	9.781,25	5.501,95	64,00%
00.002◆	**SEVIÇOS PRELIMINARES**								**43.288,53**	**43.288,53**	**0,00**	**43.288,53**	**0,00**	**100,00%**
00.002.001◆	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	10,00	10,00		10,00	0,00	413,23	4.132,30	4.132,30	0,00	4.132,30	0,00	100,00%
00.002.002◆	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	206,27	206,27		206,27	0,00	189,83	39.156,23	39.156,23	0,00	39.156,23	0,00	100,00%
00.003◆	**ESTACIONAMENTO**								**16.235,06**	**16.235,06**	**0,00**	**16.235,06**	**0,00**	**100,00%**
00.003.001◆	Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia	m2	226,62	226,62		226,62	0,00	71,64	16.235,06	16.235,06	0,00	16.235,06	0,00	100,00%
00.004◆	**PASSEIO (CALÇADA)**								**11.839,70**	**11.855,47**	**0,00**	**11.855,47**	**-15,77**	
00.004.001◆	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	130,61	130,61		130,61	0,00	31,87	4.162,54	4.162,54	0,00	4.162,54	0,00	100,00%
00.004.002◆	Lona plástica preta	m2	130,61	130,61		130,61	0,00	6,33	826,76	826,76	0,00	826,76	0,00	100,00%
00.004.003◆	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	130,31	130,61		130,61	-0,30	52,57	6.850,40	6.866,17	0,00	6.866,17	-15,77	100,23%
00.005◆	**MURO**								**130.048,60**	**78.445,49**	**27.786,21**	**106.231,70**	**23.816,90**	**81,69%**
00.005.001◆	Demolição de reboco	m2	380,08	380,08		380,08	0,00	10,88	4.135,27	4.135,27	0,00	4.135,27	0,00	100,00%
00.005.002◆	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	380,08	380,08		380,08	0,00	42,33	16.088,79	16.088,79	0,00	16.088,79	0,00	100,00%
00.005.003◆	Remoção e reassentamento de esquadria de ferro	m2	36,72	36,72		36,72	0,00	66,65	2.447,39	2.447,39	0,00	2.447,39	0,00	100,00%
00.005.004◆	Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces, inclusive portão	m2	36,72	36,72		36,72	0,00	224,39	8.239,60	8.239,60	0,00	8.239,60	0,00	100,00%
00.005.005◆	Portão em ferro, com barra quadrada de 5/8" na vertical, duas barras de quadrada de 1" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1"	m2	19,60	19,60		19,60	0,00	689,22	13.508,71	13.508,71	0,00	13.508,71	0,00	100,00%
00.005.006◆	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	1.549,06	542,17	542,17	1.084,34	464,72	51,25	79.389,32	27.786,21	27.786,21	55.572,43	23.816,90	70,00%
00.005.007◆	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	208,54	208,54		208,54	0,00	9,15	1.908,14	1.908,14	0,00	1.908,14	0,00	100,00%
00.005.008◆	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	208,54	208,54		208,54	0,00	20,77	4.331,38	4.331,38	0,00	4.331,38	0,00	100,00%
00.006◆	**ÁREA PISCINA**								**29.916,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.916,00**	**0,00%**
00.006.001◆	Gradil em alumínio anodizado branco, com barras de apoio em alumínio anodizado branco de 2"x2" e barras intermediárias e verticais em alumínio anodizado branco de 1" x 1/2"	m2	74,34			0,00	74,34	399,05	29.665,38	0,00	0,00	0,00	29.665,38	0,00%
00.006.002◆	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	un	3,00			0,00	3,00	83,54	250,62	0,00	0,00	0,00	250,62	0,00%
00.007◆	**CONSTRUÇÃO DE QUADRA VOLEI DE AREIA**								**80.173,72**	**52.071,73**	**10.483,67**	**62.555,40**	**17.618,32**	**78,02%**
00.007.001◆	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	16,40	16,40		16,40	0,00	65,37	1.072,07	1.072,07	0,00	1.072,07	0,00	100,00%
00.007.002◆	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021	m3	2,05	2,05		2,05	0,00	511,14	1.047,84	1.047,84	0,00	1.047,84	0,00	100,00%
00.007.003◆	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	13,20	13,20		13,20	0,00	577,69	7.625,51	7.625,51	0,00	7.625,51	0,00	100,00%
00.007.004◆	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	31,60	31,60		31,60	0,00	63,67	2.011,97	2.011,97	0,00	2.011,97	0,00	100,00%
00.007.005◆	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	63,20	31,60	31,60	63,20	0,00	42,33	2.675,26	1.337,63	1.337,63	2.675,26	0,00	100,00%
00.007.006◆	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	63,20			0,00	63,20	51,25	3.239,00	0,00	0,00	0,00	3.239,00	0,00%

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA: 272335322-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jaime Mendonça de Jesus
Eng. Civil CREA 272345146-1
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra:	REFORMA E CONSTRUÇÃO NO CIE (CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE)		BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO Nº: 194/2026
Contratada:	SALVATORE EMPREENDIMENTOS LTDA		B.M.Nº: 04	
CNPJ:	14.490.446/0001-56		Período: 24/09/2026 à 22/10/2026	Data da medição: 22/10/2026

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R$)	Valores (R$)					
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
00.007.007◆	Peça de eucalipto tratado, d= 19 a 22cm, L = 6,00m - Fornecimento	un	42,00	30,00	12,00	42,00	0,00	762,17	32.011,14	22.865,10	9.146,04	32.011,14	0,00	100,00%
00.007.008◆	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	0,30	0,30		0,30	0,00	610,72	183,22	183,22	0,00	183,22	0,00	100,00%
00.007.009◆	Tela fortinet, revestida em pvc, fio 2.5mm, malha 5x10cm com altura = 1,22 m, da Belgo Cercas ou similar, inclusive arame 14 verde de amarração e instalação	m	213,77			0,00	213,77	60,49	12.930,95	0,00	0,00	0,00	12.930,95	0,00%
00.007.010◆	Dreno espinha de peixe (seção (0,40 x 0,40 m), com tubo de pead corrugado perfurado, dn 100 mm, enchimento com brita, envolvido com manta geotêxtil, inclusive conexões. af_07/2021	m	65,30	65,30		65,30	0,00	86,82	5.669,35	5.669,35	0,00	5.669,35	0,00	100,00%
00.007.011◆	Colchão de areia	m3	74,90	74,90		74,90	0,00	136,97	10.259,05	10.259,05	0,00	10.259,05	0,00	100,00%
00.007.012◆	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1,00			0,00	1,00	1.149,31	1.149,31	0,00	0,00	0,00	1.149,31	0,00%
00.007.013◆	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00			0,00	1,00	299,05	299,05	0,00	0,00	0,00	299,05	0,00%
00.008◆	**CIRCULAÇÃO ÁREA EXTERNA (FUNDO DO GINÁSIO)**								**99.910,24**	**10.931,79**	**88.978,45**	**99.910,24**	**0,00**	**100,00%**
00.008.001◆	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	2.002,16	2.002,16		2.002,16	0,00	5,46	10.931,79	10.931,79	0,00	10.931,79	0,00	100,00%
00.008.002◆	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=10cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	741,24		741,24	741,24	0,00	120,04	88.978,45	0,00	88.978,45	88.978,45	0,00	100,00%
00.009◆	**CANTEIRO (PRAÇA)**								**20.625,07**	**9.537,42**	**0,00**	**9.537,42**	**11.087,66**	**46,24%**
00.009.001◆	Lona plástica preta	m2	141,07	141,07		141,07	0,00	6,33	892,97	892,97	0,00	892,97	0,00	100,00%
00.009.002◆	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	141,07	141,07		141,07	0,00	52,57	7.416,05	7.416,05	0,00	7.416,05	0,00	100,00%
00.009.003◆	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	2,00			0,00	2,00	1.147,77	2.295,54	0,00	0,00	0,00	2.295,54	0,00%
00.009.004◆	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	28,20	28,20		28,20	0,00	43,56	1.228,39	1.228,39	0,00	1.228,39	0,00	100,00%
00.009.005◆	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar.	Un	3,00			0,00	3,00	826,78	2.480,34	0,00	0,00	0,00	2.480,34	0,00%
00.009.006◆	Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Sergipark ou similar	Un	1,00			0,00	1,00	1.227,10	1.227,10	0,00	0,00	0,00	1.227,10	0,00%
00.009.007◆	Equipamento de ginástica - jogo de barras - galvanizado - Rev 01	un	1,00			0,00	1,00	5.084,68	5.084,68	0,00	0,00	0,00	5.084,68	0,00%
00.010◆	**CANTEIRO LATERAL (LESTE)**								**6.609,41**	**2.362,69**	**1.912,32**	**4.275,01**	**2.334,40**	**64,68%**
00.010.001◆	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	54,24	54,24		54,24	0,00	43,56	2.362,69	2.362,69	0,00	2.362,69	0,00	100,00%
00.010.002◆	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	51,20		51,20	51,20	0,00	37,35	1.912,32	0,00	1.912,32	1.912,32	0,00	100,00%
00.010.003◆	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	10,00			0,00	10,00	233,44	2.334,40	0,00	0,00	0,00	2.334,40	0,00%
00.011◆	**PAVIMENTAÇÃO LATERAL (LESTE)**								**34.081,76**	**0,00**	**34.081,76**	**34.081,76**	**0,00**	**100,00%**
00.011.001◆	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=10cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	283,92		283,92	283,92	0,00	120,04	34.081,76	0,00	34.081,76	34.081,76	0,00	100,00%
00.012◆	**IRRIGAÇÃO CANTEIROS**								**9.231,74**	**9.119,64**	**0,00**	**9.119,64**	**112,10**	**98,79%**
00.012.001◆	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	12,50	12,50		12,50	0,00	65,37	817,13	817,13	0,00	817,13	0,00	100,00%
00.012.002◆	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	208,38	208,38		208,38	0,00	16,14	3.363,25	3.363,25	0,00	3.363,25	0,00	100,00%
00.012.003◆	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m3	12,50	12,50		12,50	0,00	21,80	272,50	272,50	0,00	272,50	0,00	100,00%

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335322-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rykellme Mendonça de Jesus
Eng. Civil CREA-272345146-1
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra:	REFORMA E CONSTRUÇÃO NO CIE (CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE)	Salvatore	BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO Nº: 194/2026
Contratada:	SALVATORE EMPREENDIMENTOS LTDA		B.M.Nº: 04	
CNPJ:	14.490.446/0001-56		Período: 24/09/2026 à 22/10/2026	Data da medição: 22/10/2026

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R$)	Valores (R$)					
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
00.012.004◆	Conector, cpvc, soldável, dn22mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	25,00	25,00		25,00	0,00	36,50	912,50	912,50	0,00	912,50	0,00	100,00%
00.012.005◆	Aspersor tipo spray, ref. 1804 SAM, marca Rain Bird ou similar	un	25,00	25,00		25,00	0,00	128,58	3.214,50	3.214,50	0,00	3.214,50	0,00	100,00%
00.012.006◆	Tê 90° pvc rígido soldável, LLR, c/bucha de latão na bolsa central, d= 25 x 3/4"	un	15,00	15,00		15,00	0,00	24,24	363,60	363,60	0,00	363,60	0,00	100,00%
00.012.007◆	Curva de 90° de pvc rígido roscável, diâm = 3/4"	un	8,00	8,00		8,00	0,00	18,36	146,88	146,88	0,00	146,88	0,00	100,00%
00.012.008◆	Junção 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	2,00	2,00		2,00	0,00	14,64	29,28	29,28	0,00	29,28	0,00	100,00%
00.012.009◆	Fornecimento de mangueira em polietileno linear de baixa densidade, perfurada a raio laser, para irrigação, com ø=28mm, ref. I100/15, da Santeno ou similar	m	71,40			0,00	71,40	1,57	112,10	0,00	0,00	0,00	112,10	0,00%
00.013◆	**ÁREA VERDE**								**33.006,24**	**0,00**	**24.569,58**	**24.569,58**	**8.436,66**	**74,44%**
00.013.001◆	Planta - Jabuticabeira enxertada (myrciaria cauliflora), h=3,00m, fornecimento e plantio	un	7,00			0,00	7,00	806,40	5.644,80	0,00	0,00	0,00	5.644,80	0,00%
00.013.002◆	Planta - Cajueiro (anacardium occidentale), fornecimento e plantio	un	4,00			0,00	4,00	116,82	467,28	0,00	0,00	0,00	467,28	0,00%
00.013.003◆	Planta - Carambola (averrhoa carambola), fornecimento e plantio	un	8,00			0,00	8,00	116,82	934,56	0,00	0,00	0,00	934,56	0,00%
00.013.004◆	Planta - Manjelão (syzygium cuminil), fornecimento e plantio	un	1,00			0,00	1,00	116,82	116,82	0,00	0,00	0,00	116,82	0,00%
00.013.005◆	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	30,00			0,00	30,00	42,44	1.273,20	0,00	0,00	0,00	1.273,20	0,00%
00.013.006◆	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	657,82		657,82	657,82	0,00	37,35	24.569,58	0,00	24.569,58	24.569,58	0,00	100,00%
00.014◆	**DRENAGEM**								**8.825,88**	**8.825,88**	**0,00**	**8.825,88**	**0,00**	**100,00%**
00.014.001◆	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	36,63	36,63		36,63	0,00	20,77	760,81	760,81	0,00	760,81	0,00	100,00%
00.014.002◆	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	36,63	36,63		36,63	0,00	9,15	335,16	335,16	0,00	335,16	0,00	100,00%
00.014.003◆	Grelha de ferro, Larg=32cm, em vergalhões 5/8", espaçamento=4cm, com requadro em barra chata ferro 2"x5/16"	m	24,42	24,42		24,42	0,00	316,54	7.729,91	7.729,91	0,00	7.729,91	0,00	100,00%
00.015◆	**PISTA ATLETISMO / SALTO A DISTÂNCIA**								**22.131,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.131,30**	
00.015.001◆	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	967,70			0,00	967,70	22,87	22.131,30	0,00	0,00	0,00	22.131,30	0,00%
01◆	**GINÁSIO**								**899.399,32**	**455.085,66**	**0,00**	**455.085,66**	**444.313,66**	**50,60%**
01.001◆	**PISO**								**323.377,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**323.377,10**	**0,00%**
01.001.001◆	Demolição de piso asfáltico (capa) em quadras de tênis de forma manual	m2	1.370,30			0,00	1.370,30	8,69	11.907,91	0,00	0,00	0,00	11.907,91	0,00%
01.001.002◆	Piso flexível de poliuretano sobre camada de borracha granulada, sem juntas, esp=7mm, marca LISONDA ref. Lisonit ou similar	m2	1.370,30			0,00	1.370,30	227,30	311.469,19	0,00	0,00	0,00	311.469,19	0,00%
01.002◆	**COBERTURA**								**214.251,95**	**214.251,94**	**0,00**	**214.251,94**	**0,01**	**100,00%**
01.002.001◆	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	1.752,04	1.752,04		1.752,04	0,00	20,77	36.389,87	36.389,87	0,00	36.389,87	0,00	100,00%
01.002.002◆	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	1.752,04	1.752,04		1.752,04	0,00	9,15	16.031,17	16.031,17	0,00	16.031,17	0,00	100,00%
01.002.003◆	Remoção de telhas de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma mecanizada, com uso de guindaste, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	700,81	700,81		700,81	0,00	4,77	3.342,86	3.342,86	0,00	3.342,86	0,00	100,00%
01.002.004◆	Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019	m2	700,81	700,81		700,81	0,00	223,39	156.553,95	156.553,95	0,00	156.553,95	0,00	100,00%
01.002.005◆	Limpeza de calha de zinco	m	88,72	88,72		88,72	0,00	21,80	1.934,10	1.934,10	0,00	1.934,10	0,00	100,00%
01.003◆	**VEDAÇÃO**								**53.041,83**	**53.041,83**	**0,00**	**53.041,83**	**0,00**	**100,00%**
01.003.001◆	Remoção de brises	m2	79,20	79,20		79,20	0,00	4,33	342,94	342,94	0,00	342,94	0,00	100,00%
01.003.002◆	Brise em perfil "C" de alumínio dobrado anodizado branco	m2	79,20	79,20		79,20	0,00	665,39	52.698,89	52.698,89	0,00	52.698,89	0,00	100,00%
01.004◆	**PAREDE INTERNA**								**30.919,37**	**18.795,99**	**0,00**	**18.795,99**	**12.123,38**	**60,79%**
01.004.001◆	Demolição de reboco	m2	136,80	136,80		136,80	0,00	10,88	1.488,38	1.488,38	0,00	1.488,38	0,00	100,00%
01.004.002◆	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	136,80	136,80		136,80	0,00	37,90	5.184,72	5.184,72	0,00	5.184,72	0,00	100,00%

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA-272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rykelme Mendonça de Jesus
Eng. Civil CREA-272345146-1
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra:	REFORMA E CONSTRUÇÃO NO CIE (CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE)	Salvatore	BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO Nº: 194/2026
Contratada:	SALVATORE EMPREENDIMENTOS LTDA		B.M.Nº: 04	
CNPJ:	14.490.446/0001-56		Período: 24/09/2026 à 22/10/2026	Data da medição: 22/10/2026

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R$)	Valores (R$)					
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
01.004.003◆	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	492,51	246,25		246,25	246,26	49,23	24.246,27	12.122,89	0,00	12.122,89	12.123,38	50,00%
01.005◆	**PAREDE EXTERNA**								**37.276,47**	**8.912,68**	**0,00**	**8.912,68**	**28.363,80**	**23,91%**
01.005.001◆	Demolição de reboco	m2	167,50	167,50		167,50	0,00	10,88	1.822,40	1.822,40	0,00	1.822,40	0,00	100,00%
01.005.002◆	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	167,50	167,50		167,50	0,00	42,33	7.090,27	7.090,28		7.090,28	0,00	100,00%
01.005.003◆	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	553,44			0,00	553,44	51,25	28.363,80	0,00	0,00	0,00	28.363,80	0,00%
01.006◆	**ESQUADRIAS / PORTÕES GINÁSIO**								**5.292,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.292,72**	**0,00%**
01.006.001◆	Revisão de esquadria de ferro	m2	24,00			0,00	24,00	160,69	3.856,56	0,00	0,00	0,00	3.856,56	0,00%
01.006.002◆	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	48,00			0,00	48,00	20,77	996,96	0,00	0,00	0,00	996,96	0,00%
01.006.003◆	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	48,00			0,00	48,00	9,15	439,20	0,00	0,00	0,00	439,20	0,00%
01.007◆	**BANHEIROS QUADRA**								**6.180,26**	**3.021,25**	**0,00**	**3.021,25**	**3.159,01**	**48,89%**
01.007.001◆	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	61,37	61,37		61,37	0,00	49,23	3.021,25	3.021,25	0,00	3.021,25	0,00	100,00%
01.007.002◆	Revisão de esquadria de madeira	m2	7,56			0,00	7,56	118,03	892,31	0,00	0,00	0,00	892,31	0,00%
01.007.003◆	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	9,54			0,00	9,54	142,22	1.356,78	0,00	0,00	0,00	1.356,78	0,00%
01.007.004◆	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	15,12			0,00	15,12	60,18	909,92	0,00	0,00	0,00	909,92	0,00%
01.008◆	**ARQUIBANCADA QUADRA**								**2.975,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.975,34**	**0,00%**
01.008.001◆	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	21,00			0,00	21,00	9,15	192,15	0,00	0,00	0,00	192,15	0,00%
01.008.002◆	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	21,00			0,00	21,00	20,77	436,17	0,00	0,00	0,00	436,17	0,00%
01.008.003◆	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	39,00			0,00	39,00	60,18	2.347,02	0,00	0,00	0,00	2.347,02	0,00%
01.009◆	**TELA NYLON**								**22.739,86**	**971,48**	**0,00**	**971,48**	**21.768,38**	**4,27%**
01.009.001◆	Remoção de Tela de nylon para proteção de fachada/alambrado/quadra de esportes	m²	899,52	899,52		899,52	0,00	1,08	971,48	971,48	0,00	971,48	0,00	100,00%
01.009.002◆	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²	899,52			0,00	899,52	24,20	21.768,38	0,00	0,00	0,00	21.768,38	0,00%
01.010◆	**GUARDA CORPO QUADRA**								**1.315,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.315,28**	**0,00%**
01.010.001◆	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	43,96			0,00	43,96	20,77	913,05	0,00	0,00	0,00	913,05	0,00%
01.010.002◆	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	43,96			0,00	43,96	9,15	402,23	0,00	0,00	0,00	402,23	0,00%
01.011◆	**ADMINISTRAÇÃO**								**4.631,01**	**3.656,80**	**0,00**	**3.656,80**	**974,21**	**78,96%**
01.011.001◆	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	74,28	74,28		74,28	0,00	49,23	3.656,80	3.656,80	0,00	3.656,80	0,00	100,00%
01.011.002◆	Revisão de esquadria de madeira	m2	2,10			0,00	2,10	118,03	247,86	0,00	0,00	0,00	247,86	0,00%
01.011.003◆	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	4,20			0,00	4,20	60,18	252,76	0,00	0,00	0,00	252,76	0,00%
01.011.004◆	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	3,33			0,00	3,33	142,22	473,59	0,00	0,00	0,00	473,59	0,00%
01.012◆	**SALA PROFESSORES**								**4.272,62**	**3.362,41**	**0,00**	**7.609,97**	**1.723,71**	**178,11%**

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335322-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rykelme Mendonça de Jesus
Eng. Civil CREA 272345146-1
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra:	REFORMA E CONSTRUÇÃO NO CIE (CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE)		BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO Nº: 194/2026
Contratada:	SALVATORE EMPREENDIMENTOS LTDA	Salvatore	B.M.Nº: 04	
CNPJ:	14.490.446/0001-56		Período: 24/09/2026 à 22/10/2026	Data da medição: 22/10/2026

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R$)	Valores (R$)					
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
01.012.001◆	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	68,30	68,30		68,30	0,00	49,23	3.362,41	3.362,41	0,00	3.362,41	0,00	100,00%
01.012.002◆	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	4,20			0,00	4,20	60,18	252,76	0,00	0,00	0,00	252,76	0,00%
01.012.003◆	Revisão de esquadria de madeira	m2	2,10			0,00	2,10	118,03	247,86	0,00	0,00	0,00	247,86	0,00%
01.012.004◆	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	2,88			0,00	2,88	142,22	409,59	0,00	0,00	0,00	409,59	0,00%
01.013◆	**SALA DOS PRIMEIROS SOCORROS**								**2.937,28**	**2.123,78**	**0,00**	**2.123,78**	**813,50**	**72,30%**
01.013.001◆	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	43,14	43,14		43,14	0,00	49,23	2.123,78	2.123,78	0,00	2.123,78	0,00	100,00%
01.013.002◆	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	4,20			0,00	4,20	60,18	252,76	0,00	0,00	0,00	252,76	0,00%
01.013.003◆	Revisão de esquadria de madeira	m2	2,10			0,00	2,10	118,03	247,86	0,00	0,00	0,00	247,86	0,00%
01.013.004◆	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	2,20			0,00	2,20	142,22	312,88	0,00	0,00	0,00	312,88	0,00%
01.014◆	**VESTIÁRIO FEMININO**								**9.303,48**	**5.366,94**	**0,00**	**5.366,94**	**198,29**	**57,69%**
01.014.001◆	Chuveiro plástico sem registro	un	4,00	4,0000		4,00	0,00	38,74	154,96	154,96	0,00	154,96	0,00	100,00%
01.014.002◆	Revisão de esquadria de madeira	m2	1,68			0,00	1,68	118,03	198,29	0,00	0,00	0,00	198,29	0,00%
01.014.003◆	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	5,22			0,00	5,22	142,22	742,39	0,00	0,00	0,00	742,39	0,00%
01.014.004◆	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	m2	3,24			0,00	3,24	862,24	2.793,66	0,00	0,00	0,00	2.793,66	0,00%
01.014.005◆	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	3,36			0,00	3,36	60,18	202,20	0,00	0,00	0,00	202,20	0,00%
01.014.006◆	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	105,87	105,87		105,87	0,00	49,23	5.211,98	5.211,98	0,00	5.211,98	0,00	100,00%
01.015◆	**VESTIÁRIO ACESSIVEL FEMININO**								**2.686,44**	**1.878,62**	**0,00**	**1.878,62**	**807,82**	**69,93%**
01.015.001◆	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	38,16	38,16		38,16	0,00	49,23	1.878,62	1.878,62	0,00	1.878,62	0,00	100,00%
01.015.002◆	Revisão de esquadria de madeira	m2	2,10			0,00	2,10	118,03	247,86	0,00	0,00	0,00	247,86	0,00%
01.015.003◆	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	2,16			0,00	2,16	142,22	307,20	0,00	0,00	0,00	307,20	0,00%
01.015.004◆	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	4,20			0,00	4,20	60,18	252,76	0,00	0,00	0,00	252,76	0,00%
01.016◆	**VESTIÁRIO ACESSIVEL MASCULINO**								**2.686,44**	**1.878,62**	**0,00**	**1.878,62**	**807,82**	**69,93%**
01.016.001◆	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	38,16	38,16		38,16	0,00	49,23	1.878,62	1.878,62	0,00	1.878,62	0,00	100,00%
01.016.002◆	Revisão de esquadria de madeira	m2	2,10			0,00	2,10	118,03	247,86	0,00	0,00	0,00	247,86	0,00%
01.016.003◆	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	2,16			0,00	2,16	142,22	307,20	0,00	0,00	0,00	307,20	0,00%
01.016.004◆	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	4,20			0,00	4,20	60,18	252,76	0,00	0,00	0,00	252,76	0,00%
01.017◆	**VESTIARIO MASCULINO**								**8.372,26**	**5.211,98**	**0,00**	**5.211,98**	**3.160,28**	**62,25%**
01.017.001◆	Chuveiro plástico sem registro	un	4,00			0,00	4,00	38,74	154,96	0,00	0,00	0,00	154,96	0,00%
01.017.002◆	Revisão de esquadria de madeira	m2	1,68			0,00	1,68	118,03	198,29	0,00	0,00	0,00	198,29	0,00%
01.017.003◆	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	5,22			0,00	5,22	142,22	742,39	0,00	0,00	0,00	742,39	0,00%
01.017.004◆	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	m2	2,16			0,00	2,16	862,24	1.862,44	0,00	0,00	0,00	1.862,44	0,00%

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rykelmo Mendonça de Jesus
Eng. Civil CREA-272345146-1
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra:	REFORMA E CONSTRUÇÃO NO CIE (CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE)	Salvatore	BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO Nº: 194/2026
Contratada:	SALVATORE EMPREENDIMENTOS LTDA		B.M.Nº: 04	
CNPJ:	14.490.446/0001-56		Período: 24/09/2026 à 22/10/2026	Data da medição: 22/10/2026

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R$)	Valores (R$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
01.017.005◆	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	3,36			0,00	3,36	60,18	202,20	0,00	0,00	0,00	202,20	0,00%
01.017.006◆	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	105,87	105,87		105,87	0,00	49,23	5.211,98	5.211,98	0,00	5.211,98	0,00	100,00%
01.018◆	**COPA**								**2.496,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.496,90**	**0,00%**
01.018.001◆	Revisão de esquadria de madeira	m2	2,10			0,00	2,10	118,03	247,86	0,00	0,00	0,00	247,86	0,00%
01.018.002◆	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	1,35			0,00	1,35	142,22	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00%
01.018.003◆	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	4,20			0,00	4,20	60,18	252,76	0,00	0,00	0,00	252,76	0,00%
01.018.004◆	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	36,65			0,00	36,65	49,23	1.804,28	0,00	0,00	0,00	1.804,28	0,00%
01.019◆	**DEPOSITO**								**4.773,24**	**3.362,41**	**0,00**	**3.362,41**	**1.410,83**	**70,44%**
01.019.001◆	Revisão de esquadria de madeira	m2	4,20			0,00	4,20	118,03	495,73	0,00	0,00	0,00	495,73	0,00%
01.019.002◆	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	2,88			0,00	2,88	142,22	409,59	0,00	0,00	0,00	409,59	0,00%
01.019.003◆	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	8,40			0,00	8,40	60,18	505,51	0,00	0,00	0,00	505,51	0,00%
01.019.004◆	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	68,30	68,30		68,30	0,00	49,23	3.362,41	3.362,41	0,00	3.362,41	0,00	100,00%
01.020◆	**ACESSO MEZANINO**								**3.034,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.034,98**	**0,00%**
01.020.001◆	Revisão de esquadria de madeira	m2	2,10			0,00	2,10	118,03	247,86	0,00	0,00	0,00	247,86	0,00%
01.020.002◆	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	0,72			0,00	0,72	142,22	102,40	0,00	0,00	0,00	102,40	0,00%
01.020.003◆	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	4,20			0,00	4,20	60,18	252,76	0,00	0,00	0,00	252,76	0,00%
01.020.004◆	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	49,40			0,00	49,40	49,23	2.431,96	0,00	0,00	0,00	2.431,96	0,00%
01.021◆	**ESCADAS**								**4.559,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.559,75**	**0,00%**
01.021.001◆	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	85,76			0,00	85,76	49,23	4.221,96	0,00	0,00	0,00	4.221,96	0,00%
01.021.002◆	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	11,29			0,00	11,29	9,15	103,30	0,00	0,00	0,00	103,30	0,00%
01.021.003◆	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	11,29			0,00	11,29	20,77	234,49	0,00	0,00	0,00	234,49	0,00%
01.022◆	**MEZANINO**								**5.178,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.295,40**	**0,00%**
01.022.001◆	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	84,82			0,00	84,82	49,23	4.175,69	0,00	0,00	0,00	4.175,69	0,00%
01.022.002◆	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	33,50			0,00	33,50	9,15	306,52	0,00	0,00	0,00	306,52	0,00%
01.022.003◆	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	33,50			0,00	33,50	20,77	695,79	0,00	0,00	0,00	695,79	0,00%
01.023◆	**APARELHOS ESPORTIVOS**								**2.344,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.344,27**	**0,00%**
01.023.001◆	Revisão de esquadria de ferro	m2	10,44			0,00	10,44	160,00	1.677,60	0,00	0,00	0,00	1.677,60	0,00%

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA- 272335322-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rykelme Mendonça de Jesus
Eng. Civil CREA-272345146-1
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra:	REFORMA E CONSTRUÇÃO NO CIE (CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE)	Salvatore	BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO Nº: 194/2026
Contratada:	SALVATORE EMPREENDIMENTOS LTDA		B.M.Nº: 04	
CNPJ:	14.490.446/0001-56		Período: 24/09/2026 à 22/10/2026	Data da medição: 22/10/2026

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R$)	Valores (R$)					
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
01.023.002◆	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	10,44			0,00	10,44	9,15	95,53	0,00	0,00	0,00	95,53	0,00%
01.023.003◆	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	10,44			0,00	10,44	20,77	216,84	0,00	0,00	0,00	216,84	0,00%
01.023.004◆	Rede para trave de futebol de salão (Futsal)	par	1,00			0,00	1,00	354,30	354,30	0,00	0,00	0,00	354,30	0,00%
01.024◆	**SERVIÇOS FINAIS**								**8.118,23**	**0,00**	**0,00**	**6.723,78**	**5.786,24**	**82,82%**
01.024.001◆	Limpeza geral	m2	2.002,16			0,00	2.002,16	2,89	5.786,24	0,00	0,00	0,00	5.786,24	0,00%
01.024.002◆	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00			0,00	1,00	2.331,99	2.331,99	0,00	0,00	0,00	2.331,99	0,00%
01.025◆	**REFORMA DA ILUMINAÇÃO EXTERNA**								**136.634,24**	**129.248,94**	**0,00**	**129.248,94**	**7.385,30**	**94,59%**
01.025.001◆	Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto	un	31,00	31,00		31,00	0,00	2.119,81	65.714,11	65.714,11	0,00	65.714,11	0,00	100,00%
01.025.002◆	Lâmpada led 80w, luz branca 6500k, TLN170 - E40, 120° de ângulo de abertura, marca Glight ou similar	un	24,00	24,00		24,00	0,00	202,13	4.851,12	4.851,12	0,00	4.851,12	0,00	100,00%
01.025.003◆	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	21,00	21,00		21,00	0,00	155,18	3.258,78	3.258,78	0,00	3.258,78	0,00	100,00%
01.025.004◆	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	2,00	2,00		2,00	0,00	360,75	721,50	721,50	0,00	721,50	0,00	100,00%
01.025.005◆	Poste de aço cônico contínuo reto, engastamento simples com 1 m de solo, h=9m - fornecimento e instalação. af_04/2025	un	7,00	7,00		7,00	0,00	2.636,01	18.452,07	18.452,07	0,00	18.452,07	0,00	100,00%
01.025.006◆	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	12,00	12,00		12,00	0,00	257,92	3.095,04	3.095,04	0,00	3.095,04	0,00	100,00%
01.025.007◆	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c	m	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	11,48	22.960,00	22.960,00	0,00	22.960,00	0,00	100,00%
01.025.008◆	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	38,00	38,00		38,00	0,00	22,18	842,84	842,84	0,00	842,84	0,00	100,00%
01.025.009◆	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	38,00	38,00		38,00	0,00	154,96	5.888,48	5.888,48	0,00	5.888,48	0,00	100,00%
01.025.010◆	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	210,00	210,00		210,00	0,00	16,50	3.465,00	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00	100,00%
01.025.011◆	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	70,00			0,00	70,00	7,84	548,80	0,00	0,00	0,00	548,80	0,00%
01.025.012◆	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	20,00			0,00	20,00	2,75	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00%
01.025.013◆	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	210,00			0,00	210,00	21,27	4.466,70	0,00	0,00	0,00	4.466,70	0,00%
01.025.014◆	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	20,00			0,00	20,00	10,85	217,00	0,00	0,00	0,00	217,00	0,00%
01.025.015◆	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	70,00			0,00	70,00	4,23	296,10	0,00	0,00	0,00	296,10	0,00%
01.025.016◆	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	60,00			0,00	60,00	26,72	1.603,20	0,00	0,00	0,00	1.603,20	0,00%
01.025.017◆	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	5,00			0,00	5,00	14,86	74,30	0,00	0,00	0,00	74,30	0,00%
01.025.018◆	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	20,00			0,00	20,00	6,21	124,20	0,00	0,00	0,00	124,20	0,00%
									1.476.793,77	**713.164,39**	**192.532,66**	**905.697,05**	**571.096,72**	**61,33%**
PERCENTUAL									**100,00%**	**48,29%**	**13,04%**	**61,33%**	**38,67%**	

Documento assinado digitalmente
gov.br
LEANDRO DE ASSIS FERREIRA
Data: 22/10/2026 17:05:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA FIRMA

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA
DATA: ____/____/____

VALOR DA MEDIÇÃO:

R$ 192.532,66

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA-272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rykelme Mendonça de Jesus
Eng. Civil CREA-272345146-1
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

SALVATORE EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ sob nº 14.490.446/0001-56

Objeto:	REFORMA E CONSTRUÇÃO NO CIE (CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE)
Contratada:	SALVATORE EMPREENDIMENTOS LTDA
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE
MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONTRATO Nº 194/2026	
B.M.Nº: 04	Período: 24/09/2026 a 22/10/2026 — Data da medição: 22/10/2026

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QTD	COMP.	ALTURA	LARGURA	PERÍMETRO	ÁREA	UNIDADE	TOTAL
00.001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
00.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	18,00						18,00	**18,00**
00.001.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	36,00						36,00	**36,00**
00.005	MURO									
00.005.006	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	542,17	221,85	2,00					**542,17**
00.007	CONSTRUÇÃO DE QUADRA VOLEI DE AREIA									
00.007.005	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	31,60	21,06		1,50				**31,60**
00.007.007	Peça de eucalipto tratado, d= 19 a 22cm, L = 6,00m - Fornecimento	un	12,00						12,00	**12,00**
00.008	CIRCULAÇÃO ÁREA EXTERNA (FUNDO DO GINÁSIO)									
00.008.002	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=10cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	741,24	247,08		3,00				**741,24**
00.010	CANTEIRO LATERAL (LESTE)									
00.010.002	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	51,20	12,80		4,00				**51,20**
00.011	PAVIMENTAÇÃO LATERAL (LESTE)									
00.011.001	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=10cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	283,92	94,64		3,00				**283,92**
00.013	ÁREA VERDE									
00.013.006	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	657,82	164,45		4,00				**657,82**

gov.br
Documento assinado digitalmente
LEANDRO DE ASSIS FERREIRA
Data: 27/10/2026 09:48:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE MEMORIAL DE CÁLCULO FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.

DATA:

Rykelme Mendonça de Jesus
Eng. Civil CREA-272345146-1
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Salvatore
Empreendimentos

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM Nº 04

Ref.: Contrato 194/2026

Objeto: **Boletim de Medição 04 referente aos Serviços de Engenharia para REFORMA E CONSTRUÇÃO NO CIE (CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE) em Itabaiana/SE.**

A Empresa SALVATORE EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ sob nº 14.490.446/0001-56, localizada a Rua José Freire, n° 588 – Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, CEP 49.020-410, representada pelo Sócio Alisson Figueiredo Santos Pinheiro, com o R.G. n°: 32509707 – SSP/SE e CPF nº: 019.082.885-40, vem por intermédio deste apresentar o relatório fotográfico do Boletim de medição n° 04 da obra mencionada acima, onde o mesmo apresenta serviços referente ao período de **Período: 24/09/2026 até 22/10/2026**, conforme **Boletim de Medição nº 04.**

1- MURO: (PINTURA PARA EXTERIORES);





Rykelme Mendonça de Jesus
Eng. Civil CREA-272345146-1
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA-272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

79 9 9913-5920
salvatoreempreendimentosltda@hotmail.com
@salvatoreempreendimentos

Salvatore
Empreendimentos

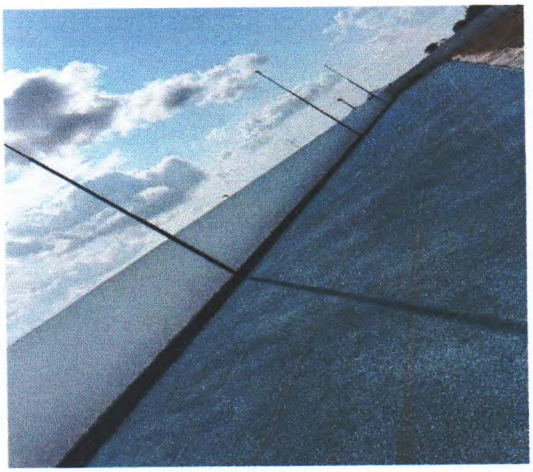

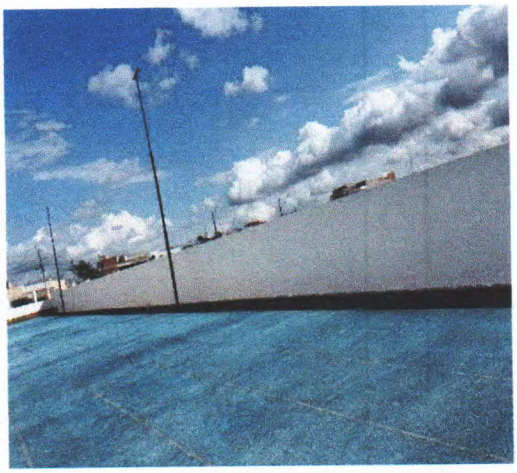



Rykelme Mendonça de Jes
Eng. Civil CREA-272345148
Coordenador de Nucle
Prefeitura Municipal de Itab

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA [illegible]2335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

79 9 9913-5920
salvatoreempreendimentosltda@hotmail.com
@salvatoreempreendimentos

Salvatore
Empreendimentos

2- CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE VÔLEI: (REBOCO EXTERNO, PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO);







Rykelme Mendonça de Jesus
Eng. Civil CREA-272345146-1
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA-272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

79 9 9913-5920
salvatoreempreendimentosltda@hotmail.com
@salvatoreempreendimentos

Salvatore
Empreendimentos

3- CIRCULAÇÃO ÁREA EXTERNA (FUNDO DO GINÁSIO); PAVIMENTAÇÃO LATERAL LESTE: (PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO);






Eng. Civil CREA-272345146-1
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA-272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

79 9 9913-5920
salvatoreempreendimentosltda@hotmail.com
@salvatoreempreendimentos

Salvatore
Empreendimentos




4- CANTEIRO LATERAL LESTE; ÁREA VERDE: (GRAMA ESMERALDA).




Jayk[illegible]elme Mendonça de Jesus
Eng. Civil CREA-272345146-1
Coordenador de Nucleo
[illegible]efeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA-272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

79 9 9913-5920
salvatoreempreendimentosltda@hotmail.com
@salvatoreempreendimentos

Salvatore
Empreendimentos

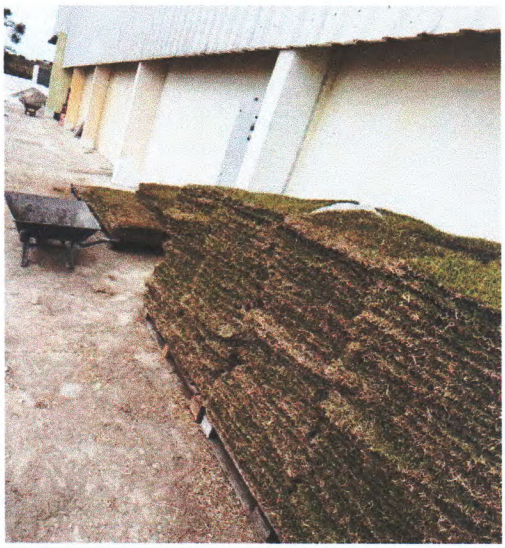

Itabaiana/SE, em 22 de outubro de 2026.

Atenciosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
LEANDRO DE ASSIS FERREIRA
Data: 22/10/2026 19:28:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Leandro de Assis Ferreira

Engenheiro Civil CREA/SE n° 2709639556

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335022-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rykelme Mendonça de Jesus
Eng. Civil CREA-272345146-1
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

79 9 9913-5920
salvatoreempreendimentosltda@hotmail.com
@salvatoreempreendimentos
