	OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA (VESTIÁRIO) NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (POVOADO TERRA DURA), NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CR 965393-OP1.097.075-09/2024/MESP	DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 05	CONTRATO: Nº 258/2025
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA		VIGÊNCIA	25/08/2026	Período: 01/05/2026 a 31/05/2026	RECURSO:
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		EXECUÇÃO	25/08/2026	Data da Medição: 16/07/2026	

Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
	Vestiário								**178.398,82**	**101.270,16**	**25.056,40**	**126.326,56**	**52.072,26**	**70,81**
02.01	**VESTIÁRIO**								**178.398,82**	**101.270,16**	**25.056,40**	**126.326,56**	**52.072,26**	**70,81**
02.01.001	**LOCAÇÃO**								**777,03**	**777,03**	**-**	**777,03**	**-**	**100,00**
02.01.001.001	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	88,50	88,50		88,50	-	8,78	777,03	777,03	-	777,03	-	100,00
02.01.002	**MOVIMENTO DE TERRA**								**2.321,06**	**2.321,06**	**-**	**2.321,06**	**-**	**100,00**
02.01.002.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	11,84	11,84		11,84	-	55,70	659,49	659,49	-	659,49	-	100,00
02.01.002.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	14,21	14,21		14,21	-	9,81	139,40	139,40	-	139,40	-	100,00
02.01.002.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	42,63	42,63		42,63	-	1,03	43,91	43,91	-	43,91	-	100,00
02.01.002.004	Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	8,71	8,71		8,71	-	169,72	1.478,26	1.478,26	-	1.478,26	-	100,00
02.01.003	**INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)**								**11.840,10**	**11.840,10**	**-**	**11.840,10**	**-**	**100,00**
02.01.003.001	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	10,49	10,49		10,49	-	460,83	4.834,11	4.834,11	-	4.834,11	-	100,00
02.01.003.002	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	m3	0,15	0,15		0,15	-	380,96	57,14	57,14	-	57,14	-	100,00
02.01.003.003	Concreto armado fck=21MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em tábua (05 usos)	m3	3,05	3,05		3,05	-	2.278,31	6.948,85	6.948,85	-	6.948,85	-	100,00
02.01.004	**SUPER-ESTRUTURA**								**8.588,74**	**8.588,74**	**-**	**8.588,74**	**-**	**100,00**
02.01.004.001	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	3,90	3,90		3,90	-	2.202,24	8.588,74	8.588,74	-	8.588,74	-	100,00
02.01.005	**LAJES TRELIÇADAS**								**17.428,17**	**17.428,17**	**-**	**17.428,17**	**-**	**100,00**
02.01.005.001	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=16cm, enchimento em bloco ceramico h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	77,94	77,94		77,94	-	201,54	15.708,03	15.708,03	-	15.708,03	-	100,00
02.01.005.002	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	77,94	77,94		77,94	-	22,07	1.720,14	1.720,14	-	1.720,14	-	100,00
02.01.006	**IMPERMEABILIZAÇÃO**								**1.430,03**	**-**	**-**	**-**	**1.430,03**	**-**
02.01.006.001	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m2	47,18	-		-	47,18	30,31	1.430,03	-	-	-	1.430,03	-
02.01.007	**PAREDES**								**15.333,57**	**13.346,93**	**1.986,64**	**15.333,57**	**-**	**100,00**
02.01.007.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	263,33	263,33		263,33	-	46,13	12.147,41	12.147,41	-	12.147,41	-	100,00
02.01.007.002	Cobogó cimento tipo árabe, dim: 39 x 39 x 7cm	m2	8,70	-	**8,70**	8,70	-	228,35	1.986,64	-	1.986,64	1.986,64	-	100,00
02.01.007.003	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	m	33,20	33,20		33,20	-	36,13	1.199,52	1.199,52	-	1.199,52	-	100,00
02.01.008	**COBERTURA**								**8.939,47**	**8.939,47**	**-**	**8.939,47**	**-**	**100,00**
02.01.008.001	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019	m2	69,80	69,80		69,80	-	19,46	1.358,31	1.358,31	-	1.358,31	-	100,00
02.01.008.002	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02	m2	69,80	69,80		69,80	-	49,91	3.483,72	3.483,72	-	3.483,72	-	100,00
02.01.008.003	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	m	40,44	40,44		40,44	-	51,85	2.096,81	2.096,81	-	2.096,81	-	100,00

	OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA (VESTIÁRIO) NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (POVOADO TERRA DURA), NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CR 965393-OP1.097.075-09/2024/MESP	DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 05	CONTRATO: Nº 258/2025
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA		VIGÊNCIA	25/08/2026	Período: 01/05/2026 a 31/05/2026	RECURSO:
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		EXECUÇÃO	25/08/2026	Data da Medição: 16/07/2026	

Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Valores (R$)						% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Unit.	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
02.01.008.004	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14 cm, laterais=15 cm, bordas=3 cm)	m	18,64	18,64		18,64	-	107,33	2.000,63	2.000,63	-	2.000,63	-	100,00
02.01.009	**REVESTIMENTO DE TETOS**								**3.004,93**	**3.004,93**	**-**	**3.004,93**	**-**	**100,00**
02.01.009.001	Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura acrílica, argamassa industrializada com preparo manual, af 10/2022	m2	68,59	68,59		68,59	-	11,32	776,44	776,44	-	776,44	-	100,00
02.01.009.002	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	68,59	68,59		68,59	-	32,49	2.228,49	2.228,49	-	2.228,49	-	100,00
02.01.010	**REVESTIMENTO DE PAREDES**								**31.008,65**	**15.737,72**	**10.271,08**	**26.008,80**	**4.999,85**	**83,87**
02.01.010.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	512,91	512,91		512,91	-	6,03	3.092,85	3.092,85	-	3.092,85	-	100,00
02.01.010.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	262,95	236,70	**26,25**	262,95	-	28,82	7.578,22	6.821,69	756,53	7.578,22	-	100,00
02.01.010.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	207,50	186,76	**20,74**	207,50	-	31,18	6.469,85	5.823,18	646,67	6.469,85	-	100,00
02.01.010.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	215,93	-	**162,00**	162,00	53,93	54,74	11.820,01	-	8.867,88	8.867,88	2.952,13	75,02
02.01.010.005	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	27,94	-		-	27,94	73,29	2.047,72	-	-	-	2.047,72	-
02.01.011	**PISOS INTERNOS**								**8.990,66**	**2.439,06**	**2.427,57**	**4.866,63**	**4.124,03**	**54,12**
02.01.011.001	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 4cm. af 07/2021	m2	54,44	27,30	**27,14**	54,44	-	48,76	2.654,49	1.331,15	1.323,34	2.654,49	-	100,00
02.01.011.002	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	72,08	36,10	**35,98**	72,08	-	30,69	2.212,14	1.107,91	1.104,23	2.212,14	-	100,00
02.01.011.003	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha riviera, cor branco mate, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	55,52	-		-	55,52	74,28	4.124,03	-	-	-	4.124,03	-
02.01.012	**SOLEIRAS E PEITORIS**								**1.845,06**	**-**	**-**	**-**	**1.845,06**	**-**
02.01.012.001	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	6,30	-		-	6,30	91,82	578,47	-	-	-	578,47	-
02.01.012.002	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	10,60	-		-	10,60	119,49	1.266,59	-	-	-	1.266,59	-
02.01.013	**ESQUADRIAS DE MADEIRA**								**9.416,77**	**3.840,19**	**-**	**3.840,19**	**5.576,58**	**40,78**
02.01.013.001	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	3,00	1,00		1,00	2,00	1.736,39	5.209,17	1.736,39	-	1.736,39	3.472,78	33,33
02.01.013.002	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00	1,00		1,00	1,00	2.103,80	4.207,60	2.103,80	-	2.103,80	2.103,80	50,00
02.01.014	**ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO**								**9.589,04**	**-**	**-**	**-**	**9.589,04**	**-**
02.01.014.001	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	10,88	-		-	10,88	326,62	3.553,63	-	-	-	3.553,63	-
02.01.014.002	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	m2	6,72	-		-	6,72	567,53	3.813,80	-	-	-	3.813,80	-
02.01.014.003	Vidro liso incolor 6mm - Rev 01_10/2021	m2	6,72	-		-	6,72	220,45	1.481,42	-	-	-	1.481,42	-
02.01.014.004	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, tipo camarão, duas folhas móveis	m2	1,76	-		-	1,76	420,56	740,19	-	-	-	740,19	-

	OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA (VESTIÁRIO) NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (POVOADO TERRA DURA), NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CR 965393-OP1.097.075-09/2024/MESP	DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 05	CONTRATO: Nº 258/2025
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA		VIGÊNCIA	25/08/2026	Período: 01/05/2026 a 31/05/2026	RECURSO:
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		EXECUÇÃO	25/08/2026	Data da Medição: 16/07/2026	

Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
02.01.015	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								7.547,38	7.547,38	-	7.547,38	-	100,00
02.01.015.001	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	14,00	14,00		14,00	-	82,29	1.152,06	1.152,06	-	1.152,06	-	100,00
02.01.015.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 75 mm	un	2,00	2,00		2,00	-	159,77	319,54	319,54	-	319,54	-	100,00
02.01.015.003	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	un	7,00	7,00		7,00	-	90,59	634,13	634,13	-	634,13	-	100,00
02.01.015.004	Caixa sifonada quadrada, com uma entrada e uma saida, d = 100x100x50mm, ref. nº61, acabamento branco, marca Akros ou similar	un	2,00	2,00		2,00	-	47,40	94,80	94,80	-	94,80	-	100,00
02.01.015.005	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco	un	4,00	4,00		4,00	-	69,01	276,04	276,04	-	276,04	-	100,00
02.01.015.006	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm	m	12,00	12,00		12,00	-	26,48	317,76	317,76	-	317,76	-	100,00
02.01.015.007	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 75mm	m	18,70	18,70		18,70	-	28,13	526,03	526,03	-	526,03	-	100,00
02.01.015.008	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m	19,20	19,20		19,20	-	39,15	751,68	751,68	-	751,68	-	100,00
02.01.015.009	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa	un	3,00	3,00		3,00	-	304,02	912,06	912,06	-	912,06	-	100,00
02.01.015.010	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 30 pessoas (v=2710 litros)	un	1,00	1,00		1,00	-	1.059,62	1.059,62	1.059,62	-	1.059,62	-	100,00
02.01.015.011	Filtro pré-moldado, 03 anéis conc d=1,50 x 0,50m, tampa conc d=1,60x0,05m (v=3390 litros)	un	1,00	1,00		1,00	-	1.503,66	1.503,66	1.503,66	-	1.503,66	-	100,00
02.01.016	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								5.459,43	5.459,43	-	5.459,43	-	100,00
02.01.016.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	21,00	21,00		21,00	-	134,97	2.834,37	2.834,37	-	2.834,37	-	100,00
02.01.016.002	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	4,00	4,00		4,00	-	98,32	393,28	393,28	-	393,28	-	100,00
02.01.016.003	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=32mm (1 1/4") - ref.1509 Deca ou similar	un	2,00	2,00		2,00	-	172,00	344,00	344,00	-	344,00	-	100,00
02.01.016.004	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 32 mm - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	2,00	2,00		2,00	-	30,35	60,70	60,70	-	60,70	-	100,00
02.01.016.005	Tubo, pvc, soldável, de 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af 06/2022	m	44,00	44,00		44,00	-	11,59	509,96	509,96	-	509,96	-	100,00
02.01.016.006	Tubo, pvc, soldável, de 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af 06/2022	m	20,00	20,00		20,00	-	18,47	369,40	369,40	-	369,40	-	100,00
02.01.016.007	Caixa d´água em polietileno, 1000 litros - fornecimento e instalação. af 06/2021	un	2,00	2,00		2,00	-	473,86	947,72	947,72	-	947,72	-	100,00

	OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA (VESTIÁRIO) NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (POVOADO TERRA DURA), NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CR 965393-OP1.097.075-09/2024/MESP	DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 05	CONTRATO: Nº 258/2025
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA		VIGÊNCIA	25/08/2026	Período: 01/05/2026 a 31/05/2026	RECURSO:
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		EXECUÇÃO	25/08/2026	Data da Medição: 16/07/2026	

Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Valores (R$)						% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Unit.	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
02.01.017	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**								**7.306,93**	**-**	**6.228,58**	**6.228,58**	**1.078,35**	**85,24**
02.01.017.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	-	**1,00**	1,00	-	284,23	284,23	-	284,23	284,23	-	100,00
02.01.017.002	Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A	un	1,00	-		-	1,00	101,52	101,52	-	-	-	101,52	-
02.01.017.003	Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	1,00	-		-	1,00	21,58	21,58	-	-	-	21,58	-
02.01.017.004	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,00	-		-	1,00	10,01	10,01	-	-	-	10,01	-
02.01.017.005	Disjuntor termomagnetico bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	4,00	-		-	4,00	65,22	260,88	-	-	-	260,88	-
02.01.017.006	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4"	un	9,00	-	**9,00**	9,00	-	329,85	2.968,65	-	2.968,65	2.968,65	-	100,00
02.01.017.007	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	7,00	-	**7,00**	7,00	-	233,38	1.633,66	-	1.633,66	1.633,66	-	100,00
02.01.017.008	Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	pt	4,00	-	**4,00**	4,00	-	335,51	1.342,04	-	1.342,04	1.342,04	-	100,00
02.01.017.009	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un	9,00	-		-	9,00	76,04	684,36	-	-	-	684,36	-
02.01.018	**APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS**								**16.091,70**	**-**	**-**	**-**	**16.091,70**	**-**
02.01.018.001	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares	un	2,00	-		-	2,00	283,86	567,72	-	-	-	567,72	-
02.01.018.002	Cuba de embutir, oval, CELITE 10116 ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para lavatório, engate cromado	un	6,00	-		-	6,00	513,63	3.081,78	-	-	-	3.081,78	-
02.01.018.003	Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712), engate cromado (deca ref c4606180) e válvula mictório antivandalismo(docol ref.17015106) ou similares	un	2,00	-		-	2,00	1.375,15	2.750,30	-	-	-	2.750,30	-
02.01.018.004	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	5,00	-		-	5,00	450,35	2.251,75	-	-	-	2.251,75	-
02.01.018.005	Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	2,00	-		-	2,00	612,01	1.224,02	-	-	-	1.224,02	-
02.01.018.006	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	2,53	-		-	2,53	574,68	1.453,94	-	-	-	1.453,94	-
02.01.018.007	Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02	m2	1,43	-		-	1,43	604,27	864,11	-	-	-	864,11	-
02.01.018.008	Torneira plástica para lavatório, HERC 1195, 1/2" ou similar	un	6,00	-		-	6,00	33,34	200,04	-	-	-	200,04	-
02.01.018.009	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	4,00	-		-	4,00	115,55	462,20	-	-	-	462,20	-
02.01.018.010	Engate em PVC (ligação flexível), AKROS, 30 cm, acabamento branco ou similar	un	7,00	-		-	7,00	6,63	46,41	-	-	-	46,41	-

	OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA (VESTIÁRIO) NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (POVOADO TERRA DURA), NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CR 965393-OP1.097.075-09/2024/MESP	DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 05	CONTRATO: Nº 258/2025
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA		VIGÊNCIA	25/08/2026	Período: 01/05/2026 a 31/05/2026	RECURSO:
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		EXECUÇÃO	25/08/2026	Data da Medição: 16/07/2026	

Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R$)						% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir		
02.01.018.011	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	un	7,00	-		-	7,00	29,15	204,05	-	-	-	204,05		-
02.01.018.012	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=60cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	2,00	-		-	2,00	166,28	332,56	-	-	-	332,56		-
02.01.018.013	Barra de apoio em "I", em aco inox polido 80 x 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalacao. af_01/2020	un	2,00	-		-	2,00	607,28	1.214,56	-	-	-	1.214,56		-
02.01.018.014	Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4"	un	2,00	-		-	2,00	719,13	1.438,26	-	-	-	1.438,26		-
02.01.019	**PINTURA TETOS E PAREDES**								**9.811,85**	**-**	**4.142,53**	**4.142,53**	**5.669,32**		**42,21**
02.01.019.001	Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023	m2	68,59	-	**68,59**	68,59	-	4,36	299,05	-	299,05	299,05	-		100,00
02.01.019.002	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023	m2	195,79	-	**195,79**	195,79	-	3,07	601,08	-	601,08	601,08	-		100,00
02.01.019.003	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m2	90,90	-	**90,90**	90,90	-	16,36	1.487,12	-	1.487,12	1.487,12	-		100,00
02.01.019.004	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	173,48	-		-	173,48	17,42	3.022,02	-	-	-	3.022,02		-
02.01.019.005	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	90,90	-	**90,90**	90,90	-	19,31	1.755,28	-	1.755,28	1.755,28	-		100,00
02.01.019.006	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	173,48	-		-	173,48	15,26	2.647,30	-	-	-	2.647,30		-
02.01.020	**PINTURA MADEIRA**								**1.486,82**	**-**	**-**	**-**	**1.486,82**		**-**
02.01.020.001	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	23,95	-		-	23,95	62,08	1.486,82	-	-	-	1.486,82		-
02.01.021	**SERVIÇOS FINAIS**								**181,43**	**-**	**-**	**-**	**181,43**		**-**
02.01.021.001	Limpeza geral	m2	88,50	-		-	88,50	2,05	181,43	-	-	-	181,43		-
TOTAL:									**178.398,82**	**101.270,16**	**25.056,40**	**126.326,56**	**52.072,26**		**70,80%**
PERCENTUAL										**56,76%**	**14,04%**	**70,80%**	**29,20%**		

KLEBER DE SOUZA OLIVEIRA:79045880563

Assinado de forma digital por KLEBER DE SOUZA OLIVEIRA:79045880563
Dados: 2026.07.28 15:46:44 -03'00'

ASSINATURA DA EMPRESA

FISCAL DO CONTRATO	ENGº. JOÃO VITOR REIS DOS SANTOS - CREA 2723359220

gov.br

Documento assinado digitalmente
DIEGO OLIVEIRA BARROS
Data: 28/07/2026 12:51:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br

Documento assinado digitalmente
JOAO VITOR REIS DOS SANTOS
Data: 28/07/2026 13:01:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (POVOADO TERRA DURA), NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CR 965393-OP1.097.075-09/2024/MESP (VESTIÁRIO)				MEMÓRIA DE CÁLCULO BM 05 Período 01/05/2026 a 31/05/2026
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA				
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				Data de medição: **16/07/2026**
Item	**Discriminação dos Serviços**	**Und**	**MEDIDO**	
02.01.007	**PAREDES**			
02.01.007.002	Cobogó cimento tipo árabe, dim: 39 x 39 x 7cm	m2	8,70	1,50 x 2,90 x 2 = 8,70 m²
02.01.010	**REVESTIMENTO DE PAREDES**			
02.01.010.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	26,25	2,00x2,00 + 2,50x2,00 + 3,00x2,00 + 1,50x3,00 + 2,25x3,00 = 26,25 m²
02.01.010.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	20,74	2,00x2,00 + 2,00x2,50 + 1,50x3,00 + 2,00x1,60 + 2,02x2,00 = 20,74 m²
02.01.010.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	162,00	3,22x5,72x2 + 3,22x1,85x2 + 3,22x3,10x4 + 1,40x1,80x16 + 2,00x5,85x2 + 4,90x2,00 = 162,00 m²
02.01.011	**PISOS INTERNOS**			
02.01.011.001	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 4cm. af_07/2021	m2	27,14	3,10x2,20 + 5,72x1,55x2 + 1,85x1,40 = 27,14 m²
02.01.011.002	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	35,98	3,10x2,20 + 5,72x1,55x2 + 1,85x2,00x2 + 1,85x2,18 = 35,98 m²
02.01.017	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**			
02.01.017.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	1,00 unidade
02.01.017.006	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4"	un	9,00	9,00 unidades
02.01.017.007	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	7,00	7,00 pontos
02.01.017.008	Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	pt	4,00	4,00 pontos
02.01.019	**PINTURA TETOS E PAREDES**			
02.01.019.001	Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023	m2	68,59	6,82 + 17,73 + 3,70 + 3,70 + 4,03 + 4,03 + 17,73 + 10,85 = 68,59 m²
02.01.019.002	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023	m2	195,79	5,00x5,00 + 6,00x5,00 + 4,00x5,00 + 4,50x4,00 + 7,00x5,00 + 5,50x4,00 + 6,50x4,00 + 3,96x5,00 = 195,79 m²
02.01.019.003	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m2	90,90	6,82 + 17,73 + 3,70 + 3,70 + 4,03 + 4,03 + 17,73 + 10,85 + 4,55 + 6,75 + 5,85 + 5,16 = 90,90 m²
02.01.019.005	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	90,90	6,82 + 17,73 + 3,70 + 3,70 + 4,03 + 4,03 + 17,73 + 10,85 + 4,55 + 6,75 + 5,85 + 5,16 = 90,90 m²
		Atestamos que os serviços constantes na NF foram recebidos por nós em perfeita ordem.		
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA		**Data: __/__/__**		

KLEBER DE SOUZA OLIVEIRA:79045880563

Assinado de forma digital por KLEBER DE SOUZA OLIVEIRA:79045880563
Dados: 2026.07.28 15:48:05 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
DIEGO OLIVEIRA BARROS
Data: 28/07/2026 12:51:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
JOAO VITOR REIS DOS SANTOS
Data: 28/07/2026 13:01:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA (VESTIÁRIO) NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (POVOADO TERRA DURA), NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CR 965393-OP1.097.075-09/2024/MESP

CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E.M. 05

CONTRATO Nº 258/2025

ORDEM DE SERVIÇO

INICIO - 25/06/2025

Período - 01/05/2026 a 31/05/2026

Medição - 16/07/2026

COBOGÓ DE CIMENTO

REBOCO INTERNO

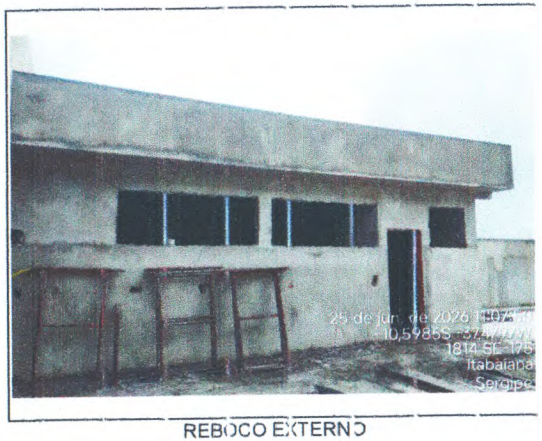

REBOCO EXTERNO

REVESTIMENTO CERÂMICO

REVESTIMENTO CERÂMICO

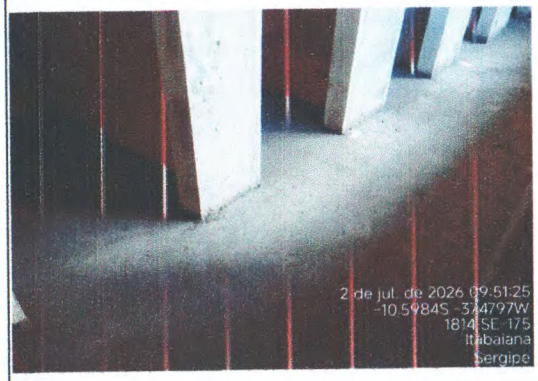

CONTRAPISO

ELABORADO POR:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA (VESTIÁRIO) NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 05

CONTRATO Nº 258/2025
ORDEM DE SERVIÇO
INICIO - 25/08/2025
Período - 01/05/2026 a 31/05/2026
Medição - 16/07/2026

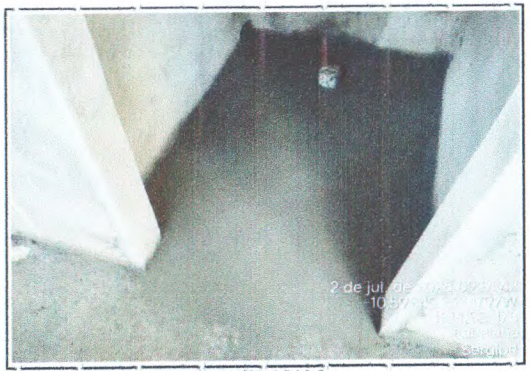

CONTRAPISO

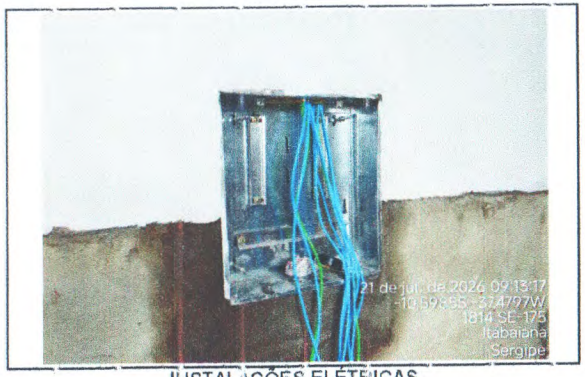

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

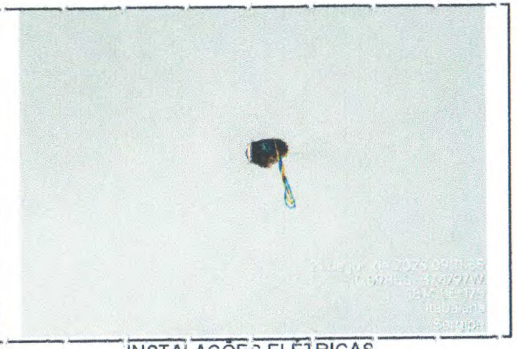

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PINTURA

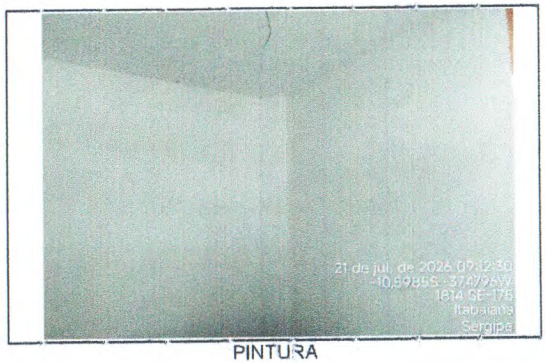

PINTURA

ELABORADO POR:

FOLHA 2 de 2

KLEBER DE SOUZA OLIVEIRA:79045880563
Assinado de forma digital por KLEBER DE SOUZA OLIVEIRA:79045880563
Dados: 2026.07.28 15:50:01 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
DIEGO OLIVEIRA BARROS
Data: 28/07/2026 12:51:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
JOAO VITOR REIS DOS SANTOS
Data: 28/07/2026 13:01:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
