CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA RURAL, NO TRECHO QUE INTERLIGA OS POVOADOS MANGUEIRA E RIBEIRA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE	DATA DE INICIO: 07/04/2026	BOLETIM DE MEDIÇÃO 05	NOVATEC
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DE TÉRMINO: 07/10/2026	PERÍODO: 01/08/2026 a 31/08/2026	CONTRATO 107/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA		DATA DE MEDIÇÃO: 31/08/2026	

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
1	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ENTRE O POVOADO MANGUEIRA / POVOADO RIBEIRA													
1.01	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ENTRE POVOADO MANGUEIRA /RIBEIRA								R$ 100.321,20	R$ 83.601,00	R$ 8.360,10	R$ 91.961,10	R$ 8.360,10	92%
1.02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
01.02.01	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	H	630,00	525,00	52,50	577,50	52,50	159,24	R$ 100.321,20	R$ 83.601,00	R$ 8.360,10	R$ 91.961,10	R$ 8.360,10	92%
01.02.02	Mestre de obras com encargos complementares	H	1134,00	921,38	70,88	992,26	141,74	97,34	R$ 110.383,56	R$ 89.687,13	R$ 6.899,46	R$ 96.586,59	R$ 13.796,97	88%
1.03	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R$ 11.408,76	R$ 3.701,84	R$ -	R$ 3.701,84	R$ 7.706,92	R$ 0,67
01.03.01	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	M2	12,00	8,00		8,00	4,00	462,73	R$ 5.552,76	R$ 3.701,84	R$ -	R$ 3.701,84	R$ 1.850,92	67%
01.03.02	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	MÊS	6,00	0,00		0,00	6,00	976,00	R$ 5.856,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.856,00	0%
1.04	ENSAIOS								R$ 21.006,81	R$ 16.276,26	R$ -	R$ 16.276,26	R$ 4.730,55	77%
1.04.01	Ensaio - Granulometria por peneiramento	un	33,00	33,00		33,00	0,00	106,75	R$ 3.522,75	R$ 3.522,75	R$ -	R$ 3.522,75	R$ -	100%
1.04.02	Ensaio - Limite de liquidez	un	33,00	33,00		33,00	0,00	106,75	R$ 3.522,75	R$ 3.522,75	R$ -	R$ 3.522,75	R$ -	100%
1.04.03	Ensaio - Limite de plasticidade	un	33,00	33,00		33,00	0,00	106,75	R$ 3.522,75	R$ 3.522,75	R$ -	R$ 3.522,75	R$ -	100%
1.04.04	Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos)	un	33,00	33,00		33,00	0,00	140,30	R$ 4.629,90	R$ 4.629,90	R$ -	R$ 4.629,90	R$ -	100%
1.04.05	I. S. C - Índice de Suporte Californiano na energia normal (1 ponto)	un	33,00	33,00		33,00	0,00	32,67	R$ 1.078,11	R$ 1.078,11	R$ -	R$ 1.078,11	R$ -	100%
1.04.06	Ensaio - Marshall	un	33,00	0,00		0,00	33,00	143,35	R$ 4.730,55	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.730,55	0%
1.05	SINALIZAÇÃO PROVISORIA								R$ 111,30	R$ 111,30	R$ -	R$ 111,30	R$ -	100%
1.05.01	Cone plástico para canalizaçao de trânsito - utilização 5 vezes	un	10,00	10,00		10,00	0,00	11,13	R$ 111,30	R$ 111,30	R$ -	R$ 111,30	R$ -	100%
1.06	SERVIÇOS PRELIMINARES								R$ 81.731,92	R$ 81.731,92	R$ -	R$ 81.731,92	R$ -	100%
1.06.01	Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) sem carga e transporte	M2	18223,4	18223,40		18223,40	0,00	0,69	R$ 12.574,14	R$ 12.574,14	R$ -	R$ 12.574,14	R$ -	100%
1.06.02	Carga mecânica de material de 1ª categoria	M3	1822,33	1822,24		1822,24	0,09	1,20	R$ 2.186,79	R$ 2.186,79	R$ -	R$ 2.186,79	R$ -	100%
1.06.03	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	TXKM	68337,75	68334,00		68334,00	3,75	0,98	R$ 66.970,99	R$ 66.970,99	R$ -	R$ 66.970,99	R$ -	100%
1.07	TERRAPLANAGEM								R$ 454.399,90	R$ 454.397,59	R$ -	R$ 454.397,44	R$ 2,32	100%
1.07.01	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	M2	18223,4	18223,40		18223,40	0,00	1,62	R$ 29.521,90	R$ 29.521,90	R$ -	R$ 29.521,90	R$ -	100%
1.07.02	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com carregadeira, dmt 1801 a 2000m	M3	8200,53	8200,53		8200,53	0,00	15,27	R$ 125.222,09	R$ 125.222,09	R$ -	R$ 125.222,01	R$ -	100%

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Arnaldo N. Bergo Jun.
Engº Civil - CREA
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

SEM EFEITO

Ailysson José de Andrade Machado
Engº Eletricista - CREA 271873634
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA RURAL, NO TRECHO QUE INTERLIGA OS POVOADOS MANGUEIRA E RIBEIRA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE			DATA DE INICIO: 07/04/2026					BOLETIM DE MEDIÇÃO 05				NOVATEC		
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA			DATA DE TÉRMINO: 07/10/2026					PERÍODO: 01/08/2026 a 31/08/2026				CONTRATO 107/2026		
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 31/08/2026						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
1.07.03	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	TXKM	30751,98	30751,98		30751,98	0,00	0,73	R$ 22.448,94	R$ 22.448,94	R$ -	R$ 22.448,94	R$ -	100%
1.07.04	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	M2	18223,4	18223,40		18223,40	0,00	1,43	R$ 26.059,46	R$ 26.059,46	R$ -	R$ 26.059,46	R$ -	100%
1.07.05	Reforço do sub-leito	M3	3644,68	3644,68		3644,68	0,00	40,89	R$ 149.030,96	R$ 149.030,96	R$ -	R$ 149.030,95	R$ -	100%
1.07.06	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	TKM	82005,3	82005,30		82005,30	0,00	0,73	R$ 59.863,86	R$ 59.863,86	R$ -	R$ 59.863,80	R$ -	100%
1.07.07	Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominantemente argiloso, em camadas com espessura de 20 cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2024	M3	3311,34	3311,34		3311,34	0,00	12,76	R$ 42.252,69	R$ 42.250,37	R$ -	R$ 42.250,37	R$ 2,32	100%
1.08	**PAVIMENTAÇÃO**								**R$ 3.041.886,84**	**R$ 1.886.147,76**	**R$ 57.954,02**	**R$ 1.944.101,78**	**R$ 1.097.802,56**	**64%**
1.08.01	Locação de serviços de pavimentação	m2	16556,72	16556,72		16556,72	0,00	1,75	R$ 28.974,26	R$ 28.974,26	R$ -	R$ 28.974,26	R$ -	100%
1.08.02	Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 20 cm - exclusive car ga e transporte. af_09/2024	m3	3311,34	3311,34		3311,34	0,00	209,46	R$ 693.593,27	R$ 693.593,27	R$ -	R$ 693.593,27	R$ -	100%
1.08.03	Carga mecânica de material de 2ª categoria	m3	4304,74	4304,74		4304,74	0,00	3,55	R$ 15.281,82	R$ 15.281,82	R$ -	R$ 15.281,82	R$ -	100%
1.08.04	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	96856,69	96856,69		96856,69	0,00	0,98	R$ 94.919,55	R$ 94.919,55	R$ -	R$ 94.919,55	R$ -	100%
1.08.05	Imprimação - execução com fornecimento de material	m2	16566,72	16566,72		16566,72	0,00	12,11	R$ 200.622,97	R$ 200.622,97	R$ -	R$ 200.622,97	R$ -	100%
1.08.06	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	596,40	596,40		596,40	0,00	2,25	R$ 1.341,90	R$ 1.341,90	R$ -	R$ 1.341,90	R$ -	100%
1.08.07	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicion al para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	5447,13	5447,13		5447,13	0,00	0,90	R$ 4.902,41	R$ 4.902,41	R$ -	R$ 4.902,41	R$ -	100%
1.08.08	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive forn ecimento de ligante, exclusive transporte	m2	16556,72	16556,72		16556,72	0,00	1,75	R$ 28.974,26	R$ 28.991,76	R$ -	R$ 28.991,76	R$ -	100%
1.08.09	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	596,40	596,40		596,40	0,00	2,25	R$ 1.341,90	R$ 1.341,90	R$ -	R$ 1.341,90	R$ -	100%
1.08.10	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicion al para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	5447,13	5447,13		5447,13	0,00	0,90	R$ 4.902,41	R$ 4.902,41	R$ -	R$ 4.902,41	R$ -	100%
1.08.11	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltic o, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	828,33	414,17		414,17	414,16	1451,43	R$ 1.202.263,01	R$ 601.135,86	R$ -	R$ 601.135,86	R$ 601.127,15	50%
1.08.12	Carga mecânica de material de 2ª categoria	m3	1987,99	994,00		994,00	993,99	3,55	R$ 7.057,36	R$ 3.528,71	R$ -	R$ 3.528,71	R$ 3.528,65	50%
1.08.13	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	143135,42	71568,23		71568,23	71567,19	0,98	R$ 140.272,71	R$ 70.136,87	R$ -	R$ 70.136,87	R$ 70.135,84	50%
1.08.14	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	95423,61	47712,15		47712,15	47711,46	0,98	R$ 93.515,13	R$ 46.757,91	R$ -	R$ 46.757,91	R$ 46.757,22	50%

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Arnaldo N. Pereira Junior
Eng. Civil
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

SEM EFEITO

Ulysson José de Andrade Machado
Engº Eletricista - CREA 2718736348
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA RURAL, NO TRECHO QUE INTERLIGA OS POVOADOS MANGUEIRA E RIBEIRA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE					DATA DE INICIO: 07/04/2026			BOLETIM DE MEDIÇÃO 05				NOVATEC		
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA					DATA DE TÉRMINO: 07/10/2026			PERÍODO: 01/08/2026 a 31/08/2026				CONTRATO 107/2026		
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 31/08/2026						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTICADES					VALORES (R$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
1.08.15	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ oria, profundidade até 1,50m	m3	248,50	67,49	44,99	112,48	136,02	67,85	R$ 16.860,72	R$ 4.579,20	**R$ 3.052,57**	R$ 7.631,77	R$ 9.228,95	45%
1.08.16	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	310,62	84,36	56,24	140,60	170,02	1,20	R$ 372,74	R$ 101,24	**R$ 67,49**	R$ 168,72	R$ 204,02	45%
1.08.17	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1164,82	316,35	210,88	527,23	637,59	0,73	R$ 850,31	R$ 230,94	**R$ 153,94**	R$ 384,88	R$ 465,43	45%
1.08.18	Colchão de areia	m3	24,85	6,75	4,50	11,25	13,60	159,25	R$ 3.957,36	R$ 1.074,94	**R$ 716,63**	R$ 1.791,56	R$ 2.165,80	45%
1.08.19	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	TKM	559,12	151,86	101,23	253,09	306,04	0,73	R$ 408,15	R$ 110,85	**R$ 73,90**	R$ 184,75	R$ 223,40	45%
1.08.20	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confecci onada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	5522,24	1500,00	1.000,00	2500,00	3022,24	37,11	R$ 204.930,32	R$ 55.665,00	**R$ 37.110,00**	R$ 92.775,00	R$ 112.155,32	45%
1.08.21	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalha mento e transporte de material c/distancia até 10km	m	5522,24	1500,00	1.000,00	2500,00	3022,24	11,21	R$ 61.904,31	R$ 16.815,00	**R$ 11.210,00**	R$ 28.025,00	R$ 33.879,31	45%
1.08.22	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 15 cm altura. af_01/2024	m	5522,24	300,00	150,00	450,00	5072,24	37,13	R$ 205.040,77	R$ 11.139,00	**R$ 5.569,50**	R$ 16.708,50	R$ 188.332,27	8%
1.08.23	Pintura de meio fio (caiação)	m	5522,24	0,00		0,00	5522,24	5,36	R$ 29.599,20	R$ -	**R$ -**	R$ -	R$ 29.599,20	0%
1.08.24	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensa do resinado 12mm (05 usos)	m3		0,00		0,00	0,00	2993,12	R$ -	R$ -	**R$ -**	R$ -	R$ -	0%
1.09	**SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL**								**R$ 21.826,71**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 21.826,71**	**0%**
1.09.01	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefle tiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m2	552,22	0,00		0,00	552,22	34,53	R$ 19.068,15	R$ -	**R$ -**	R$ -	R$ 19.068,15	0%
1.09.02	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x 60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de conc reto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	8	0,00		0,00	8,00	344,82	R$ 2.758,56	R$ -	**R$ -**	R$ -	R$ 2.758,56	0%
1.10	**SERVIÇOS FINAIS**								**R$ 38.933,99**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 38.933,99**	**0%**
1.10.01	Limpeza geral	m2	16566,72	0,00		0,00	16566,72	1,75	R$ 28.991,76	R$ -	**R$ -**	R$ -	R$ 28.991,76	0%
1.10.02	MARCO INAUGURAL H=1,80M,BASE 1,20X0,75CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA -EXECUÇÃO NA OBRA ,INCLUSIVE PLACAS	UN	1	0,00		0,00	1,00	9942,23	R$ 9.942,23	R$ -	**R$ -**	R$ -	R$ 9.942,23	0%
TOTAL DO ORÇAMENTO									**R$ 3.882.010,99**	**R$ 2.615.654,95**	**R$ 73.213,58**	**R$ 2.688.868,53**	**R$ 1.193.142,46**	**69,26%**
										67,37%	**1,88%**	**69,25%**	**30,75%**	

ASSINATURA RESPONSÁVEL TÉCNICO

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.09.09 10:30:50 -03'00'

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

VALOR DA MEDIÇÃO: R$ 73.213,58 (Setenta e três mil, duzentos e treze reais e cinquenta e oito centavos).

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

SEM EFEITO

Jose [illegible]
Eng
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

K. rlysson José de Andrade [illegible]
Engº Eletricista - CREA 271873634[illegible]
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA RURAL, NO TRECHO QUE INTERLIGA OS POVOADOS MANGUEIRA E RIBEIRA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 107/2026
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 01/08/2026 a 31/08/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
1.02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
01.02.01	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	HORAS	TOTAL
			H
		52,50	52,50
EXECUTADO NO PERÍODO:			52,50
ACUMULADO ANTERIOR:			525,00
ACUMULADO ATUAL:			577,50
SALDO A MEDIR:			52,50
CONTRATO:			630,00
A MEDIR NO PERÍODO:			52,50

MEMORIA DE CÁLCULO

Jhon Lennon Gomes Santo
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

SEM EFEITO

R. Flysson José de Andrade Machado
Engº Eletricista - CREA 2718736348
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA RURAL, NO TRECHO QUE INTERLIGA OS POVOADOS MANGUEIRA E RIBEIRA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 107/2026
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 01/08/2026 a 31/08/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
1.02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
01.02.02	Mestre de obras com encargos complementares	HORAS	TOTAL
			H
		70,88	70,88
EXECUTADO NO PERÍODO:			70,88
ACUMULADO ANTERIOR:			921,38
ACUMULADO ATUAL:			992,26
SALDO A MEDIR:			141,74
CONTRATO:			1.134,00
A MEDIR NO PERÍODO:			70,88
		MEMORIA DE CÁLCULO	

...non Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

SEM EFEITO

Karlysson José de Andrade Machado
Engº Eletricista - CREA 2718736348
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA RURAL, NO TRECHO QUE INTERLIGA OS POVOADOS MANGUEIRA E RIBEIRA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 107/2026
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 01/08/2026 a 31/08/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND			
1.08	PAVIMENTAÇÃO				
1.08.15	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ oria, profundidade até 1,50m	EXTENSÃO	LARGURA	PROFUNDIDADE	VOLUME TOTAL
		m	m	m	m³
		1.000,00	0,15	0,30	44,99
EXECUTADO NO PERÍODO:					44,99
ACUMULADO ANTERIOR:					67,49
ACUMULADO ATUAL:					112,48
SALDO A MEDIR:					136,02
CONTRATO:					248,50
A MEDIR NO PERÍODO:					44,99

MEMORIA DE CÁLCULO

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Arnaldo de N. Pereira Júnior
Eng. Civil CREA - [illegible]
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

SEM EFEITO

Acrlysson José de Andrade Machado
Engº Eletricista - CREA 2718736348
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA RURAL, NO TRECHO QUE INTERLIGA OS POVOADOS MANGUEIRA E RIBEIRA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 107/2026
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO: 01/08/2026 a 31/08/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
1.08	PAVIMENTAÇÃO			
1.08.16	Carga mecânica de material de 1ª categoria	VOLUME	EMPOLAMENTO	VOLUME TOTAL
		m³		m³
		44,99	1,25	56,24
EXECUTADO NO PERÍODO:				56,24
ACUMULADO ANTERIOR:				84,36
ACUMULADO ATUAL:				140,60
SALDO A MEDIR:				170,02
CONTRATO:				310,62
A MEDIR NO PERÍODO:				56,24

MEMORIA DE CÁLCULO

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Arnaldo [illegible]
Eng. Civil CREA - 2721[illegible]
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

SEM EFEITO

Karlysson José de Andrade Machado
Engº Eletricista - CREA 2718736348
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA RURAL, NO TRECHO QUE INTERLIGA OS POVOADOS MANGUEIRA E RIBEIRA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 107/2026
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO: 01/08/2026 a 31/08/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND			
1.08	PAVIMENTAÇÃO				
1.08.17	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	VOLUME	DENSIDADE	DMT	VOLUME TOTAL
		m³	t/m³	km	t
		56,24	1,50	2,50	210,88
EXECUTADO NO PERÍODO:					210,88
ACUMULADO ANTERIOR:					316,35
ACUMULADO ATUAL:					527,23
SALDO A MEDIR:					637,59
CONTRATO:					1.164,82
A MEDIR NO PERÍODO:					210,88

MEMORIA DE CÁLCULO

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 272189469-2
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

SEM EFEITO

Karlysson José de Andrade Machado
Engº Eletricista - CREA 2718736345
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA RURAL, NO TRECHO QUE INTERLIGA OS POVOADOS MANGUEIRA E RIBEIRA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 107/2026
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO: 01/08/2026 a 31/08/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND			
1.07	TERRAPLANAGEM				
1.08.18	Colchão de areia	EXTENSÃO	LARGURA	PROFUNDIDADE	OLUME TOTA
		m	m	m	t
		1.000,00	0,30	0,0150	4,50
EXECUTADO NO PERÍODO:					4,50
ACUMULADO ANTERIOR:					6,75
ACUMULADO ATUAL:					11,25
SALDO A MEDIR:					13,60
CONTRATO:					24,85
A MEDIR NO PERÍODO:					4,60

MEMORIA DE CÁLCULO

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721921699
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

SEM EFEITO

Arivsson José de Andrade Machado
Engº Eletricista - CREA 2718736343
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA RURAL, NO TRECHO QUE INTERLIGA OS POVOADOS MANGUEIRA E RIBEIRA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 107/2026
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO: 01/08/2026 a 31/08/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND			
1.08	PAVIMENTAÇÃO				
1.08.19	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	VOLUME	DENSIDADE	DMT	VOLUME TOTAL
		m³	t/m³	km	t
		4,50	1,50	15,00	101,23
EXECUTADO NO PERÍODO:					101,23
ACUMULADO ANTERIOR:					151,86
ACUMULADO ATUAL:					253,09
SALDO A MEDIR:					306,04
CONTRATO:					559,12
A MEDIR NO PERÍODO:					101,23

MEMORIA DE CÁLCULO

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Arnaldo do N Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

SEMEFEITO

Karlysson José de Andrade Machado
Engº Eletricista - CREA 2718736348
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA RURAL, NO TRECHO QUE INTERLIGA OS POVOADOS MANGUEIRA E RIBEIRA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 107/2026
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 01/08/2026 a 31/08/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
1.08	PAVIMENTAÇAO		
1.08.20	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confecci onada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	EXTENSÃO	EXTENSÃO
		m	m
		1.000,00	1.000,00
EXECUTADO NO PERÍODO:			1.000,00
ACUMULADO ANTERIOR:			1.500,00
ACUMULADO ATUAL:			2.500,00
SALDO A MEDIR:			3.022,24
CONTRATO:			5.522,24
A MEDIR NO PERÍODO:			1.000,00
		MEMORIA DE CÁLCULO	

Jhon Lennon Gomes [illegible]
Eng. Civil CREA - 272189469
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose [illegible]
Eng. [illegible]
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

SEM EFEITO

Kerlysson José de Andrade Machado
Engº Eletricista - CREA 2718736348
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA RURAL, NO TRECHO QUE INTERLIGA OS POVOADOS MANGUEIRA E RIBEIRA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 107/2026
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 01/08/2026 a 31/08/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
1.08	PAVIMENTAÇAO		
1.08.21	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalha mento e transporte de material c/distancia até 10km	EXTENSÃO	EXTENSÃO
		m	m
		1.000,00	1.000,00
EXECUTADO NO PERÍODO:			1.000,00
ACUMULADO ANTERIOR:			1.500,00
ACUMULADO ATUAL:			2.500,00
SALDO A MEDIR:			3.022,24
CONTRATO:			5.522,24
A MEDIR NO PERÍODO:			1.000,00
		MEMORIA DE CÁLCULO	

Jhon Lennon Gomes Sou...
Eng. Civil CREA - 272189469...
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaia...

José Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA [illegible]
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

SEM EFEITO

Karlysson José de Andrade Machado
Engº Eletricista - CREA 2718736343
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA RURAL, NO TRECHO QUE INTERLIGA OS POVOADOS MANGUEIRA E RIBEIRA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 107/2026
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 01/08/2026 a 31/08/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
1.08	PAVIMENTAÇÃO		
1.08.22	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 15 cm altura. af_01/2024	EXTENSÃO	EXTENSÃO
		m	m
		150,00	150,00
EXECUTADO NO PERÍODO:			150,00
ACUMULADO ANTERIOR:			300,00
ACUMULADO ATUAL:			450,00
SALDO A MEDIR:			5.072,24
CONTRATO:			5.522,24
A MEDIR NO PERÍODO:			150,00
		MEMORIA DE CÁLCULO	

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721[illegible]
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

SEM EFEITO

Kariysson José de Andrade Machado
Engº Eletricista - CREA 2718736348
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.09.03 09:50:06 -03'00'

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA RURAL, NO TRECHO QUE INTERLIGA OS POVOADOS MANGUEIRA E RIBEIRA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

LOCAL DA OBRA: MANGUEIRA - RIBEIRA

CONTRATO: 107/2026

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

MEDIÇÃO 05

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

Data da medição:31/08/2026

ITEM	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

FOTO 01 - Escavação manual de vala para o assentamento do meio-fio



FOTO 02 - Colchão de areia



FOTO 03 - Escavação manual de vala para o assentamento do meio-fio



FOTO 04 - Assentamento do meio-fio

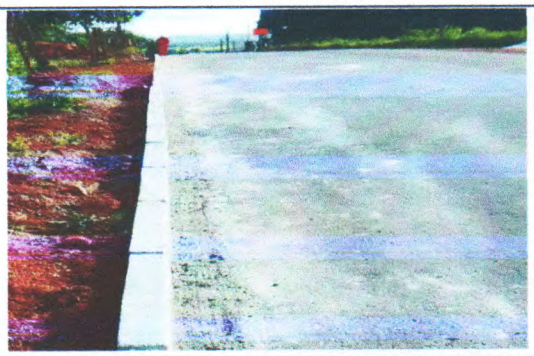

FOTO 05 - Assentamento do meio-fio



FOTO 06 - Sarjeta



FOTO 07 - Sarjeta

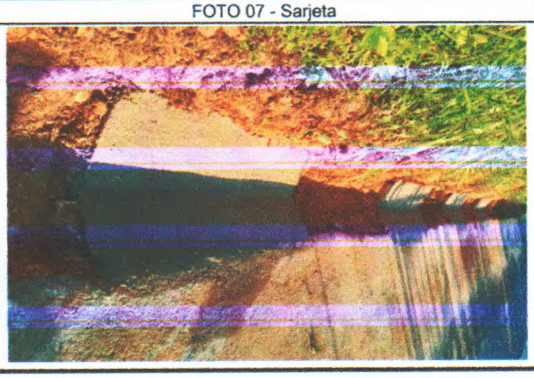

FOTO 08 - Sarjeta



K. Ryssor José de Andrade Machado
Engº Eletricista - CREA 2718736348
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

SEMFETIO

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.09.03 09:49:20 -03'00'

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana
