Campo do Brito (SE), 01 de Julho de 2026.

A João
Fiscal de Obras da Prefeitura Municipal de Itabaiana
Prezado Senhor,

A **CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA,** empresa de direito privado, sediada à Avenida José Carlos Ribeiro de Oliveira, no 471, Centro, Campo do Brito/SE, inscrita no CNPJ sob o n° 16.458.507/0001-23, vem pelo presente, encaminhar **Boletim de n° 06**, período de 01/04/2026 à 30/04/2026 no valor de **R$ 52.008,13** (Cinquenta e dois mil, oito reais e treze centavos) referente **Contrato n° 258/2025, objetivando Construção de Quadra Poliesportiva, Povoado Terra Dura, no município de Itabaiana/SE. CR 965393 – OP 1.097.075-09/2024/MESP**. Conforme documentos em anexo.

Atenciosamente,

CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA:16458507000123

Assinado de forma digital por CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA:16458507000123
Dados: 2026.07.01 09:55:37 -03'00'

	OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (POVOADO TERRA DURA), NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CR 965393-OP1.097.075-09/2024/MESP	DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 06	CONTRATO: Nº 258/2025
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA		VIGÊNCIA	25/08/2026	Período: 01/04/2026 a 30/04/2026	RECURSO:
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		EXECUÇÃO	25/08/2026	Data da Medição: 10/06/2026	

Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
1	**Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Itabaiana/SE (Povoado Terra Dura)**								**877.486,76**	**594.484,28**	**52.008,13**	**646.492,41**	**230.994,35**	**74%**
01.01	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**								**31.250,40**	**20.937,76**	**1.875,02**	**22.812,78**	**8.437,62**	**72,99**
01.01.001	**EQUIPE DIRIGENTE**								**31.250,40**	**20.937,76**	**1.875,02**	**22.812,78**	**8.437,62**	**72,99**
01.01.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	120,00	80,40	**7,20**	87,60	32,40	145,00	17.400,00	11.658,00	1.044,00	12.702,00	4.698,00	73,00
01.01.001.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	240,00	160,80	**14,40**	175,20	64,80	57,71	13.850,40	9.279,76	831,02	10.110,78	3.739,62	72,99
01.02	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								**29.673,42**	**26.878,64**	**722,57**	**27.601,21**	**2.072,21**	**93,01**
01.02.001	**PLACA DE OBRA**								**1.553,09**	**1.553,09**	**-**	**1.553,09**	**-**	**100,00**
01.02.001.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022	m2	4,50	4,50		4,50	-	345,13	1.553,09	1.553,09	-	1.553,09	-	-
01.02.002	**CANTEIRO DE OBRAS**			-					**23.091,14**	**20.296,36**	**722,57**	**21.018,93**	**2.072,21**	**91,02**
01.02.002.001	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03 10/2022	UN	1,00	-		-	1,00	627,07	627,07	-	-	-	627,07	-
01.02.002.002	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1,00		1,00	-	1.824,78	1.824,78	1.824,78	-	1.824,78	-	100,00
01.02.002.003	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02 02/2022	mês	8,00	5,00	**1,00**	6,00	2,00	722,57	5.780,56	3.612,85	722,57	4.335,42	1.445,14	75,00
01.02.002.004	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	2.788,76	2.788,76		2.788,76	-	1,70	4.740,89	4.740,89	-	4.740,89	-	100,00
01.02.002.005	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	66,67	66,67		66,67	-	151,76	10.117,84	10.117,84	-	10.117,84	-	100,00
01.02.003	**LOCAÇÃO**								**5.029,19**	**5.029,19**	**-**	**5.029,19**	**-**	**100,00**
01.02.003.001	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	752,64	752,64		752,64	-	5,63	4.237,36	4.237,36	-	4.237,36	-	100,00
01.02.003.002	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	1.115,25	1.115,25		1.115,25	-	0,71	791,83	791,83	-	791,83	-	100,00
01.03	**GALPÃO PRÉ MOLDADO**								**325.081,76**	**325.081,76**	**-**	**325.081,76**	**-**	**100,00**
01.03.001	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**								**227,28**	**227,28**	**-**	**227,28**	**-**	**100,00**
01.03.001.001	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	12,00	12,00		12,00	-	12,49	149,88	149,88	-	149,88	-	100,00
01.03.001.002	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	18,00	18,00		18,00	-	1,21	21,78	21,78	-	21,78	-	100,00
01.03.001.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	54,00	54,00		54,00	-	1,03	55,62	55,62	-	55,62	-	100,00
01.03.002	**ESTRUTURAS**								**225.528,58**	**225.528,58**	**-**	**225.528,58**	**-**	**100,00**
01.03.002.001	Estrutura para galpão pré-moldado de concreto armado, Padrão Quadra de Esporte SEDUC sem lanternim, c/montagem, vãos de 15 a 25m, atirantados, vãos entre pilares de 5,00/6,00m, altura 6,50/7,50m(lateral/meio), excluso telhas, inclusive fundação - Rv1	m2	752,64	752,64		752,64	-	299,65	225.528,58	225.528,58	-	225.528,58	-	100,00
01.03.003	**COBERTURA**								**99.325,90**	**99.325,90**	**-**	**99.325,90**	**-**	**100,00**
01.03.003.001	Telhamento com telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, não pintada, TP40 - 0,50mm, Kingspan- Isoeste ou similar - Rev 02 10/2022	m2	752,64	752,64		752,64	-	131,97	99.325,90	99.325,90	-	99.325,90	-	100,00
01.04	**QUADRA POLIESPORTIVA**								**76.563,07**	**54.124,76**	**20.105,05**	**74.229,81**	**2.333,26**	**96,95**
01.04.001	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**								**9.062,19**	**7.025,09**	**2.037,10**	**9.062,19**	**-**	**100,00**
01.04.001.001	Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte	m3	125,98	-	**125,98**	125,98	-	16,17	2.037,10	-	2.037,10	2.037,10	-	100,00
01.04.001.002	Execução de aterro compactado,sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	125,98	125,98		125,98	-	18,22	2.295,36	2.295,36	-	2.295,36	-	100,00

	OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (POVOADO TERRA DURA), NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CR 965393-OP1.097.075-09/2024/MESP	DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 06	CONTRATO: Nº 258/2025
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA		VIGÊNCIA	25/08/2026	Período: 01/04/2026 a 30/04/2026	RECURSO:
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		EXECUÇÃO	25/08/2026	Data da Medição: 10/06/2026	

Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
01.04.001.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	4.591,97	4.591,97		4.591,97	-	1,03	4.729,73	4.729,73	-	4.729,73	-	100,00
01.04.002	**PISO QUADRA**								**65.167,62**	**47.099,67**	**18.067,95**	**65.167,62**	**-**	**100,00**
01.04.002.001	Lona plástica preta	m2	503,93	503,93		503,93	-	5,44	2.741,38	2.741,38	-	2.741,38	-	100,00
01.04.002.002	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15cm, ferro 3.4mm (0.97 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	503,93	503,93		503,93	-	16,55	8.340,04	8.340,04	-	8.340,04	-	100,00
01.04.002.003	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	503,93	503,93		503,93	-	33,32	16.790,95	16.790,95	-	16.790,95	-	100,00
01.04.002.004	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	503,93	453,55	**50,38**	503,93	-	36,45	18.368,25	16.531,89	1.836,36	18.368,25	-	100,00
01.04.002.005	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	m2	503,93	-	**503,93**	503,93	-	32,21	16.231,59	-	16.231,59	16.231,59	-	100,00
01.04.002.006	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	55,37	55,37		55,37	-	48,68	2.695,41	2.695,41	-	2.695,41	-	100,00
01.04.003	**PINTURA DE DEMARCAÇÃO**								**2.333,26**		**-**	**-**	**2.333,26**	**-**
01.04.003.001	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, e = 5 cm, aplicação manual. af_05/2021	m	282,82	-		-	282,82	8,25	2.333,26	-	-	-	2.333,26	-
01.05	**ALAMBRADO E MURETA**								**120.517,62**	**73.210,09**	**-**	**73.210,09**	**47.307,53**	**60,74**
01.05.001	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**								**819,93**	**819,93**	**-**	**819,93**	**-**	**100,00**
01.05.001.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	11,52	11,52		11,52	-	55,70	641,66	641,66	-	641,66	-	100,00
01.05.001.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	13,82	13,82		13,82	-	9,81	135,57	135,57	-	135,57	-	100,00
01.05.001.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	41,46	41,46		41,46	-	1,03	42,70	42,70	-	42,70	-	100,00
01.05.002	**INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)**								**5.308,76**	**5.308,76**	**-**	**5.308,76**	**-**	**100,00**
01.05.002.001	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	11,52	11,52		11,52	-	460,83	5.308,76	5.308,76	-	5.308,76	-	100,00
01.05.003	**ALVENARIA**								**2.607,27**	**2.607,27**	**-**	**2.607,27**	**-**	**100,00**
01.05.003.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	56,52	56,52		56,52	-	46,13	2.607,27	2.607,27	-	2.607,27	-	100,00
01.05.004	**REVESTIMENTO DE PAREDES**								**4.916,39**	**4.916,39**	**-**	**4.916,39**	**-**	**100,00**
01.05.004.001	Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto internas, com equipamento de projeção. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_10/2022	m2	127,17	127,17		127,17	-	4,38	557,00	557,00	-	557,00	-	100,00
01.05.004.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	127,17	127,17		127,17	-	34,28	4.359,39	4.359,39	-	4.359,39	-	100,00
01.05.005	**ALAMBRADO**								**98.590,27**	**59.557,74**	**-**	**59.557,74**	**39.032,53**	**60,40**
01.05.005.001	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	1,97	1,97		1,97	-	491,46	968,18	968,18	-	968,18	-	100,00
01.05.005.002	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m2	337,92	202,80		202,80	135,12	280,54	94.800,08	56.893,51	-	56.893,51	37.906,57	60,01
01.05.005.003	Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2" e tela ondulada malha 3/8"	m2	3,96	2,38		2,38	1,58	712,63	2.822,01	1.696,05	-	1.696,05	1.125,96	60,10
01.05.006	**PINTURA**								**5.717,56**	**-**	**-**	**-**	**5.717,56**	**-**
01.05.006.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	127,17	-		-	127,17	44,96	5.717,56	-	-	-	5.717,56	-

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (POVOADO TERRA DURA), NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CR 965393-OP1.097.075-09/2024/MESP	DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 06	CONTRATO: Nº 258/2025
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	VIGÊNCIA	25/08/2026	Período: 01/04/2026 a 30/04/2026	RECURSO:
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	EXECUÇÃO	25/08/2026	Data da Medição: 10/06/2026	

Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
01.05.007	DIVERSOS								2.557,44	-	-	-	2.557,44	-
01.05.007.001	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²	144,00	-		-	144,00	17,76	2.557,44	-	-	-	2.557,44	-
01.06	ARQUIBANCADA								20.543,89	13.607,32	-	13.607,32	6.936,57	66,23
01.06.001	MOVIMENTO DE TERRA								3.297,13	3.297,13	-	3.297,13	-	100,00
01.06.001.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	6,12	6,12		6,12	-	55,70	340,88	340,88	-	340,88	-	100,00
01.06.001.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	7,34	7,34		7,34	-	9,81	72,01	72,01	-	72,01	-	100,00
01.06.001.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	22,02	22,02		22,02	-	1,03	22,68	22,68	-	22,68	-	100,00
01.06.001.004	Aterro de áreas,com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	m3	17,23	17,23		17,23	-	156,03	2.688,40	2.688,40	-	2.688,40	-	100,00
01.06.001.005	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m3	17,23	17,23		17,23	-	10,05	173,16	173,16	-	173,16	-	100,00
01.06.002	ESTRUTURA								4.096,13	4.096,13	-	4.096,13	-	100,00
01.06.002.001	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	6,12	6,12		6,12	-	460,83	2.820,28	2.820,28	-	2.820,28	-	100,00
01.06.002.002	Concreto armado fck=21MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em tábua (05 usos)	m3	0,56	0,56		0,56	-	2.278,31	1.275,85	1.275,85	-	1.275,85	-	100,00
01.06.003	ALVENARIA								3.049,39	2.443,85	-	2.443,85	605,54	80,14
01.06.003.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 14x19x24cm, e=14cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev 01 07/2024	m2	64,51	51,70		51,70	12,81	47,27	3.049,39	2.443,85	-	2.443,85	605,54	80,14
01.06.004	REVESTIMENTO DE PAREDES								2.739,45	2.192,01	-	2.192,01	547,44	80,01
01.06.004.001	Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto internas, com equipamento de projeção. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_10/2022	m2	70,86	56,70		56,70	14,16	4,38	310,37	248,34	-	248,34	62,03	80,01
01.06.004.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	70,86	56,70		56,70	14,16	34,28	2.429,08	1.943,67	-	1.943,67	485,41	80,01
01.06.005	PAVIMENTAÇÃO								1.578,20	1.578,20	-	1.578,20	-	100,00
01.06.005.001	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	35,04	35,04		35,04	-	45,04	1.578,20	1.578,20	-	1.578,20	-	100,00
01.06.006	PINTURA								2.990,29	-	-	-	2.990,29	-
01.06.006.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	70,86	-		-	70,86	42,20	2.990,29	-	-	-	2.990,29	-
01.06.007	DIVERSOS								2.793,30	-	-	-	2.793,30	-
01.06.007.001	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	15,00	-		-	15,00	186,22	2.793,30	-	-	-	2.793,30	-
01.07	ÁREA EXTERNA								69.791,64	19.440,86	10.361,13	29.801,99	39.989,65	42,70
01.07.001	MEIO-FIO								13.341,97	5.853,16	4.069,00	9.922,16	3.419,81	74,36
01.07.001.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af 01/2024	m	330,82	166,00	115,40	281,40	49,42	35,26	11.664,71	5.853,16	4.069,00	9.922,16	1.742,55	85,06
01.07.001.002	Pintura de meio fio (caiação)	m	330,82	-		-	330,82	5,07	1.677,26	-	-	-	1.677,26	-

	OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (POVOADO TERRA DURA), NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CR 965393-OP1.097.075-09/2024/MESP	DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 06	CONTRATO: Nº 258/2025
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA		VIGÊNCIA	25/08/2026	Período: 01/04/2026 a 30/04/2026	RECURSO:
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		EXECUÇÃO	25/08/2026	Data da Medição: 10/06/2026	

Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
01.07.002	**PAVIMENTAÇÃO**								**37.029,63**	**13.587,70**	**6.292,13**	**19.879,83**	**17.149,80**	**53,68**
01.07.002.001	Lona plástica preta	m2	479,83	239,92		239,92	239,91	5,44	2.610,28	1.305,16	-	1.305,16	1.305,12	50,00
01.07.002.002	Colchão de areia	m3	23,99	12,00	**7,20**	19,20	4,79	116,08	2.784,76	1.392,96	835,77	2.228,73	556,03	80,03
01.07.002.003	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m3	23,99	12,00	**7,20**	19,20	4,79	10,05	241,10	120,60	72,36	192,96	48,14	80,03
01.07.002.004	Lastro de brita 1	m3	5,88	-		-	5,88	176,42	1.037,35	-	-	-	1.037,35	-
01.07.002.005	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	m2	117,51	-		-	117,51	75,05	8.819,13	-	-	-	8.819,13	-
01.07.002.006	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	442,42	221,22	**110,60**	331,82	110,60	48,68	21.537,01	10.768,98	5.384,00	16.152,98	5.384,03	75,00
01.07.003	**ACESSIBILIDADE**								**7.568,62**	-	-	-	**7.568,62**	-
01.07.003.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4	m³	1,50	-		-	1,50	969,93	1.454,89	-	-	-	1.454,89	-
01.07.003.002	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	37,41	-		-	37,41	140,96	5.273,31	-	-	-	5.273,31	-
01.07.003.003	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00	-		-	2,00	352,66	705,32	-	-	-	705,32	-
01.07.003.004	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	6,24	-		-	6,24	21,65	135,10	-	-	-	135,10	-
01.07.004	**PAISAGISMO**								**11.851,42**	-	-	-	**11.851,42**	-
01.07.004.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	360,10	-		-	360,10	20,83	7.500,88	-	-	-	7.500,88	-
01.07.004.002	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio	un	2,00	-		-	2,00	98,87	197,74	-	-	-	197,74	-
01.07.004.003	Planta - Ipê roxo (Tabebuia impetiginosa), porte da muda = 1,50m, fornecimento e plantio	un	4,00	-		-	4,00	86,62	346,48	-	-	-	346,48	-
01.07.004.004	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média	un	6,00	-		-	6,00	107,77	646,62	-	-	-	646,62	-
01.07.004.005	Planta - Pau Ferro (Libidibia ferrea), porte da muda = 1,50m, fornecimento e plantio	un	6,00	-		-	6,00	86,62	519,72	-	-	-	519,72	-
01.07.004.006	Planta - Canafístula (Cassia grands) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	2,00	-		-	2,00	98,87	197,74	-	-	-	197,74	-
01.07.004.007	Planta - Flor ave do paraíso (strelitzia reginae) - muda, fornecimento e plantio	un	15,00	-		-	15,00	59,01	885,15	-	-	-	885,15	-
01.07.004.008	Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio	un	73,00	-		-	73,00	21,33	1.557,09	-	-	-	1.557,09	-
01.08	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**								**55.130,90**	-	**14.223,68**	**14.223,68**	**40.907,22**	**25,79**
01.08.001	**PADRÃO DE ENTRADA**								**8.763,42**	-	-	-	**8.763,42**	-
01.08.001.001	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1,00	-		-	1,00	559,57	559,57	-	-	-	559,57	-
01.08.001.002	Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 10KA	un	1,00	-		-	1,00	161,77	161,77	-	-	-	161,77	-
01.08.001.003	Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo	un	1,00	-		-	1,00	486,25	486,25	-	-	-	486,25	-
01.08.001.004	Cabeçote de alumínio de 1 1/2"	un	3,00	-		-	3,00	17,70	53,10	-	-	-	53,10	-
01.08.001.005	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	3,00	-		-	3,00	21,38	64,14	-	-	-	64,14	-

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (POVOADO TERRA DURA), NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CR 965393-OP1.097.075-09/2024/MESP	DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 06	CONTRATO: Nº 258/2025
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	VIGÊNCIA	25/08/2026	Período: 01/04/2026 a 30/04/2026	RECURSO:
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	EXECUÇÃO	25/08/2026	Data da Medição: 10/06/2026	

Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
01.08.001.006	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	3,00	-		-	3,00	143,40	430,20	-	-	-	430,20	-
01.08.001.007	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x25+25mm2	m	50,00	-		-	50,00	12,25	612,50	-	-	-	612,50	-
01.08.001.008	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 16mm², 1kv / 90° C	m	230,00	-		-	230,00	20,24	4.655,20	-	-	-	4.655,20	-
01.08.001.009	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	80,00	-		-	80,00	19,17	1.533,60	-	-	-	1.533,60	-
01.08.001.010	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	27,00	-		-	27,00	7,67	207,09	-	-	-	207,09	-
01.08.002	**QUADRO DE COMANDO - GDEL**								**1.965,96**	-	-	-	**1.965,96**	-
01.08.002.001	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	un	1,00	-		-	1,00	510,04	510,04	-	-	-	510,04	-
01.08.002.002	Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 10KA	un	1,00	-		-	1,00	161,77	161,77	-	-	-	161,77	-
01.08.002.003	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	-		-	1,00	21,38	21,38	-	-	-	21,38	-
01.08.002.004	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	-		-	1,00	143,40	143,40	-	-	-	143,40	-
01.08.002.005	Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	un	4,00	-		-	4,00	59,09	236,36	-	-	-	236,36	-
01.08.002.006	Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A	un	1,00	-		-	1,00	101,52	101,52	-	-	-	101,52	-
01.08.002.007	Contator tripolar i nominal 38a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	2,00	-		-	2,00	333,73	667,46	-	-	-	667,46	-
01.08.002.008	Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	4,00	-		-	4,00	21,58	86,32	-	-	-	86,32	-
01.08.002.009	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af_02/2025	un	1,00	-		-	1,00	37,71	37,71	-	-	-	37,71	-
01.08.003	**ILUMINAÇÃO QUADRA**								**44.401,52**	-	**14.223,68**	**14.223,68**	**30.177,84**	**32,03**
01.08.003.001	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	210,00	-		-	210,00	17,24	3.620,40	-	-	-	3.620,40	-
01.08.003.002	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	70,00	-		-	70,00	5,82	407,40	-	-	-	407,40	-

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (POVOADO TERRA DURA), NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CR 965393-OP1.097.075-09/2024/MESP	DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 06	CONTRATO: Nº 258/2025
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	VIGÊNCIA	25/08/2026	Período: 01/04/2026 a 30/04/2026	RECURSO:
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	EXECUÇÃO	25/08/2026	Data da Medição: 10/06/2026	

Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
01.08.003.003	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 10mm², 1kv / 90° C	m	750,00	-		-	750,00	14,92	11.190,00	-	-	-	11.190,00	-
01.08.003.004	Poste circular de concreto 10/200 - fornecimento e assentamento	un	4,00	-	4,00	4,00	-	2.034,73	8.138,92	-	8.138,92	8.138,92	-	100,00
01.08.003.005	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	4,00	-		-	4,00	187,45	749,80	-	-	-	749,80	-
01.08.003.006	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m	un	3,00	-		-	3,00	388,95	1.166,85	-	-	-	1.166,85	-
01.08.003.007	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,50x0,50mx0,07m	un	3,00	-		-	3,00	38,49	115,47	-	-	-	115,47	-
01.08.003.008	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.40m, com tampa em tela de proteção metálica com dobradiça e porta cadeado	un	8,00	-		-	8,00	511,46	4.091,68	-	-	-	4.091,68	-
01.08.003.009	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	8,00	-		-	8,00	143,40	1.147,20	-	-	-	1.147,20	-
01.08.003.010	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,24.0000 lm e 32.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	un	8,00	-	4,00	4,00	4,00	1.521,19	12.169,52	-	6.084,76	6.084,76	6.084,76	50,00
01.08.003.011	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	12,00	-		-	12,00	133,69	1.604,28	-	-	-	1.604,28	-
01.09	**DRENAGEM PLUVIAL**								**15.945,62**	**-**	**4.720,65**	**4.720,65**	**11.224,97**	**29,60**
01.09.001	**TUBULAÇÃO PVC**								**5.861,00**	**-**	**3.504,57**	**3.504,57**	**2.356,43**	**59,79**
01.09.001.001	Tubo pvc rigido soldavel, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 100mm	m	96,31	-	62,70	62,70	33,61	39,47	3.801,36	-	2.474,76	2.474,76	1.326,60	65,10
01.09.001.002	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af 06/2022	m	53,40	-	26,70	26,70	26,70	27,73	1.480,78	-	740,39	740,39	740,39	50,00
01.09.001.003	Fixação de tubos verticais de pvc água, pvc esgoto, pvc água pluvial, cpvc, ppr, cobre ou aço, diâmetros maiores que 75 mm e menores ou iguais a 100 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo u perfil 4", fixada em perfilado em parede. af 09/2023 ps	m	53,40	-	26,70	26,70	26,70	10,84	578,86	-	289,42	289,42	289,44	49,99
01.09.002	**CAIXAS DE PASSAGEM**								**2.128,14**	**-**	**1.216,08**	**1.216,08**	**912,06**	**57,14**
01.09.002.001	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa	un	7,00	-	4,00	4,00	3,00	304,02	2.128,14	-	1.216,08	1.216,08	912,06	57,14
01.09.003	**CALHAS**								**7.956,48**	**-**	**-**	**-**	**7.956,48**	**-**
01.09.003.001	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm	m	67,20	-		-	67,20	118,40	7.956,48	-	-	-	7.956,48	-
01.10	**DIVERSOS**								**24.000,97**	**6.003,96**	**-**	**6.003,96**	**17.997,01**	**25,01**
01.10.001	**EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS**								**10.853,77**	**6.003,96**	**-**	**6.003,96**	**4.849,81**	**55,31**
01.10.001.001	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00	-		-	1,00	3.502,64	3.502,64	-	-	-	3.502,64	-
01.10.001.002	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada	un	2,00	2,00		2,00	-	3.001,98	6.003,96	6.003,96	-	6.003,96	-	100,00
01.10.001.003	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1,00	-		-	1,00	1.102,23	1.102,23	-	-	-	1.102,23	-
01.10.001.004	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00	-		-	1,00	244,94	244,94	-	-	-	244,94	-

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (POVOADO TERRA DURA), NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CR 965393-OP1.097.075-09/2024/MESP	DATA DE TÉRMINO	BOLETIM DE MEDIÇÃO 06	CONTRATO: Nº 258/2025
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	VIGÊNCIA 25/08/2026	Período: 01/04/2026 a 30/04/2026	RECURSO:
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	EXECUÇÃO 25/08/2026	Data da Medição: 10/06/2026	

Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
01.10.002	MOBILIÁRIO URBANO								13.147,20	-	-	-	13.147,20	-
01.10.002.001	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	24,00	-		-	24,00	186,22	4.469,28	-	-	-	4.469,28	-
01.10.002.002	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	4,00	-		-	4,00	367,13	1.468,52	-	-	-	1.468,52	-
01.10.002.003	Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos	un	2,00	-		-	2,00	3.604,70	7.209,40	-	-	-	7.209,40	-
01.11	MURO DE FECHAMENTO								71.637,65	55.199,09	-	55.199,09	16.438,56	77,05
01.11.001	ALVENARIA DE VEDAÇÃO								55.199,09	55.199,09	-	55.199,09	-	100,00
01.11.001.001	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m2	229,91	229,91		229,91	-	240,09	55.199,09	55.199,09	-	55.199,09	-	100,00
01.11.002	PINTURA								16.438,56	-	-	-	16.438,56	-
01.11.002.001	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023	m2	459,82	-		-	459,82	3,07	1.411,65	-	-	-	1.411,65	-
01.11.002.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	459,82	-		-	459,82	17,42	8.010,06	-	-	-	8.010,06	-
01.11.002.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	459,82	-		-	459,82	15,26	7.016,85	-	-	-	7.016,85	-
01.12	ESTACIONAMENTO								29.950,32	-	-	-	29.950,32	-
01.12.001	PAVIMENTAÇÃO								29.950,32	-	-	-	29.950,32	-
01.12.001.001	Lastro de brita 1	m3	28,27	-		-	28,27	176,42	4.987,39	-	-	-	4.987,39	-
01.12.001.002	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular de 20 x 10 cm, espessura 10 cm. af_10/2022	m2	262,74	-		-	262,74	95,01	24.962,93	-	-	-	24.962,93	-
01.13	SERVIÇOS FINAIS								7.399,50	-	-	-	7.399,50	-
01.13.001	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA								3.829,17	-	-	-	3.829,17	-
01.13.001.001	Limpeza geral	m2	1.867,89	-		-	1.867,89	2,05	3.829,17	-	-	-	3.829,17	-
01.13.002	DIVERSOS								3.570,33	-	-	-	3.570,33	-
01.13.002.001	Marco Inaugural - Padrão Município	un	1,00	-		-	1,00	1.363,45	1.363,45	-	-	-	1.363,45	-
01.13.002.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	-		-	1,00	2.206,88	2.206,88	-	-	-	2.206,88	-
TOTAL:									877.486,76	594.484,28	52.008,13	646.492,41	230.994,35	73,66%
PERCENTUAL										67,74%	5,92%	73,66%	26,34%	

ASSINATURA DA EMPRESA

KLEBER DE SOUZA OLIVEIRA:79045880563

Assinado de forma digital por KLEBER DE SOUZA OLIVEIRA:79045880563
Dados: 2026.06.30 10:06:18 -03'00'

FISCAL DO CONTRATO

ENGº. JOÃO VITOR REIS DOS SANTOS - CREA 2723359220

gov.br Documento assinado digitalmente
JOAO VITOR REIS DOS SANTOS
Data: 30/06/2026 08:28:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
DIEGO OLIVEIRA BARROS
Data: 30/06/2026 08:43:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (POVOADO TERRA DURA), NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CR 965393-OP1.097.075-09/2024/MESP				MEMÓRIA DE CÁLCULO BM 06 Período 01/04/2026 a 30/04/2026
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA				
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				Data de medição: **10/06/2026**
Item	**Discriminação dos Serviços**	**Und**	**MEDIDO**	**OBSERVAÇÃO**
01.01	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**			
01.01.001	**EQUIPE DIRIGENTE**			
01.01.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	7,20	120 horas x 0,06 = 7,20 horas
01.01.001.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	14,40	240 horas x 0,06 = 14,40 horas
01.02	**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
01.02.002	**CANTEIRO DE OBRAS**			
01.02.002.003	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	1,00	Referente a 1 mês de obra
01.04	**QUADRA POLIESPORTIVA**			
01.04.001	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**			
01.04.001.001	Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte	m3	125,98	31,40 x 16,30 x 0,24 = 125,98 m³
01.04.002	**PISO QUADRA**			
01.04.002.004	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	50,38	3,09 m x 16,30 m = 50,38 m²
01.04.002.005	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	m2	503,93	30,91 m x 16,30 m = 503,93 m²
01.07	**ÁREA EXTERNA**			
01.07.001	**MEIO-FIO**			
01.07.001.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	115,40	3,50 + 18,20 + 7,80 + 24,10 + 5,40 + 10,60 + 6,90 + 12,30 + 4,80 + 5,10 + 16,70 = 115,40 metros
01.07.002	**PAVIMENTAÇÃO**			
01.07.002.002	Colchão de areia	m3	7,20	24,00 m x 0,15 m x 2,00 m = 7,20 m³
01.07.002.003	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m3	7,20	24,00 m x 0,15 m x 2,00 m = 7,20 m³
01.07.002.006	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	110,60	55,30 m x 2,00 m = 110,60 m²
01.08.003	**ILUMINAÇÃO QUADRA**			
01.10.001	**EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS**			
01.08.003.004	Poste circular de concreto 10/200 - fornecimento e assentamento	un	4,00	4,00 unidades
01.08.003.010	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,24.0000 lm e 32.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	un	4,00	4,00 unidades
01.09	**DRENAGEM PLUVIAL**			
01.09.001	**TUBULAÇÃO PVC**			
01.09.001.001	Tubo pvc rigido soldavel, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 100mm	m	62,70	7,85 + 6,40 + 8,20 + 9,75 + 6,95 + 7,30 + 8,65 + 7,60 = 62,70 metros
01.09.001.002	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022	m	26,70	9,00 + 8,90 + 8,80 = 26,70 metros
01.09.001.003	Fixação de tubos verticais de pvc água, pvc esgoto, pvc água pluvial, cpvc, ppr, cobre ou aço, diâmetros maiores que 75 mm e menores ou iguais a 100 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo u perfil 4", fixada em perfilado em parede. af_09/2023_ps	m	26,70	9,00 + 8,90 + 8,80 = 26,70 metros
01.09.002	**CAIXAS DE PASSAGEM**			
01.09.002.001	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa	un	4,00	4,00 unidades
		Atestamos que os serviços constantes na NF foram recebidos por nós em perfeita ordem.		
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA		**Data: ___/___/___**		

KLEBER DE SOUZA OLIVEIRA:79045880563

Assinado de forma digital por KLEBER DE SOUZA OLIVEIRA:79045880563
Dados: 2026.06.30 10:07:59 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
JOAO VITOR REIS DOS SANTOS
Data: 30/06/2026 08:28:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
DIEGO OLIVEIRA BARROS
Data: 30/06/2026 08:43:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CAIXA

Relatório fotográfico de medição
Operações de Repasse - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

1 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE

Nº Instrumento Transferegov	Convenente / Recebedor	UF
965393/2024	MUNICIPIO DE ITABAIANA	SE

Objeto
Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Itabaiana/SE (Povoado Terra Dura)

2 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO E FORNECIMENTO

Nº CTEF	Empresa executora	Data de assinatura	Valor vigente
258/2025	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS	25/08/2025	R$ 1.055.885,58

Descrição da meta / submeta	Localidade / Endereço da obra
Construção de Quadra Poliesportiva- Fundação da arquibancada/Cobertura	RODOVIA DO VAQUEIRO, S/N- POVOADO TERRA DURA-

3 IDENTIFICAÇÃO DA MEDIÇÃO

Nº Medição	Data de fechamento	Data da vistoria	Valor medido no período	Valor medido acumulado	% Acum.
06	10/06/2026	10/06/2026	R$ 52.008,13	R$ 646.492,42	74,00%

4 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

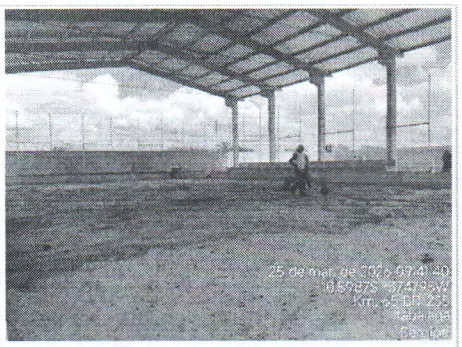

ATERRO PARA A QUADRA

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO

COLCHÃO DE AREIA

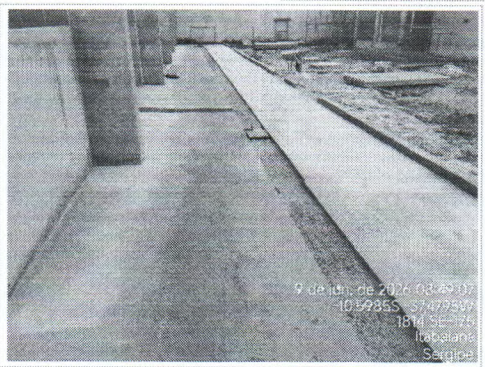

PISO EM CONCRETO SIMPLES

INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO

INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO

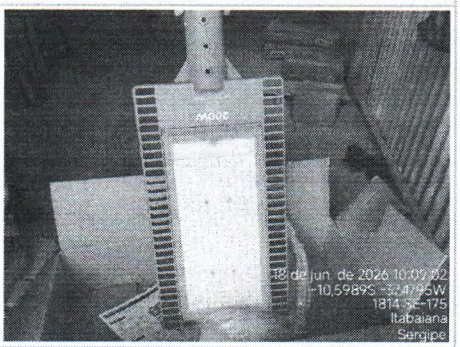

LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

TUBULAÇÃO DRENAGEM PLUVIAL



TUBULAÇÃO DRENAGEM PLUVIAL

EXECUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM

5 DATA E ASSINATURA

Observações

ITABAIANA/SE - 10/06/2026
Local e data

Profissional responsável pela fiscalização
Nome: João Vitor Reis dos Santos CREA -

KLEBER DE SOUZA OLIVEIRA:79045880563

Assinado de forma digital por KLEBER DE SOUZA OLIVEIRA:79045880563
Dados: 2026.06.30 10:10:34 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
JOAO VITOR REIS DOS SANTOS
Data: 30/06/2026 08:28:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
DIEGO OLIVEIRA BARROS
Data: 30/06/2026 08:43:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
