SOL	OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (POVOADO TERRA DURA), NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CR 965393-OP1.097.075-09/2024/MESP	DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 08	CONTRATO: Nº 258/2025
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA		VIGÊNCIA	25/08/2026	Período: 01/06/2026 a 30/06/2026	RECURSO:
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		EXECUÇÃO	25/08/2026	Data da Medição: 10/08/2026	

Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Valores (R$)						
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Unit.	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
1	**Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Itabaiana/SE (Povoado Terra Dura)**								**877.486,76**	**702.904,93**	**66.335,91**	**769.240,84**	**108.245,92**	**88%**
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								31.250,40	24.687,82	2.187,52	26.875,34	4.375,06	85,99
01.01.001	EQUIPE DIRIGENTE								31.250,40	24.687,82	2.187,52	26.875,34	4.375,06	85,99
01.01.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	120,00	94,80	8,40	103,20	16,80	145,00	17.400,00	13.746,00	1.218,00	14.964,00	2.436,00	86,00
01.01.001.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	240,00	189,60	16,80	206,40	33,60	57,71	13.850,40	10.941,82	969,52	11.911,34	1.939,06	85,99
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES								29.673,42	28.323,78	722,57	29.046,35	627,07	97,88
01.02.001	PLACA DE OBRA								1.553,09	1.553,09	-	1.553,09	-	100,00
01.02.001.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022	m2	4,50	4,50		4,50	-	345,13	1.553,09	1.553,09	-	1.553,09	-	-
01.02.002	CANTEIRO DE OBRAS								23.091,14	21.741,50	722,57	22.464,07	627,07	97,28
01.02.002.001	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03 10/2022	UN	1,00	-		-	1,00	627,07	627,07	-	-	-	627,07	-
01.02.002.002	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1,00		1,00	-	1.824,78	1.824,78	1.824,78	-	1.824,78	-	100,00
01.02.002.003	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02 02/2022	mês	8,00	7,00	1,00	8,00	-	722,57	5.780,56	5.057,99	722,57	5.780,56	-	100,00
01.02.002.004	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	2.788,76	2.788,76		2.788,76	-	1,70	4.740,89	4.740,89	-	4.740,89	-	100,00
01.02.002.005	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	66,67	66,67		66,67	-	151,76	10.117,84	10.117,84	-	10.117,84	-	100,00
01.02.003	LOCAÇÃO								5.029,19	5.029,19	-	5.029,19	-	100,00
01.02.003.001	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	752,64	752,64		752,64	-	5,63	4.237,36	4.237,36	-	4.237,36	-	100,00
01.02.003.002	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	1.115,25	1.115,25		1.115,25	-	0,71	791,83	791,83	-	791,83	-	100,00
01.03	GALPÃO PRÉ MOLDADO								325.081,76	325.081,76	-	325.081,76	-	100,00
01.03.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								227,28	227,28	-	227,28	-	100,00
01.03.001.001	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	12,00	12,00		12,00	-	12,49	149,88	149,88	-	149,88	-	100,00
01.03.001.002	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	18,00	18,00		18,00	-	1,21	21,78	21,78	-	21,78	-	100,00
01.03.001.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	54,00	54,00		54,00	-	1,03	55,62	55,62	-	55,62	-	100,00
01.03.002	ESTRUTURAS								225.528,58	225.528,58	-	225.528,58	-	100,00
01.03.002.001	Estrutura para galpão pré-moldado de concreto armado, Padrão Quadra de Esporte SEDUC sem lanternim, c/montagem, vãos de 15 a 25m, atirantados, vãos entre pilares de 5,00/6,00m, altura 6,50/7,50m(lateral/meio), excluso telhas, inclusive fundação - Rv1	m2	752,64	752,64		752,64	-	299,65	225.528,58	225.528,58	-	225.528,58	-	100,00
01.03.003	COBERTURA								99.325,90	99.325,90	-	99.325,90	-	100,00
01.03.003.001	Telhamento com telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, não pintada, TP40 - 0,50mm, Kingspan- Isoeste ou similar - Rev 02 10/2022	m2	752,64	752,64		752,64	-	131,97	99.325,90	99.325,90	-	99.325,90	-	100,00
01.04	QUADRA POLIESPORTIVA								76.563,07	74.229,81	-	74.229,81	2.333,26	96,95
01.04.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								9.062,19	9.062,19	-	9.062,19	-	100,00
01.04.001.001	Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte	m3	125,98	125,98		125,98	-	16,17	2.037,10	2.037,10	-	2.037,10	-	100,00
01.04.001.002	Execução de aterro compactado,sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	125,98	125,98		125,98	-	18,22	2.295,36	2.295,36	-	2.295,36	-	100,00

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (POVOADO TERRA DURA), NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CR 965393-OP1.097.075-09/2024/MESP	DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 08	CONTRATO: Nº 258/2025
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	VIGÊNCIA	25/08/2026	Período: 01/06/2026 a 30/06/2026	RECURSO:
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	EXECUÇÃO	25/08/2026	Data da Medição: 10/08/2026	

Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
01.04.001.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	4.591,97	4.591,97		4.591,97	-	1,03	4.729,73	4.729,73	-	4.729,73	-	100,00
01.04.002	**PISO QUADRA**								**65.167,62**	**65.167,62**	**-**	**65.167,62**	**-**	**100,00**
01.04.002.001	Lona plástica preta	m2	503,93	503,93		503,93	-	5,44	2.741,38	2.741,38	-	2.741,38	-	100,00
01.04.002.002	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15cm, ferro 3.4mm (0.97 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	503,93	503,93		503,93	-	16,55	8.340,04	8.340,04	-	8.340,04	-	100,00
01.04.002.003	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	503,93	503,93		503,93	-	33,32	16.790,95	16.790,95	-	16.790,95	-	100,00
01.04.002.004	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	503,93	503,93		503,93	-	36,45	18.368,25	18.368,25	-	18.368,25	-	100,00
01.04.002.005	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	m2	503,93	503,93		503,93	-	32,21	16.231,59	16.231,59	-	16.231,59	-	100,00
01.04.002.006	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	55,37	55,37		55,37	-	48,68	2.695,41	2.695,41	-	2.695,41	-	100,00
01.04.003	**PINTURA DE DEMARCAÇÃO**								**2.333,26**		**-**	**-**	**2.333,26**	**-**
01.04.003.001	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, e = 5 cm, aplicação manual. af_05/2021	m	282,82	-		-	282,82	8,25	2.333,26	-	-	-	2.333,26	-
01.05	**ALAMBRADO E MURETA**								**120.517,62**	**78.927,66**	**-**	**78.927,66**	**41.589,96**	**65,49**
01.05.001	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**								**819,93**	**819,93**	**-**	**819,93**	**-**	**100,00**
01.05.001.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	11,52	11,52		11,52	-	55,70	641,66	641,66	-	641,66	-	100,00
01.05.001.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	13,82	13,82		13,82	-	9,81	135,57	135,57	-	135,57	-	100,00
01.05.001.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	41,46	41,46		41,46	-	1,03	42,70	42,70	-	42,70	-	100,00
01.05.002	**INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)**								**5.308,76**	**5.308,76**	**-**	**5.308,76**	**-**	**100,00**
01.05.002.001	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	11,52	11,52		11,52	-	460,83	5.308,76	5.308,76	-	5.308,76	-	100,00
01.05.003	**ALVENARIA**								**2.607,27**	**2.607,27**	**-**	**2.607,27**	**-**	**100,00**
01.05.003.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	56,52	56,52		56,52	-	46,13	2.607,27	2.607,27	-	2.607,27	-	100,00
01.05.004	**REVESTIMENTO DE PAREDES**								**4.916,39**	**4.916,39**	**-**	**4.916,39**	**-**	**100,00**
01.05.004.001	Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto internas, com equipamento de projeção. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_10/2022	m2	127,17	127,17		127,17	-	4,38	557,00	557,00	-	557,00	-	100,00
01.05.004.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	127,17	127,17		127,17	-	34,28	4.359,39	4.359,39	-	4.359,39	-	100,00
01.05.005	**ALAMBRADO**								**98.590,27**	**59.557,75**	**-**	**59.557,75**	**39.032,52**	**60,40**
01.05.005.001	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	1,97	1,97		1,97	-	491,46	968,18	968,18	-	968,18	-	100,00
01.05.005.002	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m2	337,92	202,80		202,80	135,12	280,54	94.800,08	56.893,51	-	56.893,51	37.906,57	60,01
01.05.005.003	Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2" e tela ondulada malha 3/8"	m2	3,96	2,38		2,38	1,58	712,63	2.822,01	1.696,06	-	1.696,06	1.125,95	60,10
01.05.006	**PINTURA**								**5.717,56**	**5.717,56**	**-**	**5.717,56**	**-**	**100,00**
01.05.006.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	127,17	127,17		127,17	-	44,96	5.717,56	5.717,56	-	5.717,56	-	100,00
01.05.007	**DIVERSOS**								**2.557,44**	**-**	**-**	**-**	**2.557,44**	**-**

SOL	OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (POVOADO TERRA DURA), NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CR 965393-OP1.097.075-09/2024/MESP	DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 08	CONTRATO: Nº 258/2025
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA		VIGÊNCIA	25/08/2026	Período: 01/06/2026 a 30/06/2026	RECURSO:
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		EXECUÇÃO	25/08/2026	Data da Medição: 10/08/2026	

Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
01.05.007.001	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²	144,00	-		-	144,00	17,76	2.557,44	-	-	-	2.557,44	-
01.06	**ARQUIBANCADA**								**20.543,89**	**19.390,94**	**1.152,95**	**20.543,89**	-	**100,00**
01.06.001	**MOVIMENTO DE TERRA**								**3.297,13**	**3.297,13**	-	**3.297,13**	-	**100,00**
01.06.001.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	6,12	6,12		6,12	-	55,70	340,88	340,88	-	340,88	-	100,00
01.06.001.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	7,34	7,34		7,34	-	9,81	72,01	72,01	-	72,01	-	100,00
01.06.001.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	22,02	22,02		22,02	-	1,03	22,68	22,68	-	22,68	-	100,00
01.06.001.004	Aterro de áreas,com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	m3	17,23	17,23		17,23	-	156,03	2.688,40	2.688,40	-	2.688,40	-	100,00
01.06.001.005	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m3	17,23	17,23		17,23	-	10,05	173,16	173,16	-	173,16	-	100,00
01.06.002	**ESTRUTURA**								**4.096,13**	**4.096,13**	-	**4.096,13**	-	**100,00**
01.06.002.001	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	6,12	6,12		6,12	-	460,83	2.820,28	2.820,28	-	2.820,28	-	100,00
01.06.002.002	Concreto armado fck=21MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em tábua (05 usos)	m3	0,56	0,56		0,56	-	2.278,31	1.275,85	1.275,85	-	1.275,85	-	100,00
01.06.003	**ALVENARIA**								**3.049,39**	**2.443,86**	**605,53**	**3.049,39**	-	**100,00**
01.06.003.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 14x19x24cm, e=14cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev 01 07/2024	m2	64,51	51,70	**12,81**	64,51	-	47,27	3.049,39	2.443,86	605,53	3.049,39	-	100,00
01.06.004	**REVESTIMENTO DE PAREDES**								**2.739,45**	**2.192,03**	**547,42**	**2.739,45**	-	**100,00**
01.06.004.001	Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto internas, com equipamento de projeção. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af 10/2022	m2	70,86	56,70	**14,16**	70,86	-	4,38	310,37	248,35	62,02	310,37	-	100,00
01.06.004.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	70,86	56,70	**14,16**	70,86	-	34,28	2.429,08	1.943,68	485,40	2.429,08	-	100,00
01.06.005	**PAVIMENTAÇÃO**								**1.578,20**	**1.578,20**	-	**1.578,20**	-	**100,00**
01.06.005.001	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	35,04	35,04		35,04	-	45,04	1.578,20	1.578,20	-	1.578,20	-	100,00
01.06.006	**PINTURA**								**2.990,29**	**2.990,29**	-	**2.990,29**	-	**100,00**
01.06.006.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	70,86	70,86		70,86	-	42,20	2.990,29	2.990,29	-	2.990,29	-	100,00
01.06.007	**DIVERSOS**								**2.793,30**	**2.793,30**	-	**2.793,30**	-	**100,00**
01.06.007.001	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	15,00	15,00		15,00	-	186,22	2.793,30	2.793,30	-	2.793,30	-	100,00
01.07	**ÁREA EXTERNA**								**69.791,64**	**49.978,60**	**7.961,62**	**57.940,22**	**11.851,42**	**83,01**
01.07.001	**MEIO-FIO**								**13.341,97**	**11.085,74**	**2.256,23**	**13.341,97**	-	**100,00**
01.07.001.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af 01/2024	m	330,82	314,40	**16,42**	330,82	-	35,26	11.664,71	11.085,74	578,97	11.664,71	-	100,00
01.07.001.002	Pintura de meio fio (caiação)	m	330,82	-	**330,82**	330,82	-	5,07	1.677,26	-	1.677,26	1.677,26	-	100,00

SOL	OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (POVOADO TERRA DURA), NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CR 965393-OP1.097.075-09/2024/MESP	DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 08	CONTRATO: Nº 258/2025
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA		VIGÊNCIA	25/08/2026	Período: 01/06/2026 a 30/06/2026	RECURSO:
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		EXECUÇÃO	25/08/2026	Data da Medição: 10/08/2026	

Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
01.07.002	**PAVIMENTAÇÃO**								**37.029,63**	**32.955,43**	**4.074,20**	**37.029,63**	-	**100,00**
01.07.002.001	Lona plástica preta	m2	479,83	407,87	**71,96**	479,83	-	5,44	2.610,28	2.218,81	391,47	2.610,28	-	100,00
01.07.002.002	Colchão de areia	m3	23,99	20,40	**3,59**	23,99	-	116,08	2.784,76	2.368,03	416,73	2.784,76	-	100,00
01.07.002.003	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m3	23,99	20,40	**3,59**	23,99	-	10,05	241,10	205,02	36,08	241,10	-	100,00
01.07.002.004	Lastro de brita 1	m3	5,88	5,88		5,88	-	176,42	1.037,35	1.037,35	-	1.037,35	-	100,00
01.07.002.005	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	m2	117,51	117,51		117,51	-	75,05	8.819,13	8.819,13	-	8.819,13	-	100,00
01.07.002.006	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	442,42	376,07	**66,35**	442,42	-	48,68	21.537,01	18.307,09	3.229,92	21.537,01	-	100,00
01.07.003	**ACESSIBILIDADE**								**7.568,62**	**5.937,43**	**1.631,19**	**7.568,62**	-	**100,00**
01.07.003.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4	m³	1,50	1,50		1,50	-	969,93	1.454,89	1.454,90	(0,01)	1.454,89	-	100,00
01.07.003.002	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	37,41	31,80	**5,61**	37,41	-	140,96	5.273,31	4.482,53	790,78	5.273,31	-	100,00
01.07.003.003	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00	-	**2,00**	2,00	-	352,66	705,32	-	705,32	705,32	-	100,00
01.07.003.004	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	6,24	-	**6,24**	6,24	-	21,65	135,10	-	135,10	135,10	-	100,00
01.07.004	**PAISAGISMO**								**11.851,42**	-	-	-	**11.851,42**	-
01.07.004.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	360,10	-		-	360,10	20,83	7.500,88	-	-	-	7.500,88	-
01.07.004.002	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio	un	2,00	-		-	2,00	98,87	197,74	-	-	-	197,74	-
01.07.004.003	Planta - Ipê roxo (Tabebuia impetiginosa), porte da muda = 1,50m, fornecimento e plantio	un	4,00	-		-	4,00	86,62	346,48	-	-	-	346,48	-
01.07.004.004	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média	un	6,00	-		-	6,00	107,77	646,62	-	-	-	646,62	-
01.07.004.005	Planta - Pau Ferro (Libidibia ferrea), porte da muda = 1,50m, fornecimento e plantio	un	6,00	-		-	6,00	86,62	519,72	-	-	-	519,72	-
01.07.004.006	Planta - Canafistula (Cassia grands) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	2,00	-		-	2,00	98,87	197,74	-	-	-	197,74	-
01.07.004.007	Planta - Flor ave do paraíso (strelitzia reginae) - muda, fornecimento e plantio	un	15,00	-		-	15,00	59,01	885,15	-	-	-	885,15	-
01.07.004.008	Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio	un	73,00	-		-	73,00	21,33	1.557,09	-	-	-	1.557,09	-
01.08	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**								**55.130,90**	**28.296,33**	**8.249,14**	**36.545,47**	**18.585,43**	**66,28**
01.08.001	**PADRÃO DE ENTRADA**								**8.763,42**	**3.333,95**	-	**3.333,95**	**5.429,47**	**38,04**
01.08.001.001	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1,00	1,00		1,00	-	559,57	559,57	559,57	-	559,57	-	100,00
01.08.001.002	Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 10KA	un	1,00	-		-	1,00	161,77	161,77	-	-	-	161,77	-
01.08.001.003	Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo	un	1,00	1,00		1,00	-	486,25	486,25	486,25	-	486,25	-	100,00
01.08.001.004	Cabeçote de alumínio de 1 1/2"	un	3,00	3,00		3,00	-	17,70	53,10	53,10	-	53,10	-	100,00
01.08.001.005	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	3,00	3,00		3,00	-	21,38	64,14	64,14	-	64,14	-	100,00

	OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (POVOADO TERRA DURA), NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CR 965393-OP1.097.075-09/2024/MESP	DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 08	CONTRATO: Nº 258/2025
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA		VIGÊNCIA	25/08/2026	Período: 01/06/2026 a 30/06/2026	RECURSO:
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		EXECUÇÃO	25/08/2026	Data da Medição: 10/08/2026	

Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Valores (R$)						
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Unit.	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
01.08.001.006	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	3,00	3,00		3,00	-	143,40	430,20	430,20	-	430,20	-	100,00
01.08.001.007	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x25+25mm2	m	50,00	-		-	50,00	12,25	612,50	-	-	-	612,50	-
01.08.001.008	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 16mm², 1kv / 90º C	m	230,00	-		-	230,00	20,24	4.655,20	-	-	-	4.655,20	-
01.08.001.009	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	80,00	80,00		80,00	-	19,17	1.533,60	1.533,60	-	1.533,60	-	100,00
01.08.001.010	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	27,00	27,00		27,00	-	7,67	207,09	207,09	-	207,09	-	100,00
01.08.002	**QUADRO DE COMANDO - GDEL**								**1.965,96**	-	-	-	**1.965,96**	-
01.08.002.001	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	un	1,00	-		-	1,00	510,04	510,04	-	-	-	510,04	-
01.08.002.002	Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 10KA	un	1,00	-		-	1,00	161,77	161,77	-	-	-	161,77	-
01.08.002.003	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	-		-	1,00	21,38	21,38	-	-	-	21,38	-
01.08.002.004	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	-		-	1,00	143,40	143,40	-	-	-	143,40	-
01.08.002.005	Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	un	4,00	-		-	4,00	59,09	236,36	-	-	-	236,36	-
01.08.002.006	Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A	un	1,00	-		-	1,00	101,52	101,52	-	-	-	101,52	-
01.08.002.007	Contator tripolar i nominal 38a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	2,00	-		-	2,00	333,73	667,46	-	-	-	667,46	-
01.08.002.008	Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	4,00	-		-	4,00	21,58	86,32	-	-	-	86,32	-
01.08.002.009	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af_02/2025	un	1,00	-		-	1,00	37,71	37,71	-	-	-	37,71	-
01.08.003	**ILUMINAÇÃO QUADRA**								**44.401,52**	**24.962,38**	**8.249,14**	**33.211,52**	**11.190,00**	**74,79**
01.08.003.001	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	210,00	210,00		210,00	-	17,24	3.620,40	3.620,40	-	3.620,40	-	100,00
01.08.003.002	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	70,00	70,00		70,00	-	5,82	407,40	407,40	-	407,40	-	100,00

SOL	OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (POVOADO TERRA DURA), NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CR 965393-OP1.097.075-09/2024/MESP	DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 08	CONTRATO: Nº 258/2025
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA		VIGÊNCIA	25/08/2026	Período: 01/06/2026 a 30/06/2026	RECURSO:
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		EXECUÇÃO	25/08/2026	Data da Medição: 10/08/2026	

Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
01.08.003.003	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 10mm², 1kv / 90º C	m	750,00	-		-	750,00	14,92	11.190,00	-	-	-	11.190,00	-
01.08.003.004	Poste circular de concreto 10/200 - fornecimento e assentamento	un	4,00	4,00		4,00	-	2.034,73	8.138,92	8.138,92	-	8.138,92	-	100,00
01.08.003.005	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	4,00	-	4,00	4,00	-	187,45	749,80	-	749,80	749,80	-	100,00
01.08.003.006	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m	un	3,00	3,00		3,00	-	388,95	1.166,85	1.166,85	-	1.166,85	-	100,00
01.08.003.007	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,50x0,50mx0,07m	un	3,00	3,00		3,00	-	38,49	115,47	115,47	-	115,47	-	100,00
01.08.003.008	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.40m, com tampa em tela de proteção metálica com dobradiça e porta cadeado	un	8,00	8,00		8,00	-	511,46	4.091,68	4.091,68	-	4.091,68	-	100,00
01.08.003.009	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	8,00	-	8,00	8,00	-	143,40	1.147,20	-	1.147,20	1.147,20	-	100,00
01.08.003.010	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,24.0000 lm e 32.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	un	8,00	4,00	4,00	8,00	-	1.521,19	12.169,52	6.084,76	6.084,76	12.169,52	-	100,00
01.08.003.011	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	12,00	10,00	2,00	12,00	-	133,69	1.604,28	1.336,90	267,38	1.604,28	-	100,00
01.09	**DRENAGEM PLUVIAL**								**15.945,62**	**7.609,83**	**379,31**	**7.989,14**	**7.956,48**	**50,10**
01.09.001	**TUBULAÇÃO PVC**								**5.861,00**	**5.481,69**	**379,31**	**5.861,00**	**-**	**100,00**
01.09.001.001	Tubo pvc rigido soldavel, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 100mm	m	96,31	86,70	9,61	96,31	-	39,47	3.801,36	3.422,05	379,31	3.801,36	-	100,00
01.09.001.002	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022	m	53,40	53,40		53,40	-	27,73	1.480,78	1.480,78	-	1.480,78	-	100,00
01.09.001.003	Fixação de tubos verticais de pvc água, pvc esgoto, pvc água pluvial, cpvc, ppr, cobre ou aço, diâmetros maiores que 75 mm e menores ou iguais a 100 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo u perfil 4", fixada em perfilado em parede, af_09/2023_ps	m	53,40	53,40		53,40	-	10,84	578,86	578,86	-	578,86	-	100,00
01.09.002	**CAIXAS DE PASSAGEM**								**2.128,14**	**2.128,14**	**-**	**2.128,14**	**-**	**100,00**
01.09.002.001	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa	un	7,00	7,00		7,00	-	304,02	2.128,14	2.128,14	-	2.128,14	-	100,00
01.09.003	**CALHAS**								**7.956,48**	**-**	**-**	**-**	**7.956,48**	**-**
01.09.003.001	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm	m	67,20	-		-	67,20	118,40	7.956,48	-	-	-	7.956,48	-
01.10	**DIVERSOS**								**24.000,97**	**10.473,24**	**-**	**10.473,24**	**13.527,73**	**43,63**
01.10.001	**EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS**								**10.853,77**	**6.003,96**	**-**	**6.003,96**	**4.849,81**	**55,31**
01.10.001.001	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00	-		-	1,00	3.502,64	3.502,64	-	-	-	3.502,64	-
01.10.001.002	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada	un	2,00	2,00		2,00	-	3.001,98	6.003,96	6.003,96	-	6.003,96	-	100,00
01.10.001.003	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1,00	-		-	1,00	1.102,23	1.102,23	-	-	-	1.102,23	-
01.10.001.004	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00	-		-	1,00	244,94	244,94	-	-	-	244,94	-

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (POVOADO TERRA DURA), NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CR 965393-OP1.097.075-09/2024/MESP	DATA DE TÉRMINO	BOLETIM DE MEDIÇÃO 08	CONTRATO: Nº 258/2025
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	VIGÊNCIA 25/08/2026	Período: 01/06/2026 a 30/06/2026	RECURSO:
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	EXECUÇÃO 25/08/2026	Data da Medição: 10/08/2026	

Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
01.10.002	MOBILIÁRIO URBANO								13.147,20	4.469,28	-	4.469,28	8.677,92	33,99
01.10.002.001	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	24,00	24,00		24,00	-	186,22	4.469,28	4.469,28	-	4.469,28	-	100,00
01.10.002.002	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	4,00	-		-	4,00	367,13	1.468,52	-	-	-	1.468,52	-
01.10.002.003	Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos	un	2,00	-		-	2,00	3.604,70	7.209,40	-	-	-	7.209,40	-
01.11	MURO DE FECHAMENTO								71.637,65	55.905,19	15.732,46	71.637,65	-	100,00
01.11.001	ALVENARIA DE VEDAÇÃO								55.199,09	55.199,09	-	55.199,09	-	100,00
01.11.001.001	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m2	229,91	229,91		229,91	-	240,09	55.199,09	55.199,09	-	55.199,09	-	100,00
01.11.002	PINTURA								16.438,56	706,10	15.732,46	16.438,56	-	100,00
01.11.002.001	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af 04/2023	m2	459,82	230,00	229,82	459,82	-	3,07	1.411,65	706,10	705,55	1.411,65	-	100,00
01.11.002.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	459,82	-	459,82	459,82	-	17,42	8.010,06	-	8.010,06	8.010,06	-	100,00
01.11.002.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	459,82	-	459,82	459,82	-	15,26	7.016,85	-	7.016,85	7.016,85	-	100,00
01.12	ESTACIONAMENTO								29.950,32	-	29.950,32	29.950,32	-	100,00
01.12.001	PAVIMENTAÇÃO								29.950,32	-	29.950,32	29.950,32	-	100,00
01.12.001.001	Lastro de brita 1	m3	28,27	-	28,27	28,27	-	176,42	4.987,39	-	4.987,39	4.987,39	-	100,00
01.12.001.002	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular de 20 x 10 cm, espessura 10 cm. af_10/2022	m2	262,74	-	262,74	262,74	-	95,01	24.962,93	-	24.962,93	24.962,93	-	100,00
01.13	SERVIÇOS FINAIS								7.399,50	-	-	-	7.399,50	-
01.13.001	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA								3.829,17	-	-	-	3.829,17	-
01.13.001.001	Limpeza geral	m2	1.867,89	-		-	1.867,89	2,05	3.829,17	-	-	-	3.829,17	-
01.13.002	DIVERSOS								3.570,33	-	-	-	3.570,33	-
01.13.002.001	Marco Inaugural - Padrão Município	un	1,00	-		-	1,00	1.363,45	1.363,45	-	-	-	1.363,45	-
01.13.002.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	-		-	1,00	2.206,88	2.206,88	-	-	-	2.206,88	-
TOTAL:									877.486,76	702.904,93	66.335,91	769.240,84	108.245,92	87,65%
PERCENTUAL										80,10%	7,55%	87,65%	12,35%	

KLEBER DE SOUZA OLIVEIRA:79045880563

Assinado de forma digital por KLEBER DE SOUZA OLIVEIRA:79045880563
Dados: 2026.08.18 16:13:28 -03'00'

ASSINATURA DA EMPRESA

FISCAL DO CONTRATO — ENGº. JOÃO VITOR REIS DOS SANTOS - CREA 2723359220

gov.br Documento assinado digitalmente
DIEGO OLIVEIRA BARROS
Data: 20/08/2026 11:41:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
JOAO VITOR REIS DOS SANTOS
Data: 20/08/2026 11:54:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (POVOADO TERRA DURA), NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CR 965393-OP1.097.075-09/2024/MESP				MEMÓRIA DE CÁLCULO BM 08 Período 01/06/2026 a 30/06/2026
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA				
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				Data de medição: **10/08/2026**
Item	**Discriminação dos Serviços**	**Und**	**MEDIDO**	**OBSERVAÇÃO**
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
01.01.001	EQUIPE DIRIGENTE			
01.01.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	8,40	120 horas x 0,07 = 8,40 horas
01.01.001.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	16,80	240 horas x 0,07 = 16,80 horas
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES			
01.02.002	CANTEIRO DE OBRAS			
01.02.002.003	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	1,00	Referente a 1 mês de obra
01.06	ARQUIBANCADA			
01.06.003	ALVENARIA			
01.06.003.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 14x19x24cm, e=14cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev 01_07/2024	m2	12,81	32,02 x 0,40 = 12,81 m²
01.06.004	REVESTIMENTO DE PAREDES			
01.06.004.001	Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto internas, com equipamento de projeção. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_10/2022	m2	14,16	17,70 x 0,80 = 14,16 m²
01.06.004.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	14,16	17,70 x 0,80 = 14,16 m²
01.07	ÁREA EXTERNA			
01.07.001	MEIO-FIO			
01.07.001.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	16,42	10,00 + 4,00 + 2,42 = 16,42 m
01.07.001.002	Pintura de meio fio (caiação)	m	330,82	10,25 + 11,50 + 12,10 + 13,40 + 14,00 + 15,30 + 15,80 + 16,20 + 16,50 + 16,90 + 17,10 + 17,50 + 18,00 + 18,60 + 19,20 + 20,00 + 21,15 + 22,30 + 23,00 + 12,02 = 330,82 m
01.07.002	PAVIMENTAÇÃO			
01.07.002.001	Lona plástica preta	m2	71,96	35,98 x 2,00 = 71,96 m²
01.07.002.002	Colchão de areia	m3	3,59	11,96 x 0,15 x 2,00 = 3,59 m³
01.07.002.003	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m3	3,59	11,96 x 0,15 x 2,00 = 3,59 m³
01.07.002.006	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	66,35	33,17 x 2,00 = 66,35 m²
01.07.003	ACESSIBILIDADE			
01.07.003.002	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	5,61	18,70 x 0,30 = 5,61 m²
01.07.003.003	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00	2,00 unidades
01.07.003.004	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	6,24	3,12 x 2 = 6,24 m²

CAIXA

Relatório fotográfico de medição
Operações de Repasse - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

1 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE

Nº Instrumento Transferegov	Convenente / Recebedor	UF
965393/2024	MUNICIPIO DE ITABAIANA	SE

Objeto
Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Itabaiana/SE (Povoado Terra Dura)

2 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO E FORNECIMENTO

Nº CTEF	Empresa executora	Data de assinatura	Valor vigente
258/2025	CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS	25/08/2025	R$ 1.055.885,58

Descrição da meta / submeta	Localidade / Endereço da obra
Construção de Quadra Poliesportiva - Fundação da arquibancada/Cobertura	RODOVIA DO VAQUEIRO, S/N- POVOADO TERRA DURA-

3 IDENTIFICAÇÃO DA MEDIÇÃO

Nº Medição	Data de fechamento	Data da vistoria	Valor medido no período	Valor medido acumulado	% Acum.
08	10/08/2026	10/08/2026	R$ 66.335,91	R$ 769.240,84	88,00%

4 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

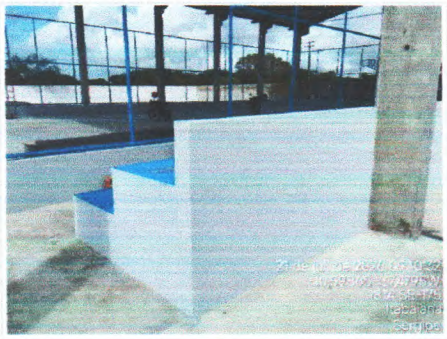

ALVENARIA ARQUIBANCADA



ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO



PINTURA DE MEIO-FIO

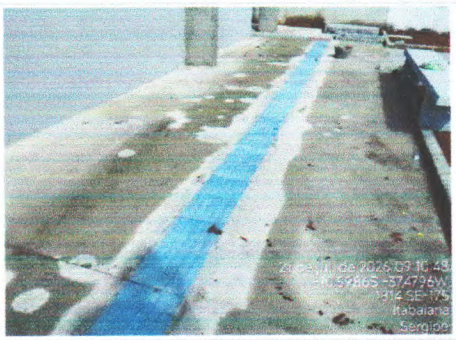

PISO EM CONCRETO SIMPLES

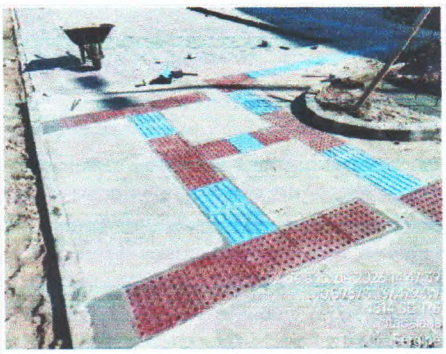

EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL



RAMPA DE ACESSO P/ DEFICIENTE



SUPORTE E LUMINÁRIA ILUM. PÚBLICA



SUPORTE E LUMINÁRIA ILUM. PÚBLICA



REFLETOR DE LED



DRENAGEM PLUVIAL

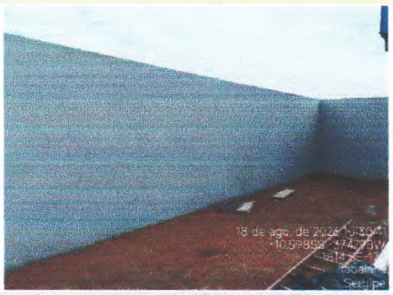

PINTURA DO MURO

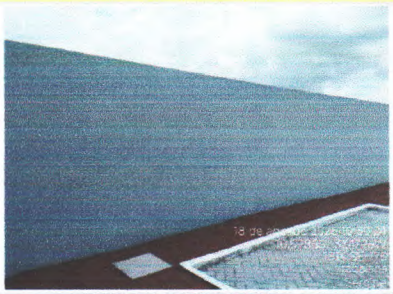

PINTURA DO MURO



PAVIMENTO DO ESTACIONAMENTO



PAVIMENTO DO ESTACIONAMENTO

5 DATA E ASSINATURA

Observações

ITABAIANA/SE - 10/08/2026
Local e data

KLEBER DE SOUZA OLIVEIRA:79045880563
Assinado de forma digital por KLEBER DE SOUZA OLIVEIRA:79045880563
Dados: 2026.08.18 16:28:15 -03'00'

Profissional responsável pela fiscalização
Nome: João Vitor Reis dos Santos CREA -

gov.br Documento assinado digitalmente
JOAO VITOR REIS DOS SANTOS
Data: 20/08/2026 11:54:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
DIEGO OLIVEIRA BARROS
Data: 20/08/2026 11:41:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
