REIS CONSTRUÇÕES
CONSTRUINDO COM RESPONSABILIDADE

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO LAGAMAR								CONTRATO	283/2025	BOLETIM DE MEDIÇÃO	PERÍODO	Saldo a Medir	% Medida
								MÊS DE REFERÊNCIA DA PLANILHA:	01/05/2025	08	29/07/26 A 23/09/26		
ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA (após aditivo)	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO	VALORES R$			CONTRATO		
				ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO		ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO			
1	**Unidade de Saúde - Pov. Lagamar**			**0**				**R$ 511.927,10**	**R$ 72.984,69**	**R$ 584.911,79**	**R$ 683.887,41**	R$ 98.975,62	85,53%
01.01	**SERVIÇO PRELIMINAR**			**0**				**R$ 58.140,04**	**R$ -**	**R$ 58.140,04**	**R$ 58.141,20**	R$ 1,16	100,00%
01.01.001	**PLACA DE OBRA**			**0**				**R$ 2.631,92**	**R$ -**	**R$ 2.631,92**	**R$ 2.631,92**	R$ -	100,00%
01.01.001.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	8	8		8	R$ 328,99	R$ 2.631,92	R$ -	**R$ 2.631,92**	R$ 2.631,92	R$ -	100,00%
01.01.002	**CANTEIRO DE OBRAS**			**0**				**R$ 13.863,49**	**R$ -**	**R$ 13.863,49**	**R$ 13.863,51**	R$ 0,02	100,00%
01.01.002.001	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Ver 02_02/2022	mês	8	8		8	R$ 722,04	R$ 5.776,32	R$ -	**R$ 5.776,32**	R$ 5.776,32	R$ -	100,00%
01.01.002.002	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	585,55	585,55		585,55	R$ 8,87	R$ 5.193,82	R$ -	**R$ 5.193,82**	R$ 5.193,83	R$ 0,01	100,00%
01.01.002.003	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. af_03/2024	m2	533,83	533,83		533,83	R$ 5,42	R$ 2.893,35	R$ -	**R$ 2.893,35**	R$ 2.893,36	R$ 0,01	100,00%
01.01.003	**DEMOLIÇÃO**			**0**				**R$ 41.644,63**	**R$ -**	**R$ 41.644,63**	**R$ 41.645,77**	R$ 1,14	100,00%
01.01.003.001	Demolição de forros	m2	160,56	160,56		160,56	R$ 9,75	R$ 1.565,46	R$ -	**R$ 1.565,46**	R$ 1.565,46	R$ -	100,00%
01.01.003.002	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	17,43	17,43		17,43	R$ 11,34	R$ 197,65	R$ -	**R$ 197,65**	R$ 197,66	R$ 0,01	99,99%
01.01.003.003	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	15,31	15,31		15,31	R$ 29,28	R$ 448,27	R$ -	**R$ 448,27**	R$ 448,28	R$ 0,01	100,00%
01.01.003.004	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	36,01	36,01		36,01	R$ 36,64	R$ 1.319,28	R$ -	**R$ 1.319,28**	R$ 1.319,41	R$ 0,13	99,99%
01.01.003.005	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	un	2	2		2	R$ 127,16	R$ 254,32	R$ -	**R$ 254,32**	R$ 254,32	R$ -	100,00%
01.01.003.006	Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023	m3	8,96	8,96		8,96	R$ 125,86	R$ 1.127,70	R$ -	**R$ 1.127,70**	R$ 1.127,71	R$ 0,01	100,00%
01.01.003.007	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	228,5	228,5		228,5	R$ 24,43	R$ 5.582,25	R$ -	**R$ 5.582,25**	R$ 5.582,26	R$ 0,01	100,00%
01.01.003.008	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	2	2		2	R$ 23,56	R$ 47,12	R$ -	**R$ 47,12**	R$ 47,12	R$ -	100,00%
01.01.003.009	Remoção de cobogó ou bloco de vidro - Rev 02	m2	14,06	14,06		14,06	R$ 16,45	R$ 231,28	R$ -	**R$ 231,28**	R$ 231,29	R$ 0,01	100,00%
01.01.003.010	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m2	41,29	41,29		41,29	R$ 24,91	R$ 1.028,53	R$ -	**R$ 1.028,53**	R$ 1.028,53	R$ 0,00	100,00%
01.01.003.011	Remoção, lavagem, carga e reteihamento de telhas cerâmicas tipo canal comum,fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%. Itabaiana ou similar	m2	253,86	253,85		253,85	R$ 90,74	R$ 23.034,34	R$ -	**R$ 23.034,34**	R$ 23.035,26	R$ 0,92	100,00%
01.01.003.012	Demolição de piso de alta resistência	m2	196,6	196,6		196,6	R$ 24,43	R$ 4.802,93	R$ -	**R$ 4.802,93**	R$ 4.802,94	R$ 0,01	100,00%

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

SEM EFEITO

REIS CONSTRUÇÕES
CONSTRUINDO COM RESPONSABILIDADE

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO LAGAMAR								CONTRATO	283/2025	BOLETIM DE MEDIÇÃO	PERÍODO	Saldo a Medir	% Medida
								MÊS DE REFERÊNCIA DA PLANILHA:	01/05/2025	08	29/07/26 A 23/09/26		
ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA (após aditivo)	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO	VALORES R$			CONTRATO		
				ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO		ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO			
01.01.003.013	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	un	8	8		8	R$ 14,96	R$ 119,68	R$ -	R$ 119,68	R$ 119,68	R$ -	100,00%
01.01.003.014	Remoção de vaso sanitário	un	4	4		4	R$ 15,78	R$ 63,12	R$ -	R$ 63,12	R$ 63,12	R$ -	100,00%
01.01.003.015	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	106,22	106,22		106,22	R$ 12,96	R$ 1.376,58	R$ -	R$ 1.376,58	R$ 1.376,61	R$ 0,03	100,00%
01.01.003.016	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	318,66	318,66		318,66	R$ 1,40	R$ 446,12	R$ -	R$ 446,12	R$ 446,12	R$ -	100,00%
01.02	**FUNDAÇÃO**			0				R$ 14.916,91	R$ -	R$ 14.916,91	R$ 14.907,26	-R$ 9,65	100,06%
01.02.001	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**			0				R$ 1.906,95	R$ -	R$ 1.906,95	R$ 1.906,87	-R$ 0,08	100,00%
01.02.001.001	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	26,77	26,76		26,76	R$ 12,96	R$ 346,80	R$ -	R$ 346,80	R$ 346,94	R$ 0,14	99,96%
01.02.001.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	22,31	22,31		22,31	R$ 64,88	R$ 1.447,69	R$ -	R$ 1.447,69	R$ 1.447,47	-R$ 0,22	100,02%
01.02.001.003	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	80,33	80,33		80,33	R$ 1,40	R$ 112,46	R$ -	R$ 112,46	R$ 112,46	R$ -	100,00%
01.02.002	**ALVENARIA DE PEDRA E VIGA BALDRAME**			0				R$ 13.009,96	R$ -	R$ 13.009,96	R$ 13.000,39	-R$ 9,57	100,07%
01.02.002.001	Alvenaria pedra calcárea aparente argamassada no traço 1:5 - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	10,82	10,82		10,82	R$ 609,65	R$ 6.598,11	R$ -	R$ 6.598,11	R$ 6.596,41	-R$ 1,70	100,03%
01.02.002.002	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	3,38	3,38		3,38	R$ 1.845,79	R$ 6.246,63	R$ -	R$ 6.246,63	R$ 6.238,77	-R$ 7,86	100,13%
01.02.002.003	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m3	9,24	9,24		9,24	R$ 17,88	R$ 165,22	R$ -	R$ 165,22	R$ 165,21	-R$ 0,01	100,01%
01.03	**SUPERESTRUTURA**			0				R$ 24.514,27	R$ -	R$ 24.514,27	R$ 28.130,78	R$ 3.616,51	87,14%
01.03.001	**ARRANQUE DE PILAR**			0				R$ 2.302,79	R$ -	R$ 2.302,79	R$ 2.307,24	R$ 4,45	99,81%
01.03.001.001	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,25	1,25		1,25	R$ 1.845,79	R$ 2.302,79	R$ -	R$ 2.302,79	R$ 2.307,24	R$ 4,45	99,81%
01.03.002	**PILAR**			0				R$ 6.478,72	R$ -	R$ 6.478,72	R$ 6.478,72	R$ -	100,00%
01.03.002.001	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	3,51	3,51		3,51	R$ 1.845,79	R$ 6.478,72	R$ -	R$ 6.478,72	R$ 6.478,72	R$ -	100,00%
01.03.003	**LAJE**			0				R$ 7.722,81	R$ -	R$ 7.722,81	R$ 11.334,86	R$ 3.612,05	68,13%
01.03.003.001	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm,el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m2	29,05	29,05		29,05	R$ 181,11	R$ 5.261,24	R$ -	R$ 5.261,24	R$ 5.261,24	R$ 0,00	100,00%
01.03.003.002	Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:3	m2	15,94	6,6495		6,6495	R$ 198,31	R$ 1.318,66	R$ -	R$ 1.318,66	R$ 3.161,06	R$ 1.842,40	41,72%

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Arnaldo de N Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

SEM EFEITO

REIS CONSTRUÇÕES
CONSTRUINDO COM RESPONSABILIDADE

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO LAGAMAR								CONTRATO	283/2025	BOLETIM DE MEDIÇÃO	PERÍODO	Saldo a Medir	% Medida
								MÊS DE REFERÊNCIA DA PLANILHA:	01/05/2025	08	29/07/26 A 23/09/26		
ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA (após aditivo)	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO	VALORES R$			CONTRATO		
				ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO		ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO			
01.03.003.003	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	18,9	18,9		18,9	R$ 55,50	R$ 1.048,95	R$ -	R$ 1.048,95	R$ 1.048,95	R$ -	100,00%
01.03.003.004	Escoramento em madeira p/ edificações c/ vigas e lajes maciças, 04 usos	m2	5,4	5,4		5,4	R$ 17,40	R$ 93,96	R$ -	R$ 93,96	R$ 1.863,61	R$ 1.769,65	5,04%
01.03.004	**VIGA**			0				R$ 8.009,95	R$ -	R$ 8.009,95	R$ 8.009,96	R$ 0,01	100,00%
01.03.004.001	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	4,05	4,05		4,05	R$ 1.845,79	R$ 7.475,44	R$ -	R$ 7.475,44	R$ 7.475,45	R$ 0,01	100,00%
01.03.004.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 20 cm com abertura de encaixes	m	4,5	4,5		4,5	R$ 118,78	R$ 534,51	R$ -	R$ 534,51	R$ 534,51	R$ -	100,00%
01.04	**ELEVAÇÃO**			0				R$ 26.214,90	R$ -	R$ 26.214,90	R$ 26.214,93	R$ 0,02	100,00%
01.04.001	**PAREDES**			0				R$ 20.690,38	R$ -	R$ 20.690,38	R$ 20.690,40	R$ 0,01	100,00%
01.04.001.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	372,8	372,8		372,8	R$ 55,50	R$ 20.690,38	R$ -	R$ 20.690,38	R$ 20.690,40	R$ 0,01	100,00%
01.04.002	**VERGAS E CONTRAVERGAS**			0				R$ 5.524,52	R$ -	R$ 5.524,52	R$ 5.524,53	R$ 0,01	100,00%
01.04.002.001	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	140,86	140,86		140,86	R$ 39,22	R$ 5.524,52	R$ -	R$ 5.524,52	R$ 5.524,53	R$ 0,01	100,00%
01.05	**COBERTURA**			0				R$ 30.866,69	R$ -	R$ 30.866,69	R$ 31.055,35	R$ 188,66	99,39%
01.05.001	**TELHAMENTO**			0				R$ 30.866,69	R$ -	R$ 30.866,69	R$ 31.055,35	R$ 188,66	99,39%
01.05.001.001	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 4m a 6 m	un	1	1		1	R$ 1.344,85	R$ 1.344,85	R$ -	R$ 1.344,85	R$ 1.344,85	R$ -	100,00%
01.05.001.002	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	m2	126,69	126,69		126,69	R$ 57,02	R$ 7.223,85	R$ -	R$ 7.223,85	R$ 7.223,86	R$ 0,01	100,00%
01.05.001.003	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical, af 07/2019	m2	126,69	126,69		126,69	R$ 68,33	R$ 8.656,71	R$ -	R$ 8.656,71	R$ 8.656,73	R$ 0,02	100,00%
01.05.001.004	Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, impermeabilizada,seção 0,30 x 0,20m. - Rev 01	m	19,6	19,6		19,6	R$ 503,02	R$ 9.859,18	R$ -	R$ 9.859,18	R$ 9.859,19	R$ 0,01	100,00%
01.05.001.005	Emassamento de beiral de telha ceramica	m	42,25	22,25		22,25	R$ 9,43	R$ 209,81	R$ -	R$ 209,81	R$ 398,41	R$ 188,60	52,66%
01.05.001.006	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical, af 07/2019	m	38,84	38,84		38,84	R$ 23,95	R$ 930,21	R$ -	R$ 930,21	R$ 930,19	-R$ 0,02	100,00%
01.05.001.007	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm	m	19,45	19,45		19,45	R$ 135,84	R$ 2.642,08	R$ -	R$ 2.642,08	R$ 2.642,11	R$ 0,03	100,00%
01.06	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**			0				R$ 85.403,56	R$ 79,05	R$ 85.482,61	R$ 90.074,82	R$ 4.592,21	94,90%
01.06.001	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**			0				R$ 85.403,56	R$ 79,05	R$ 85.482,61	R$ 90.074,82	R$ 4.592,21	94,90%

Jhon Lennon Gomes Sa
Eng. Civil CREA - 27218946
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de

José Arnaldo de N Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2121031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

SEM EFEITO
Prefeitura Municipal de Itabaiana

REIS CONSTRUÇÕES
CONSTRUINDO COM RESPONSABILIDADE

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO LAGAMAR								CONTRATO	283/2025	BOLETIM DE MEDIÇÃO	PERÍODO	Saldo a Medir	% Medida
								MÊS DE REFERÊNCIA DA PLANILHA:	01/05/2025	08	29/07/26 A 23/09/26		
ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA (após aditivo)	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO	VALORES R$			CONTRATO		
				ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO		ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO			
01.06.001.001	Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo	un	1	1		1	R$ 480,85	R$ 480,85	R$ -	**R$ 480,85**	R$ 480,85	R$ -	100,00%
01.06.001.002	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1	1		1	R$ 596,86	R$ 596,86	R$ -	**R$ 596,86**	R$ 596,86	R$ -	100,00%
01.06.001.003	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	4	2		2	R$ 22,35	R$ 44,70	R$ -	**R$ 44,70**	R$ 89,40	R$ 44,70	50,00%
01.06.001.004	Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C, 10KA	un	1	1		1	R$ 160,86	R$ 160,86	R$ -	**R$ 160,86**	R$ 160,86	R$ -	100,00%
01.06.001.005	Eletroduto de pvc rigido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	80	80		80	R$ 23,21	R$ 1.856,80	R$ -	**R$ 1.856,80**	R$ 1.856,80	R$ -	100,00%
01.06.001.006	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	27	27		27	R$ 5,64	R$ 152,28	R$ -	**R$ 152,28**	R$ 152,28	R$ -	100,00%
01.06.001.007	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 16mm², 1kv / 90° C	m	220	220		220	R$ 21,78	R$ 4.791,60	R$ -	**R$ 4.791,60**	R$ 4.791,60	R$ -	100,00%
01.06.001.008	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	4	2		2	R$ 129,47	R$ 258,94	R$ -	**R$ 258,94**	R$ 517,88	R$ 258,94	50,00%
01.06.001.009	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores,com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	1		1	R$ 1.975,04	R$ 1.975,04	R$ -	**R$ 1.975,04**	R$ 1.975,04	R$ -	100,00%
01.06.001.010	Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C, 10KA	un	1	1		1	R$ 160,86	R$ 160,86	R$ -	**R$ 160,86**	R$ 160,86	R$ -	100,00%
01.06.001.011	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	5	5		5	R$ 14,98	R$ 74,90	R$ -	**R$ 74,90**	R$ 74,90	R$ -	100,00%
01.06.001.012	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	5	5		5	R$ 13,55	R$ 67,75	R$ -	**R$ 67,75**	R$ 67,75	R$ -	100,00%
01.06.001.013	Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva B	un	11	11		11	R$ 53,37	R$ 587,07	R$ -	**R$ 587,07**	R$ 587,07	R$ -	100,00%
01.06.001.014	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1	1		1	R$ 69,36	R$ 69,36	R$ -	**R$ 69,36**	R$ 69,36	R$ -	100,00%
01.06.001.015	Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),corrente 5KA	un	3	3		3	R$ 61,19	R$ 183,57	R$ -	**R$ 183,57**	R$ 183,57	R$ -	100,00%
01.06.001.016	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	un	2	2		2	R$ 389,13	R$ 778,26	R$ -	**R$ 778,26**	R$ 778,26	R$ -	100,00%
01.06.001.017	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	90	81		81	R$ 333,73	R$ 27.032,13	R$ -	**R$ 27.032,13**	R$ 30.035,70	R$ 3.003,57	90,00%
01.06.001.018	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	6	6		6	R$ 75,61	R$ 453,66	R$ -	**R$ 453,66**	R$ 453,66	R$ -	100,00%
01.06.001.019	Luminária arandela tipo meia lua, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_09/2024	un	18	17	1	18	R$ 79,05	R$ 1.343,85	R$ 79,05	**R$ 1.422,90**	R$ 1.422,90	R$ -	100,00%
01.06.001.020	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af_02/2025	un	5	5		5	R$ 33,00	R$ 165,00	R$ -	**R$ 165,00**	R$ 165,00	R$ -	100,00%
01.06.001.021	Fornecimento de base fixa para relé fotoelétrico	un	5	5		5	R$ 9,33	R$ 46,65	R$ -	**R$ 46,65**	R$ 46,65	R$ -	100,00%

Jhon Lennon Gomes Sam
Eng. Civil CREA - 242189460
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal

Jose Arnaldo do N. Perei
Eng. Civil CREA - 27
Coordenador
Prefeitura

SEM EFEITO
Prefeitura Municipal de Ibateguara

REIS CONSTRUÇÕES
CONSTRUINDO COM RESPONSABILIDADE

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO LAGAMAR							CONTRATO	283/2025	BOLETIM DE MEDIÇÃO	PERÍODO	Saldo a Medir	% Medida
							MÊS DE REFERÊNCIA DA PLANILHA:	01/05/2025	08	29/07/26 A 23/09/26		
ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA (após aditivo)	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO	VALORES R$				
				ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO		ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO	CONTRATO	
01.06.001.022	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un	66	55		55	R$ 69,70	R$ 3.833,50	R$ -	R$ 3.833,50	R$ 4.600,20	R$ 766,70 83,33%
01.06.001.023	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	78	78		78	R$ 248,91	R$ 19.414,98	R$ -	R$ 19.414,98	R$ 19.414,98	R$ - 100,00%
01.06.001.024	Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc rigido Ø 3/4"	un	7	7		7	R$ 301,38	R$ 2.109,66	R$ -	R$ 2.109,66	R$ 2.109,66	R$ - 100,00%
01.06.001.025	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	4	4		4	R$ 229,03	R$ 916,12	R$ -	R$ 916,12	R$ 916,12	R$ - 100,00%
01.06.001.026	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	pt	13	13		13	R$ 232,76	R$ 3.025,88	R$ -	R$ 3.025,88	R$ 3.025,88	R$ - 100,00%
01.06.001.027	Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	1	1		1	R$ 228,55	R$ 228,55	R$ -	R$ 228,55	R$ 228,55	R$ - 100,00%
01.06.001.028	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc rígido embutido, inclusive aterramento	pt	1	0		0	R$ 365,57	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 365,57	R$ 365,57 0,00%
01.06.001.029	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	10	10		10	R$ 356,99	R$ 3.569,90	R$ -	R$ 3.569,90	R$ 3.569,90	R$ - 100,00%
01.06.001.030	Tomada média de embutir (3 módulos), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	1	0		0	R$ 87,31	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 87,31	R$ 87,31 0,00%
01.06.001.031	Tomada Pezzi BLK 20A 3P, preta da Dutotec ou similar	un	2	0		0	R$ 32,71	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 65,42	R$ 65,42 0,00%
01.06.001.032	Tomada para telefone rj11 - fornecimento e instalação. af_11/2019	un	10	10		10	R$ 30,39	R$ 303,90	R$ -	R$ 303,90	R$ 303,90	R$ - 100,00%
01.06.001.033	Ponto embutido tomada p/ tv a cabo, c/ eletroduto condulete pvc rígido Ø 3/4" s/ fiação, exclusive tomada	un	8	8		8	R$ 201,52	R$ 1.612,16	R$ -	R$ 1.612,16	R$ 1.612,16	R$ - 100,00%
01.06.001.034	Tomada para lógica, com caixa pvc, embutida	un	17	17		17	R$ 60,76	R$ 1.032,92	R$ -	R$ 1.032,92	R$ 1.032,92	R$ - 100,00%
01.06.001.035	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	150	150		150	R$ 26,26	R$ 3.939,00	R$ -	R$ 3.939,00	R$ 3.939,00	R$ - 100,00%
01.06.001.036	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	50	50		50	R$ 7,45	R$ 372,50	R$ -	R$ 372,50	R$ 372,50	R$ - 100,00%
01.06.001.037	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	150	150		150	R$ 23,21	R$ 3.481,50	R$ -	R$ 3.481,50	R$ 3.481,50	R$ - 100,00%
01.06.001.038	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	50	50		50	R$ 5,64	R$ 282,00	R$ -	R$ 282,00	R$ 282,00	R$ - 100,00%
01.07	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**			**0**				**R$ 25.652,96**	**R$ 1.210,56**	**R$ 26.863,52**	**R$ 26.863,52**	R$ 0,00 100,00%
01.07.001	**HIDRAÚLICO**			**0**				**R$ 6.336,50**	**R$ 1.210,56**	**R$ 7.547,06**	**R$ 7.547,06**	R$ - 100,00%
01.07.001.001	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar	un	2	2		2	R$ 99,49	R$ 198,98	R$ -	R$ 198,98	R$ 198,98	R$ - 100,00%
01.07.001.002	Caixa d'água em polietileno, 1000 litros (inclusos tubos, conexões e torneira de bóia) - fornecimento e instalação. af_06/2021	un	2	2		2	R$ 822,79	R$ 1.645,58	R$ -	R$ 1.645,58	R$ 1.645,58	R$ - 100,00%

Jhon Lennon Gomes S.
Eng. Civil CREA - 27218946
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaia

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

SEM EFEITO

REIS CONSTRUÇÕES
CONSTRUINDO COM RESPONSABILIDADE

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO LAGAMAR								CONTRATO	283/2025	BOLETIM DE MEDIÇÃO	PERÍODO	Saldo a Medir	% Medida
								MÊS DE REFERÊNCIA DA PLANILHA:	01/05/2025	08	29/07/26 A 23/09/26		
ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA (após aditivo)	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO	VALORES R$			CONTRATO		
				ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO		ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO			
01.07.001.003	Tubo pvc rígido roscável d = 3/4"	m	30	30		30	R$ 21,95	R$ 658,50	R$ -	**R$ 658,50**	R$ 658,50	R$ -	100,00%
01.07.001.004	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4"	un	25	19	6	25	R$ 201,76	R$ 3.833,44	R$ 1.210,56	**R$ 5.044,00**	R$ 5.044,00	R$ -	100,00%
01.07.002	**SANITÁRIO**			**0**			**R$ -**	**R$ 19.316,46**	**R$ -**	**R$ 19.316,46**	**R$ 19.316,46**	R$ 0,00	100,00%
01.07.002.001	Aterro de valas ou áreas, sem aquisição de material de base, compactado manualmente a 95% do pn, com placa vibratória	m3	7,5	7,5		7,5	R$ 55,02	R$ 412,65	R$ -	**R$ 412,65**	R$ 412,65	R$ -	100,00%
01.07.002.002	Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,38 m,altura interna = 3,0 m, área de infiltração: 25 m² (para 10 contribuintes). af 12/2020	un	1	1		1	R$ 5.103,81	R$ 5.103,81	R$ -	**R$ 5.103,81**	R$ 5.103,81	R$ -	100,00%
01.07.002.003	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 50 pessoas (v=3390 litros)	un	1	1		1	R$ 1.250,40	R$ 1.250,40	R$ -	**R$ 1.250,40**	R$ 1.250,40	R$ -	100,00%
01.07.002.004	Corpo para caixa sifonada em pvc, 5 entradas, 100x140x50mm, modelo girafácil,Tigre ou similar	un	5	5		5	R$ 147,24	R$ 736,20	R$ -	**R$ 736,20**	R$ 736,20	R$ -	100,00%
01.07.002.005	Caixa de gordura em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,10m, dim: 1,00 x 1,00 x 0,60m	un	1	1		1	R$ 760,30	R$ 760,30	R$ -	**R$ 760,30**	R$ 760,30	R$ -	100,00%
01.07.002.006	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	4	4		4	R$ 29,38	R$ 117,52	R$ -	**R$ 117,52**	R$ 117,52	R$ -	100,00%
01.07.002.007	Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	11	11		11	R$ 10,85	R$ 119,35	R$ -	**R$ 119,35**	R$ 119,35	R$ -	100,00%
01.07.002.008	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	5	5		5	R$ 13,30	R$ 66,50	R$ -	**R$ 66,50**	R$ 66,50	R$ -	100,00%
01.07.002.009	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	5	5		5	R$ 28,51	R$ 142,55	R$ -	**R$ 142,55**	R$ 142,55	R$ -	100,00%
01.07.002.010	Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	13	13		13	R$ 19,01	R$ 247,13	R$ -	**R$ 247,13**	R$ 247,13	R$ -	100,00%
01.07.002.011	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 75mm	un	1	1		1	R$ 21,75	R$ 21,75	R$ -	**R$ 21,75**	R$ 21,75	R$ -	100,00%
01.07.002.012	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	5	5		5	R$ 60,62	R$ 303,10	R$ -	**R$ 303,10**	R$ 303,10	R$ -	100,00%
01.07.002.013	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	9	9		9	R$ 52,11	R$ 468,99	R$ -	**R$ 468,99**	R$ 468,99	R$ -	100,00%
01.07.002.014	Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	un	1	1		1	R$ 21,53	R$ 21,53	R$ -	**R$ 21,53**	R$ 21,53	R$ -	100,00%
01.07.002.015	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável,fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	un	1	1		1	R$ 16,57	R$ 16,57	R$ -	**R$ 16,57**	R$ 16,57	R$ -	100,00%
01.07.002.016	Filtro anaeróbio circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,38 m, altura interna = 1,50 m, volume útil: 5338,6 l (para 34 contribuintes). af 12/2020	un	1	1		1	R$ 4.813,11	R$ 4.813,11	R$ -	**R$ 4.813,11**	R$ 4.813,11	R$ -	100,00%
01.07.002.017	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	55	55		55	R$ 41,95	R$ 2.307,25	R$ -	**R$ 2.307,25**	R$ 2.307,25	R$ -	100,00%
01.07.002.018	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	30	30		30	R$ 19,70	R$ 591,00	R$ -	**R$ 591,00**	R$ 591,00	R$ -	100,00%

Jhon Lennon Gomes Santi
Eng. Civil CREA - 272189469
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itaba

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

SEM EFEITO

REIS CONSTRUÇÕES
CONSTRUINDO COM RESPONSABILIDADE

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO LAGAMAR								CONTRATO	283/2025	BOLETIM DE MEDIÇÃO	PERÍODO	Saldo a Medir	% Medida
								MÊS DE REFERÊNCIA DA PLANILHA:	01/05/2025	08	29/07/26 A 23/09/26		
ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA (após aditivo)	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO	VALORES R$			CONTRATO		
				ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO		ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO			
01.07.002.019	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	35	35		35	R$ 24,77	R$ 866,95	R$ -	R$ 866,95	R$ 866,95	R$ -	100,00%
01.07.002.020	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	6	6		6	R$ 158,30	R$ 949,80	R$ -	R$ 949,80	R$ 949,80	R$ 0,00	100,00%
01.08	**MURO E MURETA**			**0**				**R$ 59.183,31**	**R$ -**	**R$ 59.183,31**	**R$ 77.738,19**	R$ 18.554,88	76,13%
01.08.001	**MURO (EXISTENTE)**			**0**				**R$ 1.006,30**	**R$ -**	**R$ 1.006,30**	**R$ 26.092,86**	R$ 25.086,56	3,86%
01.08.001.001	Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras	m2	313,49	313,49		313,49	R$ 3,21	R$ 1.006,30	R$ -	R$ 1.006,30	R$ 1.006,30	R$ -	100,00%
01.08.001.002	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev	m2	242,98	0		0	R$ 52,93	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 12.860,94	R$ 12.860,94	0,00%
01.08.001.003	Demolição de reboco	m2	313,49	313,49		313,49	R$ 9,13	R$ 2.862,16	R$ -	R$ 2.862,16	R$ 2.861,47	-R$ 0,69	100,02%
01.08.001.004	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	283,29	283,29		283,29	R$ 7,51	R$ 2.127,50	R$ -	R$ 2.127,50	R$ 2.127,51	R$ 0,01	100,00%
01.08.001.005	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm	m2	208,30	208,3		208,3	R$ 32,66	R$ 6.803,07	R$ -	R$ 6.803,07	R$ 6.803,64	R$ 0,57	99,99%
01.08.001.006	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m3	16,84	16,84		16,84	R$ 25,71	R$ 433,07	R$ -	R$ 433,07	R$ 433,01	-R$ 0,06	100,02%
01.08.002	**MURETA**			**0**				**R$ 4.601,82**	**R$ -**	**R$ 4.601,82**	**R$ 51.645,33**	R$ 47.043,51	8,91%
01.08.002.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	4,4	4,4		4,4	R$ 64,88	R$ 285,47	R$ -	R$ 285,47	R$ 285,47	R$ -	100,00%
01.08.002.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	5,28	5,28		5,28	R$ 12,96	R$ 68,42	R$ -	R$ 68,42	R$ 68,43	R$ 0,01	99,99%
01.08.002.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	15,84	15,84		15,84	R$ 1,83	R$ 28,98	R$ -	R$ 28,98	R$ 28,99	R$ 0,01	99,97%
01.08.002.004	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	4,4	4,4		4,4	R$ 559,75	R$ 2.462,90	R$ -	R$ 2.462,90	R$ 2.462,90	R$ -	100,00%
01.08.002.005	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 14x19x24cm, e=14cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev 01 07/2024	m2	5,47	5,47		5,47	R$ 54,86	R$ 300,08	R$ -	R$ 300,08	R$ 300,08	R$ 0,00	100,00%
01.08.002.006	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	32,12	32,12		32,12	R$ 7,51	R$ 241,21	R$ -	R$ 241,21	R$ 241,22	R$ 0,01	100,00%
01.08.002.007	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	29,73	29,73		29,73	R$ 40,86	R$ 1.214,76	R$ -	R$ 1.214,76	R$ 1.214,76	R$ 0,00	100,00%
01.08.002.008	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev	m2	32,12	0		0	R$ 52,93	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.700,11	R$ 1.700,11	0,00%
01.08.002.009	Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar	un	1	0		0	R$ 27,68	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 27,68	R$ 27,68	0,00%
01.08.002.010	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta esmalte epoxi (cores diversas), e = 35 micra - R1	m2	161,56	0		0	R$ 24,55	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.966,30	R$ 3.966,30	0,00%

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaia

José Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.
Prefeitura Municipal de Itabaiana

SEM EFEITO

REIS CONSTRUÇÕES
CONSTRUINDO COM RESPONSABILIDADE

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO LAGAMAR								CONTRATO	283/2025	BOLETIM DE MEDIÇÃO	PERÍODO	Saldo a Medir	% Medida
								MÊS DE REFERÊNCIA DA PLANILHA:	01/05/2025	08	29/07/26 A 23/09/26		
ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA (após aditivo)	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO	VALORES R$			CONTRATO		
				ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO		ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO			
01.08.002.011	Grade em ferro, com montantes em perfil "u" de chapa udc 75 x 38 x 2,65 mm (duplo), barra chata de 1 1/4" x 1/4" verticais e barra chata de 1 1/4" x 1/4" horizontais, incluisive ferrolho e	m2	80,78	80,78		80,78	R$ 511,88	R$ 41.349,39		R$ 41.349,39	R$ 41.349,39	-R$ 0,00	100,00%
01.09	**REVESTIMENTOS**			**0**				**R$ 158.633,06**	**R$ 38.679,98**	**R$ 197.313,04**	**R$ 222.635,12**	R$ 25.322,08	88,63%
01.09.001	**PAREDE**			**0**				**R$ 40.626,98**	**R$ 32.159,56**	**R$ 72.786,54**	**R$ 86.424,02**	R$ 13.637,48	84,22%
01.09.001.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	737,97	737,97		737,97	R$ 7,51	R$ 5.542,12	R$ -	R$ 5.542,12	R$ 5.542,15	R$ 0,03	100,00%
01.09.001.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	465,59	465,59		465,59	R$ 37,15	R$ 17.296,55	R$ -	R$ 17.296,55	R$ 17.296,67	R$ 0,12	100,00%
01.09.001.003	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional	m2	272,91	0		0	R$ 49,97	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 13.637,31	R$ 13.637,31	0,00%
01.09.001.004	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 60x60 cm aplicadas na altura inteira das paredes. af_02/2023_pe	m2	521,54	185,74	335,8	521,54	R$ 95,77	R$ 17.788,31	R$ 32.159,56	R$ 49.947,87	R$ 49.947,88	R$ 0,01	100,00%
01.09.002	**TETO**			**0**				**R$ 18.168,59**	**R$ -**	**R$ 18.168,59**	**R$ 18.965,37**	R$ 796,78	95,80%
01.09.002.001	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar. instalado - Ver 06_10/2021	m2	279,94	279,936		279,94	R$ 58,97	R$ 16.507,82	R$ -	R$ 16.507,82	R$ 16.508,06	R$ 0,24	100,00%
01.09.002.002	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015	m2	29,05	29,05		29,05	R$ 14,99	R$ 435,45	R$ -	R$ 435,45	R$ 435,46	R$ 0,01	100,00%
01.09.002.003	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	29,05	29,05		29,05	R$ 42,18	R$ 1.225,32	R$ -	R$ 1.225,32	R$ 1.225,33	R$ 0,01	100,00%
01.09.002.004	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional	m2	15,94	0		0	R$ 49,97	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 796,52	R$ 796,52	0,00%
01.09.003	**PISO**			**0**				**R$ 71.570,35**	**R$ 6.520,42**	**R$ 78.090,77**	**R$ 78.090,32**	-R$ 0,45	100,00%
01.09.003.001	Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023	m3	37,23	37,23		37,23	R$ 94,06	R$ 3.502,03	R$ -	R$ 3.502,03	R$ 3.501,85	-R$ 0,18	100,01%
01.09.003.002	Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 95% do proctor normal	m3	13,85	13,85		13,85	R$ 4,96	R$ 68,70	R$ -	R$ 68,70	R$ 68,70	R$ -	100,00%
01.09.003.003	Lona plástica preta	m2	556,81	556,81		556,81	R$ 6,46	R$ 3.596,97	R$ -	R$ 3.596,97	R$ 3.596,99	R$ 0,02	100,00%
01.09.003.004	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 21mpa	m2	275,41	275,41		275,41	R$ 35,98	R$ 9.909,24	R$ -	R$ 9.909,24	R$ 9.909,25	R$ 0,01	100,00%
01.09.003.005	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	275,41	275,41		275,41	R$ 29,93	R$ 8.242,99	R$ -	R$ 8.242,99	R$ 8.243,02	R$ 0,03	100,00%
01.09.003.006	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m², af_02/2023_pe	m2	52,13	0	R$ 52,13	52,13	R$ 125,08	R$ -	R$ 6.520,42	R$ 6.520,42	R$ 6.520,42	-R$ 0,00	100,00%
01.09.003.007	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	235,95	235,95		235,95	R$ 63,07	R$ 14.881,36	R$ -	R$ 14.881,36	R$ 14.881,36	R$ 0,00	100,00%
01.09.003.008	Piso alta resistencia, colorido, e=15mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrização	m2	223,28	223,28		223,28	R$ 89,47	R$ 19.976,86	R$ -	R$ 19.976,86	R$ 19.976,86	-R$ 0,00	100,00%

Jhon Lennon Gomes
Eng. Civil CREA - 272189
Coordenador de Núcl
Prefeitura Municipal

José Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 272031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng. Civil CREA - 272189
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

SEM EFEITO

REIS CONSTRUÇÕES
CONSTRUINDO COM RESPONSABILIDADE

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO LAGAMAR								CONTRATO	283/2025	BOLETIM DE MEDIÇÃO	PERÍODO	Saldo a Medir	% Medida
								MÊS DE REFERÊNCIA DA PLANILHA:	01/05/2025	08	29/07/26 A 23/09/26		
ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA (após aditivo)	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO	VALORES R$			CONTRATO		
				ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO		ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO			
01.09.003.009	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação	m3	31,16	31,16		31,16	R$ 54,93	R$ 1.711,61	R$ -	R$ 1.711,61	R$ 1.711,76	R$ 0,15	99,99%
01.09.003.010	Rodapé alta resistência, h = 15 cm, meia-cana	m	213,19	213,19		213,19	R$ 33,83	R$ 7.212,21	R$ -	R$ 7.212,21	R$ 7.211,60	-R$ 0,61	100,01%
01.09.003.011	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	45,45	45,45		45,45	R$ 54,31	R$ 2.468,38	R$ -	R$ 2.468,38	R$ 2.468,52	R$ 0,14	99,99%
01.09.004	**FACHADA**			**0**				**R$ 17.553,02**	**R$ -**	**R$ 17.553,02**	**R$ 39.155,41**	R$ 21.602,39	44,83%
01.09.004.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	231,11	231,11		231,11	R$ 7,51	R$ 1.735,62	R$ -	R$ 1.735,62	R$ 1.735,64	R$ 0,02	100,00%
01.09.004.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	205,71	205,71		205,71	R$ 40,86	R$ 8.405,29	R$ -	R$ 8.405,29	R$ 8.405,31	R$ 0,02	100,00%
01.09.004.003	Revestimento de parede com pedra natural ouro pálido, aplicada com argamassa industrializada ac-ii	m2	43,29	43,29		43,29	R$ 171,22	R$ 7.412,11	R$ -	R$ 7.412,11	R$ 7.412,11	R$ -	100,00%
01.09.004.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev	m2	205,71	0		0	R$ 52,93	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10.888,23	R$ 10.888,23	0,00%
01.09.004.005	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	5,52	5,52		5,52	R$ 1.845,79	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10.188,76	R$ 10.188,76	0,00%
01.09.004.006	Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m3	0,93	0,93		0,93	R$ 564,91	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 525,36	R$ 525,36	0,00%
01.10	**ESQUADRIAS E VIDRO**			**0**				**R$ 9.193,47**	**R$ 30.422,64**	**R$ 39.616,11**	**R$ 39.616,15**	R$ 0,04	100,00%
01.10.001	**ESQUADRIAS**			**0**				**R$ 9.193,47**	**R$ 24.813,71**	**R$ 34.007,18**	**R$ 34.007,22**	R$ 0,04	100,00%
01.10.001.002	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr,completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	5,04	5,04		5,04	R$ 304,12	R$ 1.532,76	R$ -	R$ 1.532,76	R$ 1.532,76	R$ -	100,00%
01.10.001.003	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradicas, montagem e instalação do batente.	un	7	0	7	7	R$ 973,18	R$ -	R$ 6.812,26	R$ 6.812,26	R$ 6.812,26	R$ -	100,00%
01.10.001.004	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradicas, montagem e instalação do batente.	un	9	0	9	9	R$ 1.052,93	R$ -	R$ 9.476,37	R$ 9.476,37	R$ 9.476,37	R$ -	100,00%
01.10.001.005	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro	m2	21,55	21,55		21,55	R$ 339,02	R$ 7.305,87	R$ -	R$ 7.305,87	R$ 7.305,88	R$ 0,01	100,00%
01.10.001.006	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 40 x 40cm	m2	2,19	2,19		2,19	R$ 162,03	R$ 354,84	R$ -	R$ 354,84	R$ 354,84	R$ 0,00	100,00%
01.10.001.007	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/202	m2	11,7	0	11,7	11,7	R$ 686,19	R$ -	R$ 8.028,42	R$ 8.028,42	R$ 8.028,45	R$ 0,03	100,00%
01.10.001.008	Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", l= 40cm, ref. 3008, da Vesfer ou similar	m	2	0	2	2	R$ 248,33	R$ -	R$ 496,66	R$ 496,66	R$ 496,65	-R$ 0,01	100,00%
01.10.002	**VIDRO**			**0**		**0**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 5.608,93**	**R$ 5.608,93**	**R$ 5.608,93**	R$ 0,00	100,00%
01.10.002.001	Vidro liso incolor 8mm - Rev 01_10/2021	m2	19,4	0	19,4	19,4	R$ 289,12	R$ -	R$ 5.608,93	R$ 5.608,93	R$ 5.608,93	R$ 0,00	100,00%

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 272189469-2
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 272103189-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng. Civil
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

SEM EFEITO

REIS CONSTRUÇÕES
CONSTRUINDO COM RESPONSABILIDADE

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO LAGAMAR								CONTRATO	283/2025	BOLETIM DE MEDIÇÃO	PERÍODO	Saldo a Medir	% Medida
								MÊS DE REFERÊNCIA DA PLANILHA:	01/05/2025	08	29/07/26 A 23/09/26		
ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA (após aditivo)	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO	VALORES R$			CONTRATO		
				ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO		ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO			
01.11	**LOUÇAS E METAIS**			**0**			**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 31.007,35**	R$ 31.007,35	0,00%
01.11.001	**LOUÇAS E METAIS**			**0**			**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 31.007,35**	R$ 31.007,35	0,00%
01.11.001.001	Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão PVC	un	2	0		0	R$ 697,73	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.395,46	R$ 1.395,46	0,00%
01.11.001.002	Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40	un	8	0		0	R$ 741,05	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.928,40	R$ 5.928,40	0,00%
01.11.001.003	Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico -	un	5	0		0	R$ 449,14	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.245,70	R$ 2.245,70	0,00%
01.11.001.004	Barra de apoio reta, em aluminio, comprimento 90 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	4	0		0	R$ 241,45	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 965,80	R$ 965,80	0,00%
01.11.001.005	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar	un	5	0		0	R$ 374,39	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.871,95	R$ 1.871,95	0,00%
01.11.001.006	Bancada em granito branco polar, largura 57cm, e= 2cm, para pia ou lavatório	m	4,75	0		0	R$ 757,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.598,41	R$ 3.598,41	0,00%
01.11.001.007	Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas simples, concretada, acabamento liso e polido, assentada com argamassa traco T-1(1:3), exclusive cuba, sifão, válvula e	m	13,79	0		0	R$ 1.005,78	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 13.869,71	R$ 13.869,71	0,00%
01.11.001.008	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) com coluna, c/ sifão plástico,válvula plástica, engate PVC e torneira plastica ou similares	un	4	0		0	R$ 282,98	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.131,92	R$ 1.131,92	0,00%
01.12	**PAISAGISMO**			**0**			**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 6.675,93**	R$ 6.675,93	0,00%
01.12.001	**GRAMA**			**0**				**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 6.675,93**	R$ 6.675,93	0,00%
01.12.001.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	225,31	0		0	R$ 29,63	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.675,93	R$ 6.675,93	0,00%
01.13	**DIVERSOS**			**0**			**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 5.632,69**	R$ 5.632,69	0,00%
01.13.001	**DIVERSOS**			**0**				**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 5.632,69**	R$ 5.632,69	0,00%
01.13.001.001	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1	0		0	R$ 1.850,78	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.850,78	R$ 1.850,78	0,00%
01.13.001.002	Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em calçada nova com largura menor à 3,00 m, fck 25mpa, com piso podotátil, af_03/2024	m2	4,9	0		0	R$ 130,83	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 641,07	R$ 641,07	0,00%
01.13.001.003	Letra em PVC expandido, inclusive instalação	un	25	0		0	R$ 31,59	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 789,75	R$ 789,75	0,00%
01.13.001.004	Pintura de demarcação de vaga com tinta acrílica, e = 10 cm, aplicação manual. af_05/2021	m	22,42	0		0	R$ 5,34	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 119,72	R$ 119,72	0,00%
01.13.001.005	Limpeza geral	m2	814,37	0		0	R$ 2,74	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.231,37	R$ 2.231,37	0,00%
01.14	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**			**0**			**R$ -**	**R$ 19.207,93**	**R$ 2.592,46**	**R$ 21.800,39**	**R$ 25.194,12**	R$ 3.393,73	86,53%

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 172189469
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

SEM EFEITO

Prefeitura Municipal de Itabaiana

REIS CONSTRUÇÕES CONSTRUINDO COM RESPONSABILIDADE	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO LAGAMAR							CONTRATO	283/2025	BOLETIM DE MEDIÇÃO	PERÍODO	Saldo a Medir	% Medida
								MÊS DE REFERÊNCIA DA PLANILHA:	01/05/2025	08	29/07/26 A 23/09/26		
ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANTIDADE CONTRATADA (após aditivo)	QUANTIDADES			PREÇO UNITÁRIO	VALORES R$			CONTRATO		
				ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO		ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO			
01.14.001	**EQUIPE DIRIGENTES**			**0**				**R$ 19.207,93**	**R$ 2.592,46**	**R$ 21.800,39**	**R$ 25.194,12**	R$ 3.393,73	86,53%
01.14.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	84	64,04	**8,64**	72,69	R$ 148,13	R$ 9.486,45	R$ 1.280,37	**R$ 10.766,82**	R$ 12.442,92	R$ 1.676,10	86,53%
01.14.001.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	168	128,08	**17,29**	145,37	R$ 75,90	R$ 9.721,48	R$ 1.312,09	**R$ 11.033,57**	R$ 12.751,20	R$ 1.717,63	86,53%
							VALORES	**R$ 511.927,10**	**R$ 72.984,69**	**R$ 584.911,79**	**R$ 683.887,41**	R$ 98.975,62	85,53%
										VALOR DA MEDIÇÃO R$	**R$ 72.984,69**		
										PERCENTUAL DA MEDIÇÃO %	**10,67%**		
										VALOR ACUMULADO R$	**R$ 584.911,79**		
										PERCENTUAL ACUMULADO %	**85,53%**		
										SALDO R$	**R$ 98.975,62**		
										PERCENTUAL DO SALDO %	**14,47%**		

Documento assinado digitalmente
gov.br
IVANISE SANTOS NASCIMENTO
Data: 06/10/2026 07:08:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

OBSERVAÇÕES

CONTRATADA: REIS CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 36.178.439/0001-56

FISCALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rízia Milena S. Rodrigues Araújo
Eng. Civil CREA - [illegible]
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

SEM EFEITO

REIS CONSTRUÇÕES
CONSTRUINDO COM RESPONSABILIDADE

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO LAGAMAR

MEMORIAL DE CÁLCULO - 08

PERÍODO 29/07/2026 A 23/09/2026

ITEM	SERVIÇOS	UND.	Equação	Quantidade
1	**Unidade de Saúde - Pov. Lagamar**			
01.06	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**			
01.06.001	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**			
01.06.001.019	Luminária arandela tipo meia lua, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_09/2024	un	1	**1**
01.07	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**			
01.07.001	**HIDRAÚLICO**			
01.07.001.004	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4"	un	1+1+1+1+1+1	**6**
01.09	**REVESTIMENTOS**			
01.09.001	**PAREDE**			
01.09.001.004	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 60x60 cm aplicadas na altura inteira das paredes. af_02/2023_pe	m2	85,45 x 3 + 176,79 * 1,5 - 185,74	**335,8**
01.09.003	**PISO**			
01.09.003.006	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². af_02/2023_pe	m2	4,64+4,58+13,78+6,47+3,48+3,48+4,34 +11,36	**52,13**
01.10	**ESQUADRIAS E VIDRO**			
01.10.001	**ESQUADRIAS**			
01.10.001.003	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	un	1+1+1+1+1+1+1	**7**
01.10.001.004	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	un	1+1+1+1+1+1+1+1+1	**9**

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

01.10.001.007	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/202	m2	11,7	**11,7**
01.10.001.008	Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", l= 40cm, ref. 3008, da Vesfer ou similar	un	1+1	**2**
01.10.002	**VIDRO**			
01.10.002.001	Vidro liso incolor 8mm - Rev 01_10/2021	m2	19,4	**19,4**
01.14	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**			
01.14.001	**EQUIPE DIRIGENTES**			
01.14.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	84 *10,29/100	**8,64**
01.14.001.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	168 *10,29/100	**17,29**

gov.br
Documento assinado digitalmente
IVANISE SANTOS NASCIMENTO
Data: 09/10/2026 13:16:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATADA: REIS CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 36.178.439/0001-56

FISCALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

Jose Arnaldo de N Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

REIS CONSTRUÇÕES
CONSTRUINDO COM RESPONSABILIDADE

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - POVOADO LAGAMAR

PERÍODO: 29/07/2026 A 23/09/2026

CONTRATO: 283/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – RF 08

01.09.001.004 – Revestimento Cerâmico p/ parede



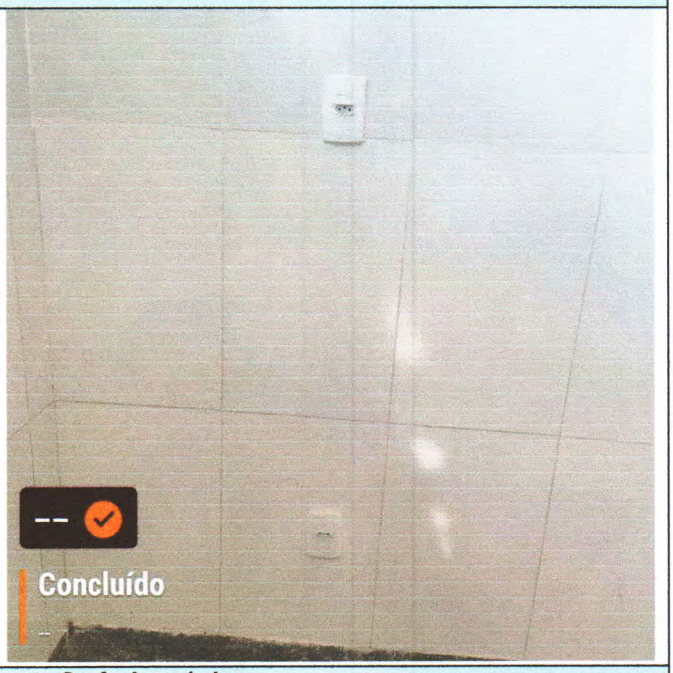

01.09.003.006 – Revestimento Cerâmico p/ piso

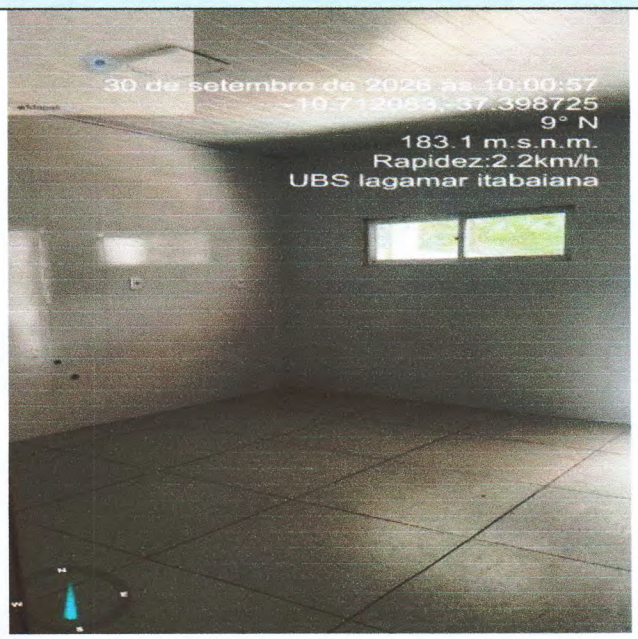



Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng. Civil CREA - 2721[illegible]
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

SEM EFEITO

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

REIS CONSTRUÇÕES
CONSTRUINDO COM RESPONSABILIDADE

01.07.001.004 – Ponto de água fria	
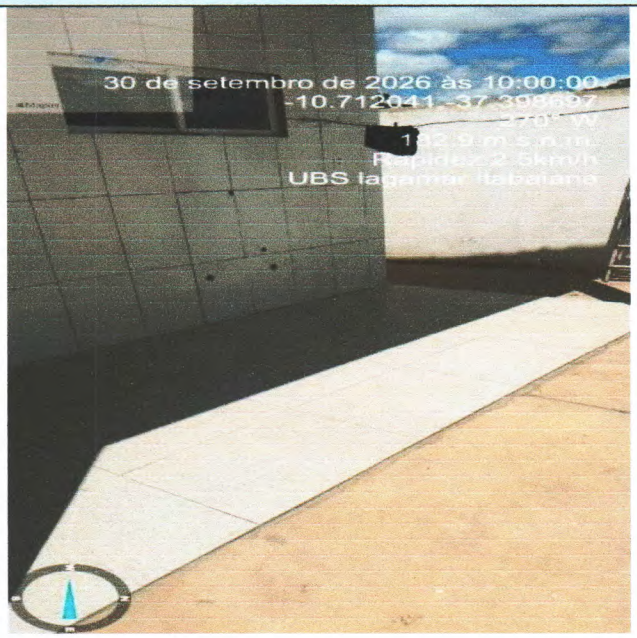	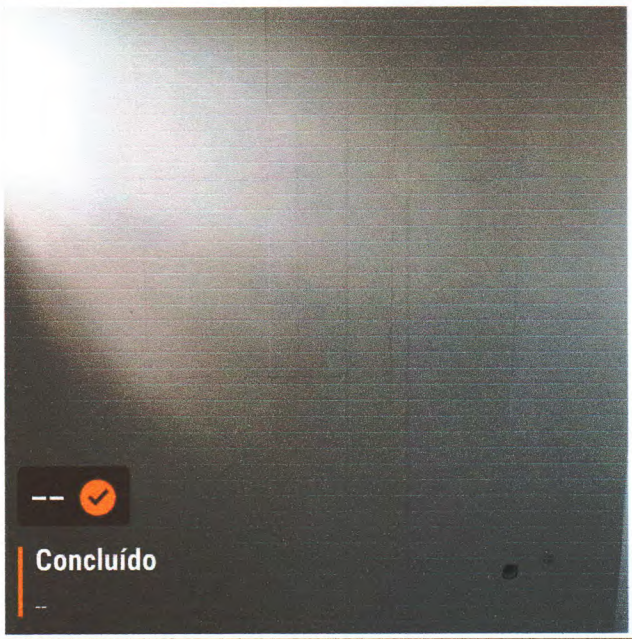
01.06.001.019 - Luminária arandela	
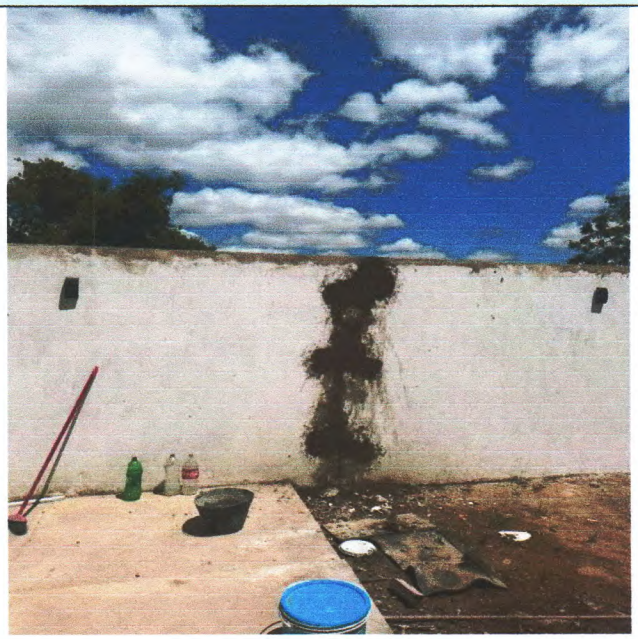	

Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

SEM EFEITO

Jhon Lennon Gomes
Eng. Civil CREA - 272189...
Coordenador de Núcle...
Prefeitura Municipal d...

José Arnaldo N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

REIS CONSTRUÇÕES
CONSTRUINDO COM RESPONSABILIDADE

01.10.001.003 - Kit de porta de madeira para pintura 80 x 210	
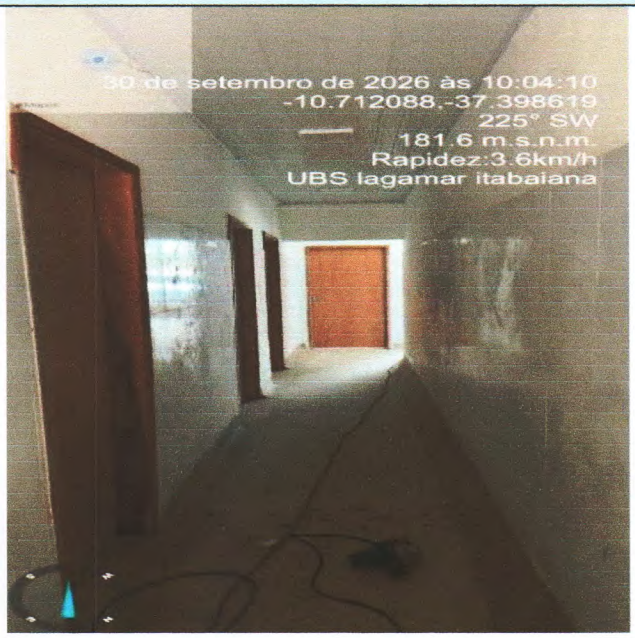	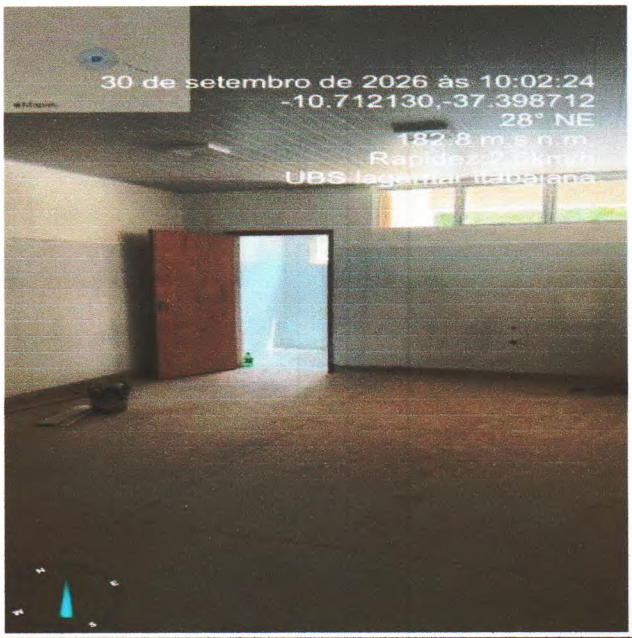
01.10.001.004 - Kit de porta de madeira para pintura 90 x 210	
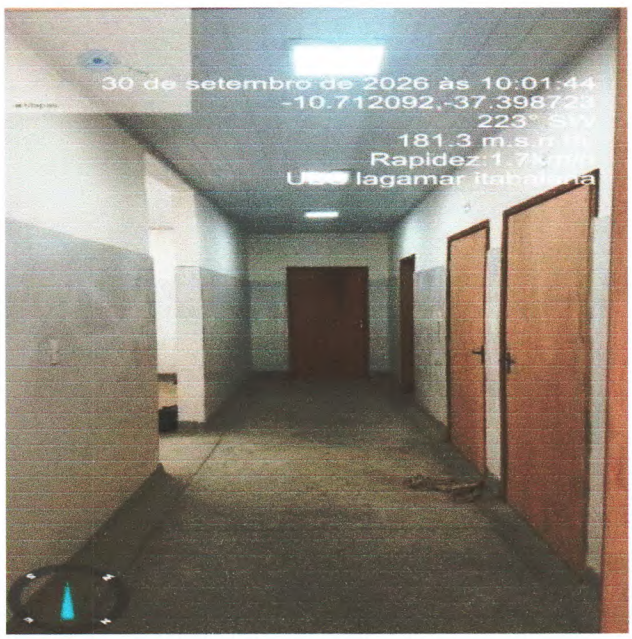	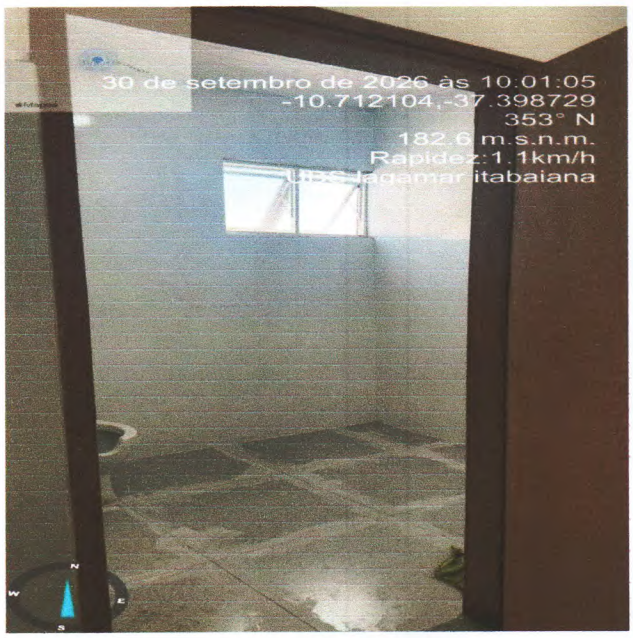

SEMFETUR
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

REIS CONSTRUÇÕES
CONSTRUINDO COM RESPONSABILIDADE

01.10.001.007 - Porta em vidro temperado 10mm, incolor





01.10.002.001 - Vidro liso incolor 8mm





Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng. Civil CREA - 27[illegible]
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

SEM EFEITO

Jhon Lennon Gomes San[illegible]
Eng. Civil CREA - 27218946[illegible]
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de [illegible]

José Arnaldo de N. Pereira Júnior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

REIS CONSTRUÇÕES
CONSTRUINDO COM RESPONSABILIDADE

01.10.001.008 - Puxador duplo para porta	
	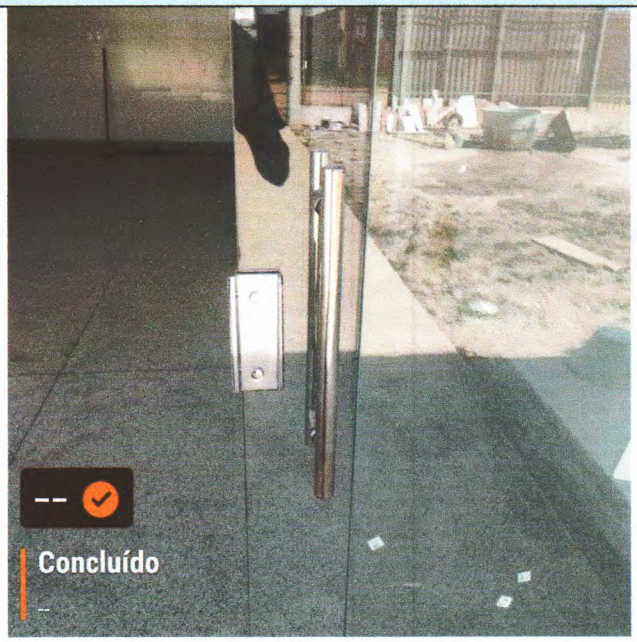

Aracaju-SE, 23 de setembro de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br
IVANISE SANTOS NASCIMENTO
Data: 06/10/2026 07:09:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

IVANISE SANTOS NASCIMMENTO
ENG° CIVIL
CREA 270015911-0

José Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng. Civil CREA - 2721[illegible]
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

SEM EFEITO

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana
