EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA NO BAIRRO OVIEDO TEIXEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.		BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 DO ADITIVO	NOVATEC
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA		PERÍODO: 06/02/2026 A 09/02/2026	CONTRATO 336/25
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA		DATA DE MEDIÇÃO: 10/02/2026	

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA								R$ 59.340,43		R$ 59.340,43	R$ 59.340,43	R$ -	100,00
01.01	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	744,10	-	744,10	744,10	0,00	21,25	R$ 15.809,91	R$ -	R$ 15.809,91	R$ 15.809,91	R$ -	100,00
01.02	Recomposição de base e ou sub-base para remendo profundo de solo brita (40/60) com cimento (teor de 6%) - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020	m²	57,60	-	57,60	57,60	0,00	325,34	R$ 18.739,17	R$ -	R$ 18.739,17	R$ 18.739,17	R$ -	100,00
01.03	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	m²	99,80	-	99,80	99,80	0,00	2,30	R$ 229,54	R$ -	R$ 229,54	R$ 229,54	R$ -	100,00
01.04	transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	m³	47,62	-	47,62	47,62	0,00	0,91	R$ 43,33	R$ -	R$ 43,33	R$ 43,33	R$ -	100,00
01.05	Imprimação - execução com fornecimento de material	m³xkm	1935,86	-	1.935,86	1935,86	0,00	12,67	R$ 24.518,48	R$ -	R$ 24.518,48	R$ 24.518,48	R$ -	100,00
TOTAL DO ORÇAMENTO									R$ 59.340,43	R$ -	R$ 59.340,43	R$ 59.340,43	R$ -	100,00%
										0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	

ASSINATURA RESPONSÁVEL TÉCNICO

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.02.10 07:40:29 -03'00'

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

VALOR DA MEDIÇÃO: 59.340,43 (cinquenta e nove mil trezentos e quarenta reais e quarenta e três centavos).

DATA LIBERAÇÃO : _____/_____/_____

Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA NO BAIRRO OVIEDO TEIXEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 336/25
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 06/02/2026 A 09/02/2026
DATA DE MEDIÇÃO: 10/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇAO DO CALCULO	UND		AREA
1	RECAPEAMENTO ASFALTICO - RUA FRANCISCO ANTONIO DE LIMA			
01.01	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	Área (m²)	espessura (m)	volume (m³)
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA				
		1.935,86	0,38	744,10
EXECUTADO NO PERÍODO:				744,10
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				744,10
SALDO DO CONTRATO:				0,00
ADITIVO:				744,10

Kizia Mulene S. Rodrigues Araújo
Engª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA NO BAIRRO OVIEDO TEIXEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 336/25
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 06/02/2026 A 09/02/2026
DATA DE MEDIÇÃO: 10/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇAO DO CALCULO	UND		AREA
1	RECAPEAMENTO ASFALTICO - RUA FRANCISCO ANTONIO DE LIMA			
01.02	Recomposição de base e ou sub-base para remendo profundo de solo brita (40/60) com cimento (teor de 6%) - incluso retirada e coloc ação do material af_12/2020	Área (m²)	espessura (m)	volume (m³)
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA				
		149,85	0,38438	57,60
EXECUTADO NO PERÍODO:				57,60
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				57,60
SALDO DO CONTRATO:				0,00
ADITIVO:				57,60

José Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizia Helene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA NO BAIRRO OVIEDO TEIXEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 336/25
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 06/02/2026 A 09/02/2026
DATA DE MEDIÇÃO: 10/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND			
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA				
01.03	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltic o de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	Área (m²)	taxa	DMT	txkm
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA					
PINTURA DE LIGAÇÃO		1.935,86	0,0004185	30,0	24,30
IMPRIMAÇÃO		1.935,86	0,0013	30,00	75,50
EXECUTADO NO PERÍODO:					**99,80**
ACUMULADO ANTERIOR:					**0,00**
ACUMULADO ATUAL:					**99,80**
SALDO DO CONTRATO:					**0,00**
ADITIVO:					**99,80**

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA NO BAIRRO OVIEDO TEIXEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 336/25
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 06/02/2026 A 09/02/2026
DATA DE MEDIÇÃO: 10/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND			
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA				
01.04	transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	Área (m²)	taxa	DMT	txkm
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA					
PINTURA DE LIGAÇÃO		1.935,86	0,0004185	15,8	7,86
IMPRIMAÇÃO		1.935,86	0,0013	15,8	39,76
EXECUTADO NO PERÍODO:					47,62
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					47,62
SALDO DO CONTRATO:					0,00
ADITIVO:					47,62

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rízia Milene S. [illegible] Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA NO BAIRRO OVIEDO TEIXEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 336/2025
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
PERÍODO: 06/02/2026 A 09/02/2026
DATA DE MEDIÇÃO: 10/02/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA		
01.05	Imprimação - execução com fornecimento de material	m²	ÁREA
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA			
		1.935,86	1935,86
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	1.935,86
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			1.935,86
SALDO DO CONTRATO			0,00
ADITIVO:			1.935,86

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.02.11 13:51:27 -03'00'

Rizia Mirene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBJETO: EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA NO BAIRRO OVIEDO TEIXEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

LOCAL DA OBRA: RUA FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA - ITABAIANA-SE

CONTRATO: 336/2025

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

MEDIÇÃO 01 DO ADITIVO

Período: 06/02/2026 a 09/02/2026

	Data da medição:10/02/2026	
ITEM	**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**	

FOTO 01- RUA FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA

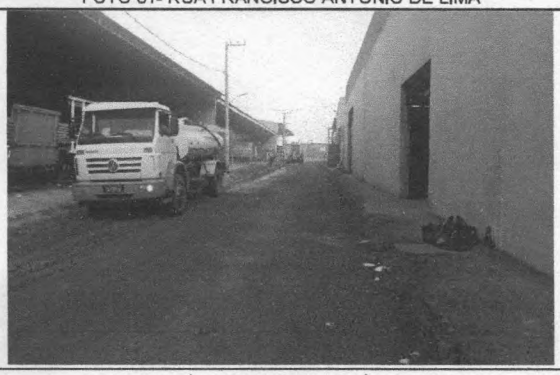

FOTO 02- RUA FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA

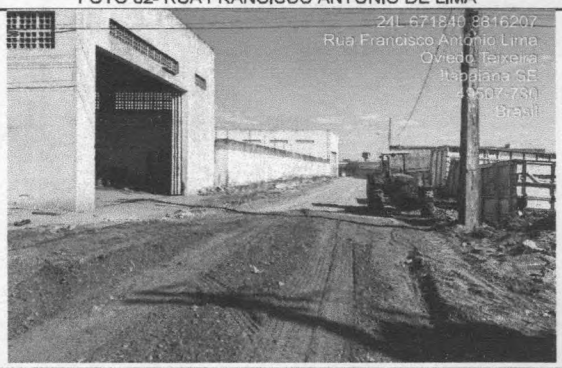

FOTO 03- RUA FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA

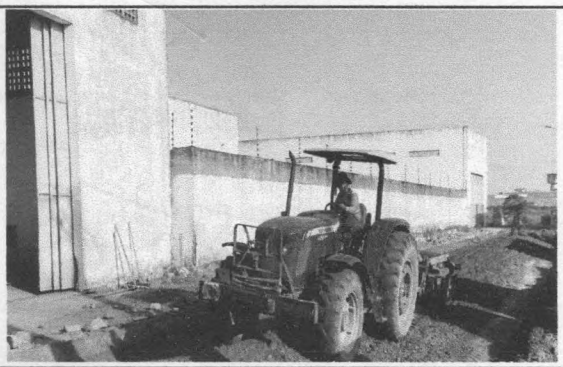

FOTO 04- RUA FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA

FOTO 05- RUA FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA

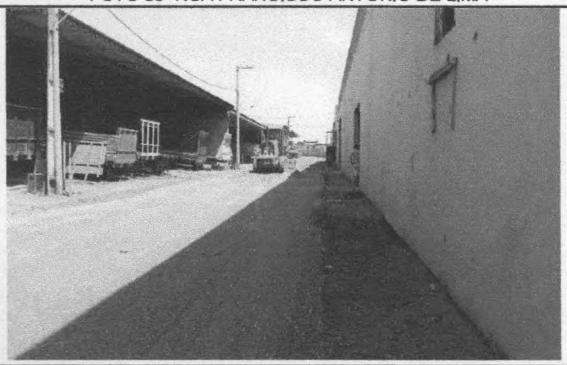

FOTO 06- RUA FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA

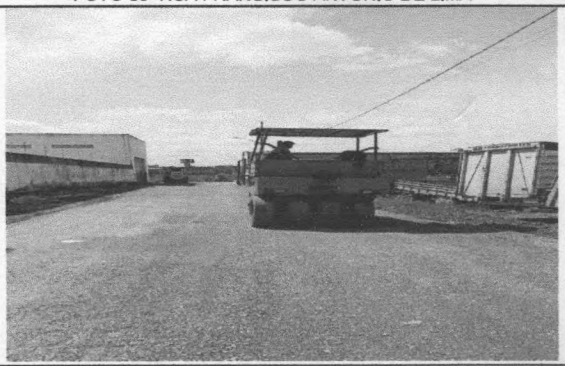

José Arnaldo de N. Barbosa Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

FOTO 07- RUA FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA

FOTO 08- RUA FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA

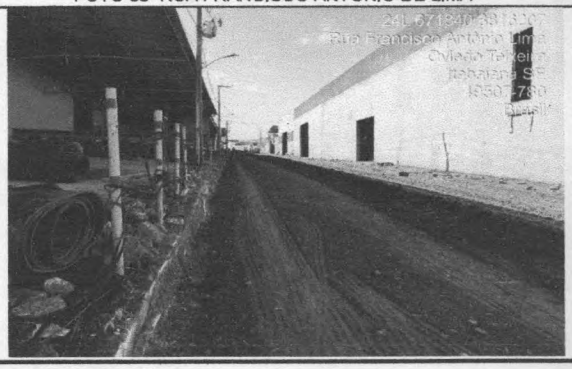

Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.02.11 13:51:47 -03'00'
