



Boletim de Medição: 04  
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024  
Data de medição: 01/08/2024

CONTRATO: 153/2023  
VICÍNIA: 08/2023 a 04/2024  
EXECUÇÃO: 09/2023 a 02/2024

RA-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O CAPAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, ITABAIANA/SE  
NTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.  
retaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Table with columns: Item, Descrição dos Serviços, Unid., Contratada, Acumulado Anterior, Do Período, Acumulado até o Período, Saldo a Medir, Preço Unitário (R\$), Contratada, Acumulado Anterior, Do Período, Acumulado até o Período, Saldo a Medir, % Medido. Rows include items 1.1 to 1.2.2.1.8 detailing asphalt paving and maintenance work.







Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)																
2.11.1	RUA MARIA TAVARES DA COSTA																			
2.11.1.1	Fragagem de pavimento asfáltico (profundidade até 5,0 cm) - excludive transporte. af_11/2019	m2	2.890,000	2.813,000	77,000	R\$ 3,01	R\$ 8.698,90	R\$ 8.467,13	R\$ 231,77	R\$ 8.467,13	R\$ 231,77	R\$ 99,85								
2.11.1.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm) af_07/2020	tkm	520,200	506,340	13,860	R\$ 0,57	R\$ 296,51	R\$ 288,61	R\$ 7,89	R\$ 288,61	R\$ 7,89	R\$ 97,34								
2.11.1.3	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive de rolamento - excludive carga e transporte. af_11/2019	m2	2.890,000	2.813,000	77,000	R\$ 0,97	R\$ 2.803,30	R\$ 2.778,61	R\$ 24,69	R\$ 2.778,61	R\$ 24,69	R\$ 97,34								
2.11.4	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - excludive carga e transporte. af_11/2019	m3	144,500	144,500	-	R\$ 1,651,66	R\$ 238.664,87	R\$ 232.305,98	R\$ 6.358,89	R\$ 238.664,87	R\$ 6.358,89	R\$ 100,00								
2.11.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkm) af_07/2020	tkm	10.404,000	10.126,800	-	R\$ 0,57	R\$ 5.930,28	R\$ 5.772,28	R\$ 158,00	R\$ 5.930,28	R\$ 158,00	R\$ 100,00								
2.11.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: tkm) af_07/2020	tkm	6.996,000	6.751,200	-	R\$ 0,20	R\$ 1.387,20	R\$ 1.350,24	R\$ 36,96	R\$ 1.387,20	R\$ 36,96	R\$ 100,00								
2.11.7	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-estere para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	86,700	86,700	-	R\$ 4,25	R\$ 368,48	R\$ -	R\$ 368,48	R\$ 368,48	R\$ 368,48	R\$ 100,00								
2.11.8	Limpeza geral	m2	2.890,000	2.813,000	77,000	R\$ 0,85	R\$ 2.456,50	R\$ -	R\$ 2.391,05	R\$ 2.391,05	R\$ 65,44	R\$ 97,34								
1.3	SERVIÇOS DIVERSOS																			
3.1	Pintura de piso para execução de faixa de pedestres, com 02 demãos de tinta à base de resina acrílica - R1	m2	1.581,800	1.581,800	-	R\$ 13,87	R\$ 21.939,57	R\$ 15.481,80	R\$ 21.939,57	R\$ 21.939,57	R\$ 21.939,57	R\$ 100,00								
3.2	Ensaio - Marshall	un	110,000	108,000	-	R\$ 143,35	R\$ 15.768,50	R\$ 15.481,80	R\$ 286,70	R\$ 15.768,50	R\$ 286,70	R\$ 100,00								
1.4	EQUIPE DIRIGENTE																			
4.1	Mestre de obras com encargos complementares	h	880,000	880,000	-	R\$ 68,34	R\$ 60.139,20	R\$ 40.183,92	R\$ 19.955,28	R\$ 60.139,20	R\$ 19.955,28	R\$ 100,00								
4.2	Engenheiro civil de obra (junior com encargos complementares)	h	880,000	880,000	-	R\$ 124,15	R\$ 109.252,00	R\$ 73.000,20	R\$ 36.251,80	R\$ 109.252,00	R\$ 36.251,80	R\$ 100,00								
<b>VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO</b>											<b>96,00%</b>	<b>3.110.976,800</b>	<b>3.110.976,800</b>	<b>3,72%</b>	<b>120.227,81</b>	<b>3.231.204,65</b>	<b>0,00%</b>	<b>3.231.204,65</b>	<b>0,01%</b>	<b>99,99</b>
<b>PERCENTUAL</b>											<b>100%</b>	<b>96,00%</b>	<b>3,72%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,01%</b>	<b>99,99</b>				

Documento assinado digitalmente  
 YAN HENRIQUE TAVARES SANTANA  
 Data: 17/09/2024 10:24:49-0300  
 Verifique em <https://validar.tri.gov.br>



Documento assinado digitalmente  
 JOSE ROBSON SANTOS DA PAIXAO  
 Data: 17/09/2024 10:38:51-0300  
 Verifique em <https://validar.tri.gov.br>



Assinado digitalmente por ALEXANDRE  
 ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla  
 OU=Certificado PF A1, CN=ALEXANDRE  
 ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2024-09-17 09:37:24  
 Font: Render Versão: 9.5.0

ALEXANDRE  
 ALBUQUERQUE  
 TEIXEIRA:  
 3019200415  
 ENHEIRO - NOVATEC

FISCAL

1.00042





1.00075

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, , ITABAIANA/SE



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS  
 EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

MATERIAIS:	1.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO
ITEM:	1.2.1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PARALELEPÍPEDO
ITEM:	1.2.1.1	RUA RENATO BISPO DE LIMA
ITEM:	1.2.1.1.6	Limpeza geral

Serviço			UNID.	QUANT.
			m2	Total
Limpeza geral	EXTENSÃO	LARGURA	ÁREA	TOTAL
	36,00	3,60	129,6	
	105,50	11,00	1160,5	
	36,00	7,80	280,8	
	20,00	11,40	228	
	50,00	11,30	565	
	63,00	11,30	711,9	
	5,53	3,20	17,696	
				3093,50

EXECUTADO NO PERÍODO:	m2	3.093,500
ACUMULADO ANTERIOR:	m2	-
ACUMULADO ATUAL:	m2	3.093,500
SALDO DO CONTRATO:	m2	-
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):	m2	-
À MEDIR NO PERÍODO:	m2	3.093,500

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE  
 CONTRATO: 153/2023

CÁLCULO EXPLICATIVO































CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, ITABAIANA/SE



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

MATERIAIS:	1.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO
ITEM:	1.2.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. ASFÁLTICA
ITEM:	1.2.2.8	RUA CONSTRUTOR ANTONIO FERREIRA SANTANA
ITEM:	1.2.2.8.8	Limpeza geral

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		m2	Total
Limpeza geral	ÁREA			
	EXTENSÃO	LARGURA	ÁREA	TOTAL
	70,000	3,00	210	
	109,00	6,00	654	
	291,57	5,95	1734,842	
	144,10	3,55	511,555	
				3110,40
EXECUTADO NO PERÍODO:			m2	3.110,400
ACUMULADO ANTERIOR:			m2	
ACUMULADO ATUAL:			m2	3.110,400
SALDO DO CONTRATO:			m2	
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			m2	
A MEDIR NO PERÍODO:			m2	3.110,400

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 153/2023	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	---------------------

ALEXANDRE  
ALBUQUERQUE  
TEIXEIRA:

Assinado eletronicamente por ALEXANDRE  
ALBUQUERQUE TEIXEIRA 83019200415  
DN: C=BR, O=CPROBANE, OU=AG SOLUTI Multa  
vs. OUA8702921000143, OU=Videoconferencia,  
OU=Certificacao PF A1, CN=ALEXANDRE  
ALBUQUERQUE TEIXEIRA 83019200415  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui







CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
 OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O  
 CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, , ITABAIANA/SE



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS  
 EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

MATERIAIS:	1.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO
ITEM:	1.2.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. ASFÁLTICA
ITEM:	1.2.2.10	TRAVESSA WILLIAM FONSECA DE JESUS
ITEM:	1.2.2.10.8	Limpeza geral

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		m2	Total
Limpeza geral	EXTENSÃO	LARGURA	ÁREA	TOTAL
	49,00	4,25	208,25	
	45,00	5,60	252	
	25,00	5,60	140	
	50,00	7,10	355	
	30,00	5,40	162	
	30,00	4,25	127,5	
	36,00	4,30	154,8	
				1399,55
EXECUTADO NO PERÍODO:			m2	1.399,550
ACUMULADO ANTERIOR:			m2	-
ACUMULADO ATUAL:			m2	1.399,550
SALDO DO CONTRATO:			m2	0,250
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			m2	
À MEDIR NO PERÍODO:			m2	1.399,550

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE  
 CONTRATO: 153/2023

CÁLCULO EXPLICATIVO

1.00060

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, , ITABAIANA/SE



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos  
EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

MATERIAIS:	1.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO
ITEM:	1.2.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. ASFÁLTICA
ITEM:	1.2.2.11	RUA MARIA TAVARES DA COSTA
ITEM:	1.2.2.11.4	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019

Serviço	VALORES			UNID.	QUANT.
	Quantidade			m3	Total
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	EXTENSÃO	LARGURA	ÁREA	ESP.	
	290,000	9,70	2813,00	0,05	140,650
	290,000	9,70	2813,00	0,0015	4,220
EXECUTADO ATÉ O PERÍODO:				m3	144,870
ACUMULADO ANTERIOR:				m3	140,650
ACUMULADO ATUAL:				m3	144,870
SALDO DO CONTRATO:				m3	144,500
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):				m3	0,370
A MEDIR NO PERÍODO:				m3	3,850

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE CONTRATO: 153/2023	CÁLCULO EXPLICATIVO
--	---------------------

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA;  
Assinado eletronicamente por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA (3301920415)  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLLUTI Multipla vs. O=36702921000143,  
OU=Videconferencia, OU=Certificados PF A1,  
CN=ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA,  
3301920415  
#x509: Equivale ao qual deste documento







1.00070

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, ITABAIANA/SE



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS  
 EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda

MATERIAIS:	1.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO
ITEM:	1.2.2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. ASFÁLTICA
ITEM:	1.2.2.11	RUA MARIA TAVARES DA COSTA
ITEM:	1.2.2.11.8	Limpeza geral

Serviço	VALORES		UNID.	QUANT.
	Quantidade		m2	Total
Limpeza geral	EXTENSÃO	LARGURA	ÁREA	TOTAL
	290,000	9,70	2813	
				2813,00
EXECUTADO NO PERÍODO:			m2	2.813,000
ACUMULADO ANTERIOR:			m2	-
ACUMULADO ATUAL:			m2	2.813,000
SALDO DO CONTRATO:			m2	77,000
DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):			m2	
A MEDIR NO PERÍODO:			m2	2.813,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE  
 CONTRATO: 153/2023

CÁLCULO EXPLICATIVO

ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA: 82010200415

Assinado digitalmente por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA 83019200415  
 DN: C=BR, O=CP Brasil, OU=AC-SO-LTJ, Município  
 de, OU=3072020100143, OU=Videconferencia,  
 OU=Cartão de PF-A1, CN=ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA 83019200415  
 Razão: Eu sou o autor deste documento.  
 Localização: a1a localização de assinatura aqui  
 Data: 2024-09-17 10:05:38









OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, ITABAIANA/SE

CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

CONTRATO: 153/2023




Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 04

RUA RENATO BISPO DE LIMA



RUA PADRE SEBASTIÃO PEDROSO

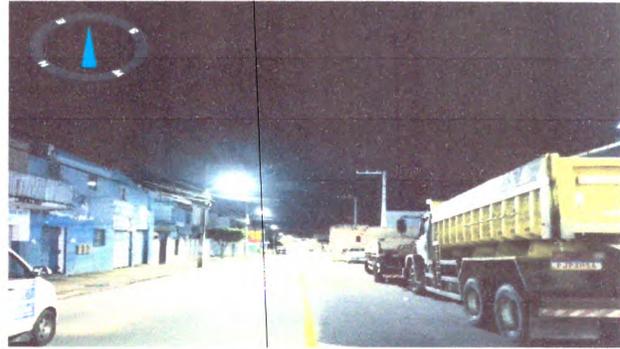

RUA SEBASTIÃO OLIVEIRA



RUA JUCA MONTEIRO



RUA MELQUIADES JOSÉ MENDONÇA



RUA 28 DE AGOSTO



RUA MIGUEL CARVALHO DE PEIXOTO



TRAVESSA WILLIAM FONSECA DE JESUS



ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA  
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, ITABAIANA/SE

CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

CONTRATO: 153/2023

Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA



RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 04

RUA MARIA TAVARES



RUA TENYSSON MELO DE OLIVEIRA



RUA CONSTRUTOR ANTONIO FERREIRA



ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA  
NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA: 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Yan Henrique Tavares Santana  
Eng. Civil - CREA: 2715636353  
Coordenador de Núcleo
